



Λάρισα 23-09-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 649**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».**

Στη Λάρισα σήμερα 23-09-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 40701/17-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3463/2006.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 38351/02-09-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «BERMION Α.Τ.Ε.Ε».
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 39215/07-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/σης Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ' αρ. 883/12-12-2017 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου
2. Υπ' αρ. 871/12-12-2017 Α.Δ.Σ.: Υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο "Πράσινο Ταμείο" του Υπουργείου Περιβάλλοντος
3. Υπ' αρ. 740/02-10-2018 Α.Δ.Σ.: Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση προς τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Λαρισαίων για τις περαιτέρω ενέργειες στο πρόγραμμα "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: 'Αστική Αναζωογόνηση 2018", του Πρασίνου Ταμείου, της πράξης με τίτλο "Ανάπλαση Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ".
4. Υπ' αρ. 586/06-12-2018 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
5. Υπ' αρ. 36/31-01-2019 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού της Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα "BERMION Α.Τ.Ε.Ε."
6. Υπ' αρ. 84/28-02-2019 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού της Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα Φορέα "BERMION Α.Τ.Ε.Ε."
7. Στις 04-07-2019 με Α.Π. 30131 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 523.806,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
8. Υπ' αρ. 250/07-05-2020 Α.Ο.Ε., που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 29-04-2020 στις 05-01-2021.
9. Υπ' αρ. 717/03-12-2020 Α.Ο.Ε., που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 05-01-2021 στις 04-06-2021.

10. Υπ'αρ. 327/21-05-2021 Α.Ο.Ε., που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 04-06-2021 στις 01-10-2021.

11. Υπ'αρ. 589/02-09-2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Λαρισαίων, που αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ», η εκτέλεση του οποίου λήγει στις 01-10-2021, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών πρασίνου εξ αιτίας των μεγάλων θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν κατά τους θερινούς μήνες, καθώς και λόγω καθυστέρησης της προμήθειας των εξαρτημάτων του σιντριβανιού.

## **B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Εξ αιτίας των μεγάλων θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν κατά τους θερινούς μήνες-έντονοι και διαρκείς καύσωνες-, οι εργασίες της σποράς χλοοτάπητα και άλλων φυτεύσεων δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν.

Λόγω της εκ περιτροπής λειτουργίας των προμηθευτών, εξ αιτίας της πανδημίας covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, υπήρξε πρόβλημα στην εισαγωγή από το εξωτερικό των εξαρτημάτων λειτουργίας του σιντριβανιού και επομένως η ολοκλήρωση των Η/Μ εργασιών που απαιτούνται στο έργο.

Σύμφωνα με την υπ'αρ. 589/02-09-2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εισάγοντας μία Νέα Τιμή (εργασία ΝΤ1 ) στην ομάδα των οικοδομικών εργασιών “διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου πλακοειδούς μορφής”, η οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό.

Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος -της παράτασης- θα έχουν ολοκληρωθεί άρτια και σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, δηλαδή του πρασίνου, της τοποθέτησης του εξοπλισμού του σιντριβανιού που αφορά εργασίες Η/Μ και η οποία είναι προαπαιτούμενη για την έντεχνη ολοκλήρωση της επένδυσης του σιντριβανιού με λιθοδομή. Μέσα στον χρόνο της παράτασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση της εγκεκριμένης Νέας Τιμής (εργασία ΝΤ1)“διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου πλακοειδούς μορφής”.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 8α,9 και 10 του Ν.4412/2016,

### **εισηγούμαστε**

την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 01-10-2021 στις 30/12/2021.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

5. Τη δήλωση του δημοτικού Συμβούλου κ. Νταή Παναγιώτη ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου

μετατίθεται από την 1<sup>η</sup>/10/2021 στην 30<sup>η</sup>/12/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.


## Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

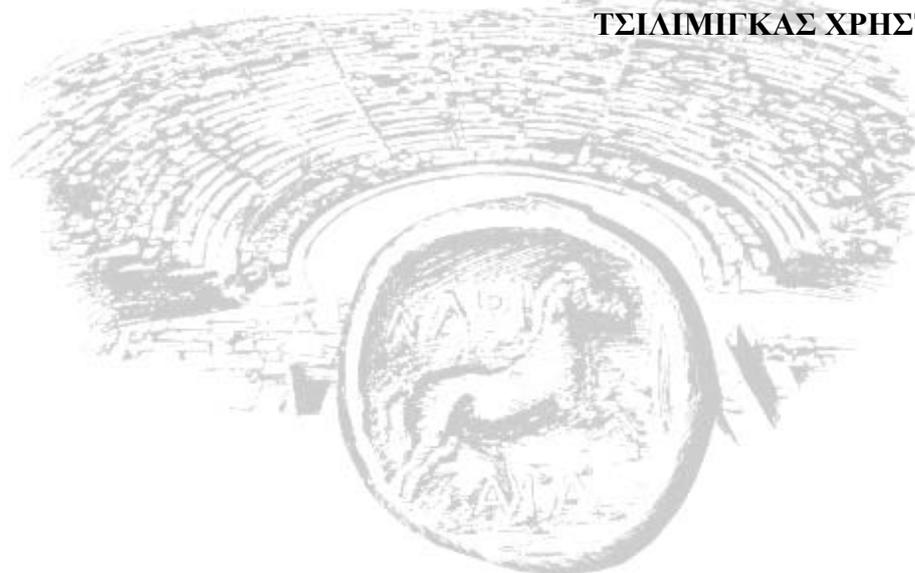

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA
