



Λάρισα 22-07-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512**

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)».

Στη Λάρισα σήμερα 22-07-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 31949/16-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Μαβίδης Δημήτριος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 115/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)».
4. Τη με αριθμ. 427/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 115/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ) λόγω τροποποίησης-επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης.
5. Τη με αριθμ. 505/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 115/2018 και 427/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)», λόγω τροποποίησης-επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης.
6. Τις με αριθ. 2645/2019,473/2020,607/2021 Αποφάσεις Δημάρχου για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
7. Τη με αριθ. 394/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)».
8. Τη με αριθ. 403/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)».
9. Τη με αριθμ. 651/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 82/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)» και κατακύρωση αυτού.
11. Τη με αριθμ. 99/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)».
12. Τη με αρ. πρωτ. 2888/09-07-2021 Α/Α 2 της Πράξης 5022084 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο: «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής

Δέσμευσης (2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) για το Υπόεργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου - Ρούσβελτ)».

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 31850/15-07-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών

- Το με αρ. Πρωτ. 5476// 28-05-2021 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (πρωτ.Δήμου: 25287/04-06-2021) για μετατόπιση Δικτύου Χαμηλής Τάσης λόγω ανακατασκευής δρόμου ήπιας κυκλοφορίας ΔΕΔΔΗΕ.
- Το με αρ. πρωτ. 25763/ 08-06-2021 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο γνωστοποιήθηκε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία η αναμονή ανθρώπινου και μηχανολογικού δυναμικού ενόψει επικείμενης μετατόπισης δικτύου από ΔΕΔΔΗΕ.
- Η υπ' αρ. 28194 / 23-06-2021 αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών.
- Η με αρ. Πρωτ. 2888/09-07-2021 «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) για το Υπόεργο « Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου - Ρούσβελτ)» Α/Α 2 της Πράξης 5022084» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου- Ρούσβελτ)» με κωδικό ΟΠΣ 5022084-02 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΣΠΑ 2014-2020), συμβασιοποιήθηκε στις 09-06-2020 (υπ' αριθμ. Πρωτ. 20579/ 09-06-2020 δημόσια σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων) με συνολική προθεσμία περαίωσης 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις **05-03-2021**.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 688/17-02-2021 «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) για το Υπόεργο « Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου - Ρούσβελτ) » Α/Α 2 της Πράξης 5022084» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και την υπ' αριθμ. 99/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)» εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **23-07-2021**.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 28194/23-06-2021 αίτηση του αναδόχου «ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» ζητείται παράταση λόγω καιρικών συνθηκών, covid 19 και μεταφοράς δικτύων ΟΚΩ κατά ογδόντα τέσσερις (84) ημέρες, ήτοι έως τις 15-10-2021.


Αναφέρουμε σχετικά, ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρηση των εργασιών για τους παρακάτω λόγους:

- καιρικές συνθήκες: βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός

-μεταφορά δικτύων ΟΚΩ: απαραίτητες εργασίες μεταφοράς δικτύων ΔΕΗ από συνεργεία των ΟΚΩ.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρησης των εργασιών σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ			
α/α φύλλου ημερολογίου	Ημέρα	ΚΑΙΡΟΣ	ΟΚΩ
55	Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020	✓	
56	Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020	✓	
57	Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020	✓	
58	Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020	✓	
68	Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020	✓	
69	Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020	✓	
70	Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020	✓	
78	Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020	✓	
79	Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020	✓	
80	Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020	✓	
81	Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020	✓	
82	Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020	✓	
84	Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020	✓	
85	Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020	✓	
86	Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020	✓	
87	Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020	✓	
88	Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020	✓	
90	Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020	✓	
91	Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020	✓	
96	Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020	✓	
97	Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020	✓	
108	Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021	✓	
115	Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021	✓	
126	Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021	✓	
127	Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021	✓	
144	Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021	✓	
145	Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021	✓	
195	Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021	✓	
196	Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021	✓	
202	Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021	✓	
203	Σάββατο, 24 Απριλίου 2021	✓	
234	Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021	✓	
235	Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021		✓
235	Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021		✓
235	Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021		✓
235	Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021		✓
235	Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021		✓
235	Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021		✓
235	Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021		✓
235	Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021		✓
235	Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021		✓
235	Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021		✓
235	Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021		✓
235	Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021		✓
235	Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021		✓
235	Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021		✓
σύνολο ημερολογιακών ημερών		32	14

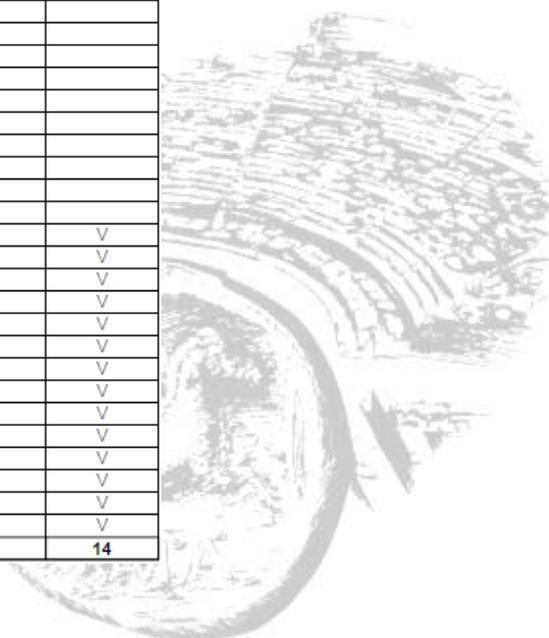

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου - Ρούσβελτ)»

- κατά τριάντα δύο (32) ημερολογιακές ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών και
- κατά δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες λόγω μεταφοράς ΟΚΩ

ήτοι συνολικά κατά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες «με αναθεώρηση», διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η ανωτέρω παράταση έχει προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2888/09-07-2021 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2η παράταση)» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγούμαστε λοιπόν μετάθεση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου από τις 23-07-2021 στις **07-09-2021** (2η παράταση έργου).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)» κατά σαράντα έξι (46) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 07η/09/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISSA
