



ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 941

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 16ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».**

Στη Λάρισα σήμερα 08-12-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 52705/02-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 16ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/06.
4. Τη με αριθμ. 884/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 698/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
6. Τη με αριθμ. 728/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου: "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας".
7. Τη με αριθμ. 30/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
8. Τη με αριθμ. 94/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 142/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 52030/29-11-2022 αίτηση της αναδόχου «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 52258/30-11-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 3/8/2017 με την με αριθμό **142/4-4-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **27/8/2018**, και πρωτοκολλήθηκε στις **27/8/2018** με αριθμό **28977**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η **27/8/2018**.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (**250**) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **3/5/2019**.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

ε Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση:

- Αρ. Απόφασης **297/11-4-2019** παράταση **90** μέρες έως **4-8-19**

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση

- Αρ. Απόφασης **501/29-7-2019** παράταση **149** μέρες έως **31-12-19**

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση

- Αρ. Απόφασης **681/12-12-2019** παράταση **90** μέρες έως **31-03-20**

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 4<sup>η</sup> παράταση

- Αρ. Απόφασης **79/2020** παράταση έως **31-08-20**

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 5<sup>η</sup> παράταση

**Αρ. Απόφασης 196/2020 παράταση έως 30-10-20**

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 6<sup>η</sup> παράταση

- **Αρ. Απόφασης 261/2020 παράταση έως 31-12-20**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 7<sup>η</sup> παράταση

- **Αρ. Απόφασης 742/2020 παράταση έως 31-03-21**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 8<sup>η</sup> παράταση

- **Αρ. Απόφασης 123/2021 παράταση έως 30-06-21**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 9<sup>η</sup> παράταση

- **Αρ. Απόφασης 364/2021 παράταση έως 30-09-21**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 10<sup>η</sup> παράταση

- **Αρ. Απόφασης 612/2021 παράταση έως 30-12-21**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 11<sup>η</sup> παράταση

- **Αρ. Απόφασης 830/2021 παράταση έως 28-2-22**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 12<sup>η</sup> παράταση

- **Αρ. Απόφασης 54/2022 παράταση έως 30-4-2022.**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 13<sup>η</sup> παράταση

- **Αρ. Απόφασης 227/2022 παράταση έως 30-6-2022**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 14<sup>η</sup> παράταση

- **Αρ. Απόφασης 387/2022 παράταση έως 30-9-2022**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 15<sup>η</sup> παράταση

- **Αρ. Απόφασης 643/2022 παράταση έως 30-11-2022**

2.Ο ανάδοχος με την από 52030/29-11-22 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως **30/12/2022**, λόγω του ότι δεν είχαν εγκριθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχαία για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και λόγω της έξαρσης κρουσμάτων της πανδημίας covid-19 στην εταιρεία

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων για ολοκλήρωση εντέχνως του έργου, υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την **30-12-2022**.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 16η παράταση συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» έως την 30η/12/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση. Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.


## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

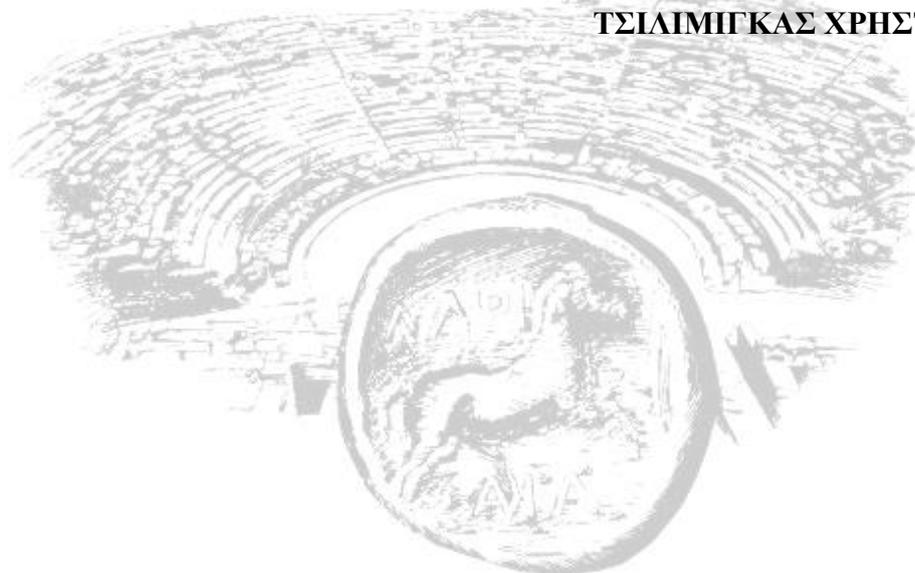

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA
