



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός συνοικίας ΧΑΡΑΥΓΗΣ (ΤΟΥΜΠΙΑ)».

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Αυγούστου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12313/19-8-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λυτροκάπης Χρήστος, 18) Μίχος Χρήστος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Παπαστεργίου Αγίς, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη και 2) Λάτσιος Ιωάννης, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μπανιός Μάρκος και Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Κυπαρίσσης Θωμάς και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός συνοικίας ΧΑΡΑΥΓΗΣ (ΤΟΥΜΠΙΑ)»

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/94.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 2229/94.
4. Το Ν. 2539/97.
5. Το Π.Δ. 609/85.
6. Το Π.Δ. 28/80.
7. Την Α.Δ.Σ. 1017/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
8. Την με Αρ.Πρωτ.12071/12.08.08. εισήγηση, την από 12.08.08 Εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: Η έγκριση του 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**Ηλεκτροφωτισμός συνοικίας ΧΑΡΑΥΓΗΣ (ΤΟΥΜΠΙΑ)**» επί éλαττον δαπάνης **21,55 € (18,11 + Φ.Π.Α. 19% 3,44)** σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, Με Κ.Α...30 7325 44047. Πηγή χρηματοδότησης: ΕΑΤ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα

ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ (ΤΟΥΜΠΑ)»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α' - ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 55 σε 65 κμ. Εκσκαφής χάνδακα
2. Αύξηση από 60 σε 85 τ.μ. αποκατάσταση πεζοδρομίου.
3. Αύξηση από 10 σε 11 τεμ. Βάσεων σιδηροιστού
4. Αύξηση από 25 σε 30 τεμ φρεατίων
5. Αύξηση από 10 σε 11 τεμ. Σιδηροιστών 7μ
6. Αύξηση από 250 σε 280 μ.. σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου 2 ½"
7. Αύξηση από 12 σε 18 τεμ. Φωτιστικών Σωμάτων
8. Αύξηση από 350 σε 390 μ.. καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 τ.χ.

9. Αύξηση από 80 σε 120μ. καλώδιο NYM 3X1,5 τ.χ.

10. Αύξηση από 350 σε 370μ. αγωγός γυμνός χάλκινος 16τ.χ.

11. Αύξηση από 10 σε 11 κ.β βάσης ιστού

12. Αύξηση από 2 σε 7 τεμ. ευθύγραμμος μεταλλικού διπλού βραχίονα

13. Αύξηση από 50 σε 60 μ. καλώδιο NYG 5X4 τ.χ.


Β'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 10 σε 4 τεμ. Ευθύγραμμου μεταλλικού μονού βραχίονα

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 21,55 ευρώ με ΦΠΑ. 19%

Λάρισα 12/08/2008

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ


ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ


ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη

ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΕΛ. ΚΩΣΤΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Κλάδου Π.Ε.5 με Α' Βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Προϊσταμένη Τμημ.
ΑΙΒΑΛΙΩΤΩΣ ΔΕΛΦΙΝΑΣ


Ριζούλη Αγλαΐα
Κλάδου ΤΕ3 με Α' Βαθμό

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 42 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	32.909,02	6.252,71	39.161,735
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	19.087,23	3.626,57	22.713,80
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	19.069,12	3.623,13	22.692,25
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	18,11	3,445	21,55
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,0949%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

- A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 22.713,80 ΕΥΡΩ.
 B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.
 Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ. 22.692,25
 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%


ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

αδ 
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΕΛ. ΚΩΣΤΑΣ
 ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 Κλάδου Π.Ε.5 με Α' Βαθμύ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ


ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
αδ 
Ριζού Ασημά
 ΑΙΒΑΛΙΑΣ ΤΕΣ με Α' Βαθμύ

9. Τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός συνοικίας ΧΑΡΑΥΓΗΣ (ΤΟΥΜΠΙΑ)» επί έλαττον δαπάνης 21,55 € (18,11 + Φ.Π.Α. 19% 3,44) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΕΑΤ του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30 7325 44047.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

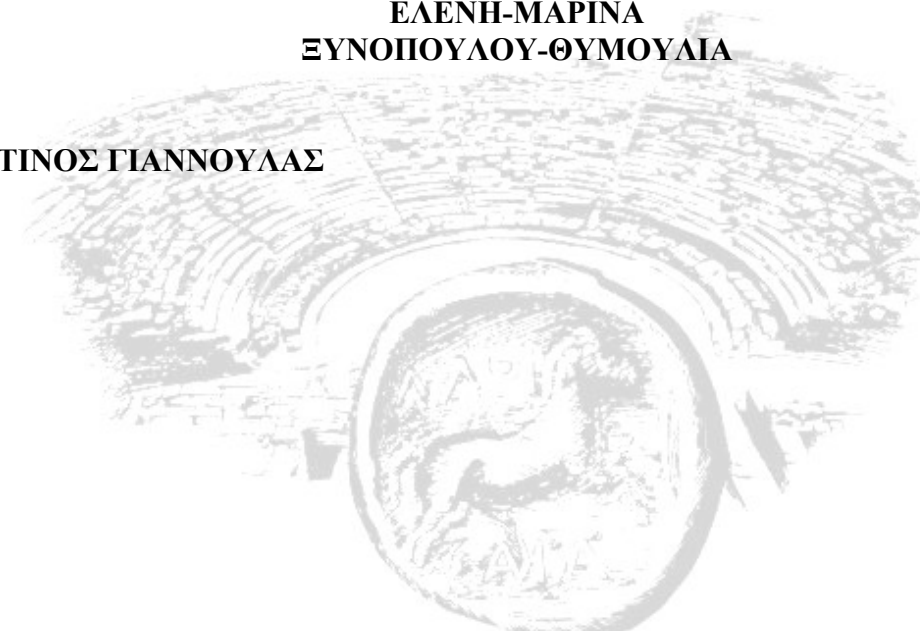
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ : "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗ-ΤΟΥΜΠΑ"
 ΕΚΠΤΩΣΗ : 42% ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΖΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ. Τιμολογίου	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΠΙΝΑΚΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
			ΔΑΠΑΝΕΣ				ΔΑΠΑΝΕΣ				ΔΑΠΑΝΕΣ			Επι πλέον	Επι ελάττων		
			Ποσότητ	Τ.μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητ	Τ.μον	Μετ	Ολική	Ποσότητ	Τ.μονάδας	Μερική			Ολική	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																	
1	Εκσ.χωνό για τοποθέτηση καλωδίων	1	55	17,09	939,95					65,00	17,09	1.110,85		170,90	0,00		
2	Αποκατάστ. πεζοδρ. ασφαλτ. δρομου πρασίνου	2	60	25,96	1.557,60					85,00	25,96	2.208,80		649,00	0,00		
3	Βάση σιδηροστρώ ασιτή 1,0x1,0x1,0	3	10	90,38	903,80					11,00	90,38	994,18		90,38	0,00		
4	Φρεάτιο επίσκεψης	4	25	31,28	782,00					30,00	31,28	938,40		156,40	0,00		
5	Σιδηροστρώ ηλεκτροπλάκας Η=7,0 μ.	5	10	412,06	4.120,60					11,00	412,06	4.532,66		412,06	0,00		
6	Πλαστικός σωλήνας PVC DN100	6	30	4,42	132,60					30,00	4,42	132,60		0,00	0,00		
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμ. 2 1/2"	7	250	22,63	5.657,50					280,00	22,63	6.336,40		678,90	0,00		
8	Φωτ. Σύμα ατμών Ηg Υ.Π. 125 Watt	8	12	75,00	900,00					18,00	75,00	1.350,00		450,00	0,00		
9	Καλώδιο J1VV-U (NYΥ) πενταπλά 5x2,5mm ²	9	350	4,96	1.731,00					390,00	4,96	1.895,40		194,40	0,00		
10	Καλώδιο Α00ΣV-U (NYM) τριπλά 3x1,5mm ²	10	80	4,97	397,60					120,00	4,97	596,40		198,80	0,00		
11	Αγωγός γυμνός χαλκ. μονοκλ. (Cu) διαμ. 161 χ.	11	350	4,84	1.694,00					370,00	4,84	1.790,80		96,80	0,00		
12	Γείωση από χαλκ. ηλεκτρ. Φ. 22x1,50m	12	8	18,24	145,92					8,00	18,24	145,92		0,00	0,00		
13	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσης θεμέλ.	13	10	56,96	569,60					11,000	56,96	626,56		56,96	0,00		
14	Ευθύγραμ. μετ. βραχ. Μονός, προβελ. 1,20 μ	14	10	35,00	350,00					4,00	35,00	140,00		0,00	210,00		
15	Ευθύγραμ. μετ. βραχ. Διάκ. προβελ. 1,20 μ	15	2	66,00	132,00					7,00	66,00	462,00		330,00	0,00		
16	Βάση πηλαρ 130x0,40x0,50	16	4	25,00	100,00					4,00	25,00	100,00		0,00	0,00		
17	Κιβώτιο ηλεκ. διανομής (mλαρ) 1,20x0,30x1,30	17	4	500,00	2.000,00					4,00	500,00	2.000,00		0,00	0,00		
18	Καλώδιο J1VV-U (NYΥ) πενταπλά 5x4mm ²	18	50	5,45	272,50					60,00	5,45	327,00		54,50	0,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			22.356,67				ΑΘΡΟΙΣΜΑ				25.685,77			3.539,10		210,00	
ΕΚΠΤΩΣΗ 42%			9.389,80				ΕΚΠΤΩΣΗ 42%			10.788,02			1.486,42		88,20		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ			12.966,87				ΥΠΟΛΟΙΠΟ			14.897,75			2.052,68		121,80		
Γ. Ε. & Ο. Ε. 28%			3.630,72				Γ. Ε. & Ο. Ε. 28%			4.171,37			574,75		34,10		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			16.597,59				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			19.069,12			2.627,43		155,90		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			2.489,64				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			0,00			0,00		2.489,64		
ΣΥΝΟΛΟ			19.087,23				ΣΥΝΟΛΟ			19.069,12			2.627,43		2.645,54		

Ητοι ποσοστό μείωσης (%) 0,0949% = 18,11 = 18,11

<p>Φ.Π.Α. 19% ΣΥΜΒΑΣΗ € 3.626,57 22.713,80</p> <p>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΗΝΗΜΑΤΙ Η/Η ο/κ <i>[Signature]</i> ΧΑΤΖΙΚΩΣ Δημήτριος</p> <p>ΣΥΝΤΑΚΤΑΣ ΕΛ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΟΣ ΗΜ ΜΕΡΑΝΟΣ 15600 Π.Ε.Σ. υπ Α' Βαθμ</p>	<p>€ 3.626,57 22.713,80</p> <p>Ο ΑΥΤΟΛΟΓΟΙ <i>[Signature]</i> ΤΖΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΑΧΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ 56 - ΛΑΡΙΣΣΑ ΤΗΛ. 2410 2410000 - ΚΩ. 682 91798 Α.Φ.Μ. 085558001 Α' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ</p>	<p>Φ.Π.Α. 19% ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € 3.623,13 22.692,25</p> <p>Ο ΕΠΙΘΕΛΕΤΩ <i>[Signature]</i> ΤΣΟΛΙΑ Κωνσταντίνος</p> <p>ΜΑΡΙΑ ΝΙΒΕΙΟΣ ΕΞΕΤΡΗΧΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΒΕΙΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϊσταμένη Τμήμ Οδοποιίας ΑΙ ΒΑΜΙ ΟΥΡΟΥ 15600 ΤΕΣ υπ Α' Βαθμ</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

