



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 963
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 43/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράταξης συνολικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Επισκευές Συντηρήσεις στις Εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ».

Στη Λάρισα, σήμερα 13^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 44256/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μπαμπαλής Δημήτριος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Πράπας Κωνσταντίνος, 24) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αγορίτσας Χρήστος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Καφφές Θεόδωρος, 8) Κοτάκου Μαρία, 9) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 10) Μαμάκος Αθανάσιος, 11) Μπαράς Νικόλαος, 12) Νασιώκας Έκτορας, 13) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Πράπας Αντώνιος, 16) Σάπκας Παναγιώτης, 17) Τερζούδης Χρήστος, 18) Τζανακούλης Κων/νος και 19) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντωνίου Νέστωρ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Επισκευές Συντηρήσεις στις Εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 705/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου "Επισκευές - συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ".
3. Τη με αριθμ. 657/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου "Επισκευές-Συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ".
4. Τη με αριθμ. 16/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 39/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του δημοτικού έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ».
6. Τη με αριθμ. 141/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 224/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 40604/16-11-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου Μπουλογιάννης Κωνσταντίνος.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 42004/26-11-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων - Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Δημόσια Σύμβαση: 67.992,61 € **(54.832,75 + 13.159,86 Φ.Π.Α.)**

Κ.Α. Προϋπολογισμού: **30.7322.41006**

Τρόπος εκτέλεσης: **Εργολαβία**

Χρηματοδότηση: **Ίδιοι πόροι**

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 40604/16-11-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ» Μπουλογιάννης Κων/νος ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 23/12/2018, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης κάποιων νέων εργασιών για την σωστή ολοκλήρωση της κατασκευής καθώς επίσης παρατηρήθηκε και αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών. Η Δημόσια σύμβαση του έργου «Επισκευές συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ» υπογράφηκε στις 24/07/2018 με ημερομηνία έναρξης του την ίδια μέρα και συνολική προθεσμία περάτωσής του εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 24/11/2018.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμεστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ» κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 23/12/2018, βάση των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις στις Εγκαταστάσεις του Αισθητικού Άλσους και του Αλκαζάρ» κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 23/12/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

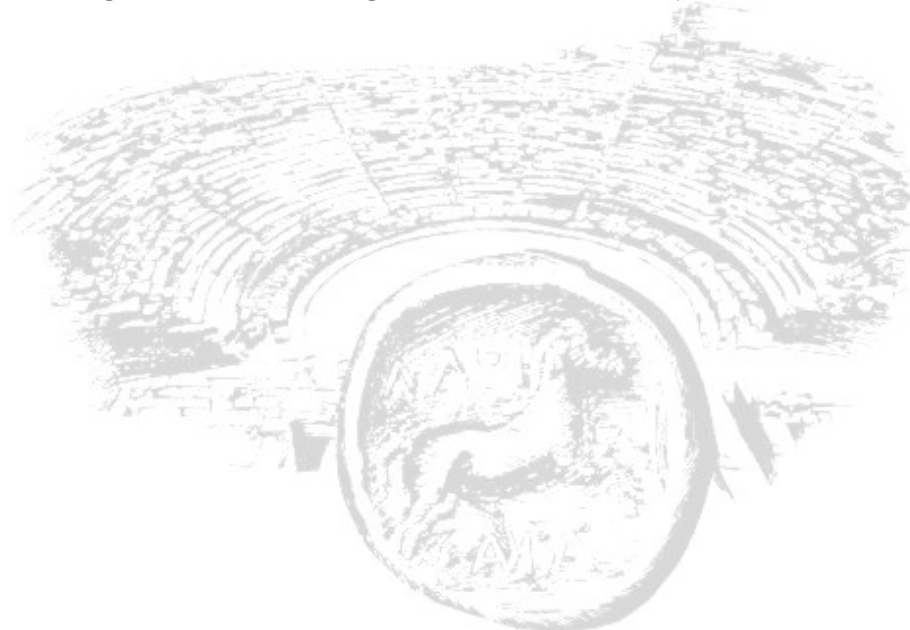

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA
