



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 629
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της «Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».

Στη Λάρισα, σήμερα 25^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 70358/21-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Βαγενά Αγγελική, 4) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 5) Γεωργάκης Δημήτριος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 8) Ζαούτσος Γεώργιος, 9) Καλτσάς Νικόλαος, 10) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 11) Καραλαριώτου Ειρήνη, 12) Κρίκης Πέτρος, 13) Κυριτσάκας Ν. Βαΐος, 14) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 15) Μαβίδης Δημήτριος, 16) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 17) Νασιώκας Έκτορας, 18) Νταής Παναγιώτης, 19) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 20) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 21) Πράπας Αντώνιος, 22) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 23) Σάπκας Παναγιώτης, 24) Σούλτης Γεώργιος, 25) Σουρλαντζής Απόστολος, 26) Τσακίρης Μιχαήλ, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 29) Τσιλιμίκας Χρήστος και 30) Ψάρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καφφές Θεόδωρος, 10) Μαμάκος Αθανάσιος, 11) Μπαμπαλής Δημήτριος, 12) Μπαράς Νικόλαος, 13) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 14) Ξηρομερίτης Μάριος, 15) Παζιάννας Γεώργιος, 16) Πράπας Κωνσταντίνος, 17) Σουλούκου Ασπασία, 18) Τερζούδης Χρήστος και 19) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δαούλας Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της «Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3316/2005
2. Το Ν. 3463/2005
3. Τη με αρ. 215/5-04-2016 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργειας της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» για την περιοχή του ευρύτερου κέντρου της πόλης της Λάρισας.
4. Τη με αρ.139/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των όρων του διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» για την περιοχή του ευρύτερου κέντρου της πόλης της Λάρισας.
5. Τη με αρ.231/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και κατακύρωση αποτελέσματος.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 70138/20-10-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την υπ' αριθμ. 139/14-04-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης των όρων του διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» για την περιοχή του ευρύτερου κέντρου της πόλης της Λάρισας.

2) Την με αριθμ. 231/02-06-2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης στο μελετητικό γραφείο DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ.

3) Το με αρ. πρωτ. 49282/28-07-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, που αφορά την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με το οποίο: ‘Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του’

4) Το γεγονός ότι η μελέτη εκπονείται σε μία φάση κατά την οποία ο Ανάδοχος καλείται με το πέρας των (3) τριών πρώτων μηνών να παρουσιάσει αναλυτικά τις προτάσεις του οι οποίες θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για (1) ένα μήνα.

5) Την με αρ. πρωτ 67728/12-10-2016 αίτηση του αναδόχου Μελετητή με την οποία ζητείται η παράταση της πρώτης τμηματικής υποβολής της μελέτης κατά δύο (2) μήνες έως τις 28-12-2016 με αντίστοιχη μετάθεση της συνολικής προθεσμίας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού για τους λόγους που αυτός αναφέρει εγγράφως.

6) Το γεγονός ότι η χρονική παράταση μετάθεσης της παραλαβής της μελέτης έως 28-12-2016 δεν διαταράσσει την ομαλή εκπόνηση της προκηρυχθείσας μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας»

7) Το άρθρο 27 του Ν. 3316/05 σύμφωνα με το οποίο η έγκριση της παράτασης προθεσμίας, γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων εν προκειμένω, ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

Και αναφορικά με την πρόοδο εκπόνησης της μελέτης η οποία αποτελεί συγκοινωνιακή μελέτη εφαρμογής και θα περιλαμβάνει:

- μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης του τοπικού οδικού δικτύου περιοχής μελέτης
- καθορισμό καθεστώτος στάθμευσης ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου.
- διερεύνηση εναλλακτικών διαδρομών των Λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σηματοδότησης της οδού Κύπρου, μετά την εφαρμογή των πεζοδρομήσεων των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, Ελ. Βενιζέλου και Φιλελλήνων και των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις τοπικές οδούς (ήπιας κυκλοφορίας).
- μελέτη σήμανσης οδικού δικτύου περιοχής μελέτης.

για την κεντρική περιοχή του Δήμου που περιβάλλεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Λαγού, Τάκη Τσόγκα (πρώην Καλλιθέας), Γεωργιάδου και Αεροδρομίου και την περιοχή που περιλαμβάνεται από τις οδούς Φαρσάλων, Ηρώων πολυτεχνείου, Βόλου, Σαπφούς, Παλαιολόγου και Πτολεμαίου.

και προκειμένου:

- να υπάρξει ικανός χρόνος για την επεξεργασία των στοιχείων που θα προσκομιστούν από την εκπόνηση της « Παροχής Υπηρεσιών καταγραφής στοιχείων στην Ευρύτερη Περιοχή του Κέντρου» η οποία είναι εν εξελίξει και
- να ολοκληρωθεί πλήρως και ομαλά η διαδικασία επεξεργασίας των προτάσεων που θα παραδοθούν για Διαβούλευση

Ζητείται από το Δ.Σ.:

- η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας της πρώτης τμηματικής υποβολής της μελέτης του θέματος κατά δύο (2) μήνες ώστε αυτή να υποβληθεί στην υπηρεσία έως τις 28-12-2016 για να ακολουθήσει η διαδικασία της διαβούλευσης καθώς και
- αντίστοιχη μετάθεση κατά δύο (2) μήνες της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι έως τις 28-02-2017.

7. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση της προθεσμίας της πρώτης τμηματικής υποβολής της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κατά δύο (2) μήνες, ώστε αυτή να υποβληθεί στην υπηρεσία έως τις 28-12-2016 για να ακολουθήσει η διαδικασία της διαβούλευσης και την αντίστοιχη μετάθεση κατά δύο (2) μήνες της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι έως τις 28-02-2017 για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

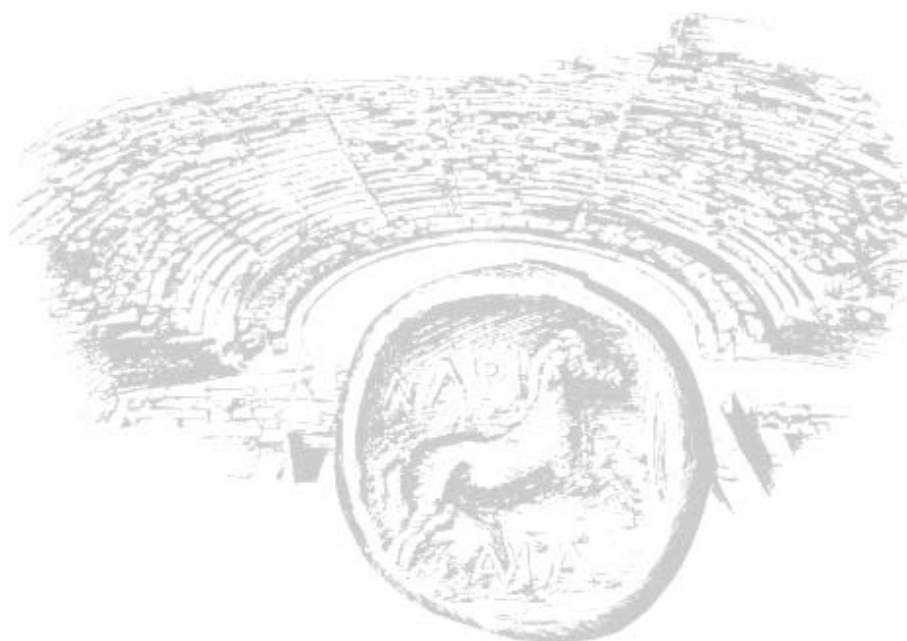

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA
