



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 948

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο».

Στη Λάρισα σήμερα 18-11-2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 60797/14-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 80/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή μελέτης & έγκριση όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
5. Τη με αριθμ. 81/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
6. Τη με αριθμ. 363/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 908/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
8. Τη με αριθμ. 1151/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
9. Τη με αριθμ. 254/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο».
10. Τη με αριθμ. 325/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
11. Τη με αριθμ. 468/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο».
12. Τη με αρ. πρωτ. 59928/10-11-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

ποσού ευρώ: 1.119.647,65 (902.941,65 + 216.706,00 Φ.Π.Α. 24%)

ήτοι ίσης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18,47%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
			(EURO)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1.104.741,53	265.137,97	1.369.879,50
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	902.941,65	216.706,00	1.119.647,65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 4ο Α.Π.Ε.	902.941,65	216.706,00	1.119.647,65
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	902.941,65	216.706,00	1.119.647,65
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	-	-	-

- Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικής Σύμβασης) **1.119.647,65 euro**
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Συμπληρωματικής Σύμβασης)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)..... - euro
- Γ. Εγκριθείσα δαπάνη (4ου Α.Π.Ε.)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)..... **1.119.647,65 euro**
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%)..... **1.119.647,65 euro**

ΛΑΡΙΣΑ 10 - 11 - 2025

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13. Την από 20-10-2025 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 5^Ο Α.Π.Ε.)

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 80/14.02.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με προϋπολογισμό μελέτης 1.369.879,50 Ευρώ (1.104.741,53 Ευρώ + 265.137,97 Φ.Π.Α. 24%)

Με την υπ' αριθμ. 363/30.04.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ (η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 18,47%).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 04/07/24 με συμβατικό ποσό 1.119.647,65 € (902.941,65 € + 216.706,00 € Φ.Π.Α. 24%) και αρ. πρ. 36472/4-7-24 (ΑΔΑΜ : 24SYMV015063242).

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Με την υπ' αριθμ. 908/ 24-10-2024 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 1151/ 24-12-2024 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ

Με την υπ' αριθμ. 254/ 26-03-2025 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ

Με την υπ' αριθμ. 468/ 04-06-2025 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε του έργου:

«Επισκευές – συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».

II. ΣΥΝΤΑΞΗ 5^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να συμπεριλάβει:


-Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

-Αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (επί πλέον δαπάνες), λόγω σφαλμάτων των προμετρήσεων, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλ. η όλη κατασκευή) και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Οι δαπάνες αυτών καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Αυτές περιλαμβάνονται στα παρακάτω συμβατικά άρθρα

1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

AT 08
AT 10
AT 13
AT 15
AT 18
AT 19
AT 31
AT 47
AT 48
AT 51
AT 55
AT 58
AT 59
AT 63
AT 70
AT 80
AT 83
AT 86
AT 88
AT 97
AT 98
AT 103
AT 106
AT 107
AT 108
AT 113
AT 115
AT 119
AT 123
AT 125
AT 129
AT 131
AT 133
AT 138
AT 139
AT 143
AT 144

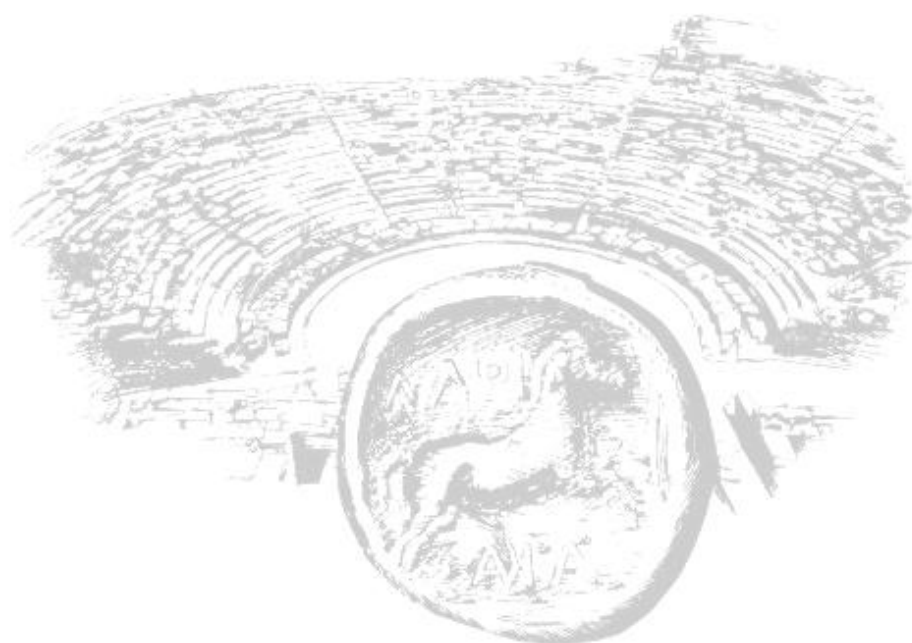

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

2.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ

2.1.ΥΔΡΕΥΣΗ

AT 156
AT 159


AT 160
AT 162
AT 163
AT 164
AT 165
AT 166

2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

AT 167
AT 168
AT 169
AT 181
AT 187
AT 190
AT 193
AT 196
AT 197
AT 202
AT 203
AT 204
AT 207
AT 208
AT 209
AT 210
AT 212
AT 214

2.3. ΙΣΧΥΡΑ ΠΡΕΥΜΑΤΑ

AT 220
AT 221
AT 230
AT 232
AT 238
AT 239
AT 240
AT 246
AT 250
AT 251
AT 252
AT 253
AT 255
AT 256
AT 259
AT 260
AT 266
AT 267

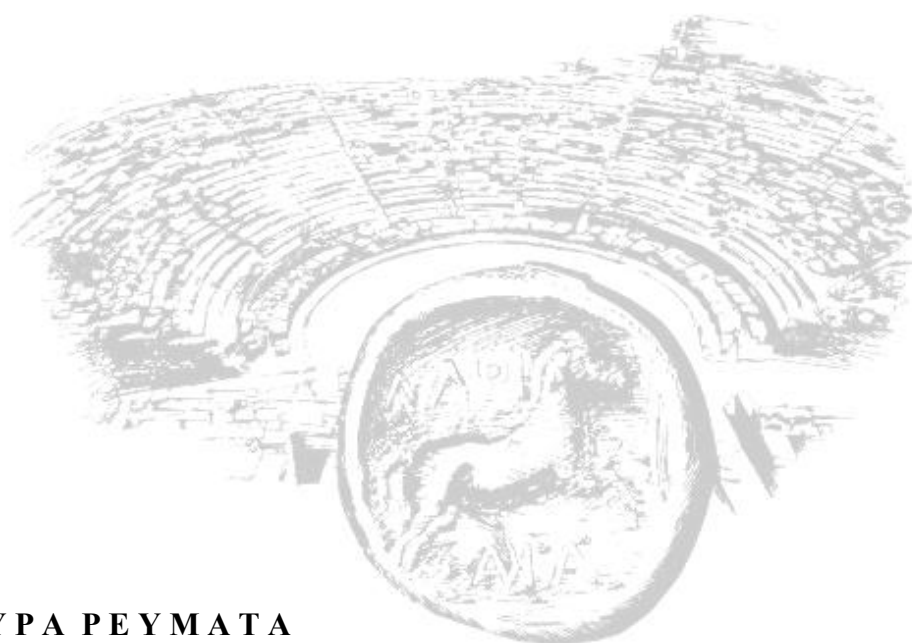

2.4.ΑΣΘΕΝΗ ΠΕΥΜΑΤΑ

AT 277

2.5.ΘΕΡΜΑΝΣΗ

AT 283

AT 284

AT 294

AT 299

AT 301

AT 302

AT 303

AT 304

AT 305

AT 310

2.6.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

AT 313

AT 322

2.7.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

AT 329

AT 340

AT 341

AT 342

AT 343

AT 344

AT 345

AT 392

AT 395

AT 396

AT 399

AT 400

AT 402

AT 403

AT 406

AT 407

AT 408

AT 409

AT 411

AT 412

AT 413

AT 414

AT 419

AT 423

AT 428

AT 429

AT 455



- Α. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (επί έλλατον δαπάνες), λόγω σφαλμάτων των προμετρήσεων, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλ. η όλη κατασκευή) και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Αυτές περιλαμβάνονται στα παρακάτω συμβατικά άρθρα



1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

AT 02

AT 03

AT 04

AT 05

AT 06

AT 07

AT 14

AT 16

AT 17

AT 20

AT 22

AT 23

AT 24

AT 26

AT 27

AT 28

AT 29

AT 30

AT 33

AT 34

AT 35

AT 36

AT 37

AT 38

AT 39

AT 40

AT 41

AT 42

AT 43

AT 44

AT 49

AT 50

AT 53

AT 54

AT 57

AT 61

AT 62

AT 64


AT 67

AT 68

AT 73


AT 74

AT 75

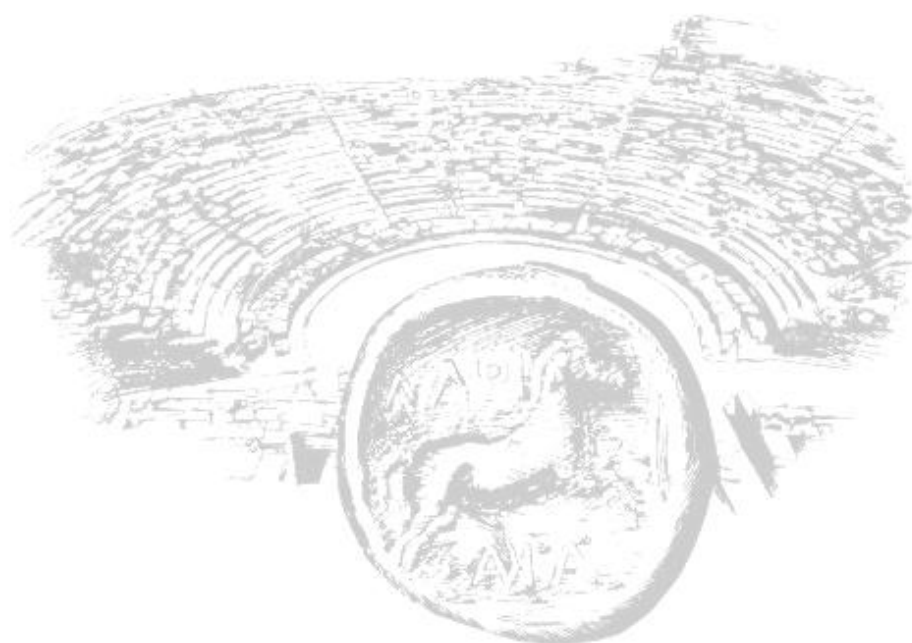

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

AT 76
AT 77
AT 78
AT 81
AT 82
AT 84
AT 87
AT 89
AT 90
AT 92
AT 93
AT 94
AT 95
AT 96
AT 99
AT 100
AT 101
AT 102
AT 104
AT 105
AT 109
AT 110
AT 111
AT 112
AT 117
AT 118
AT 120
AT 122
AT 124
AT 126
AT 127
AT 128
AT 130
AT 132
AT 136
AT 140
AT 142
AT 145
AT 146
AT 147
AT 148
AT 149
AT 150
AT 151

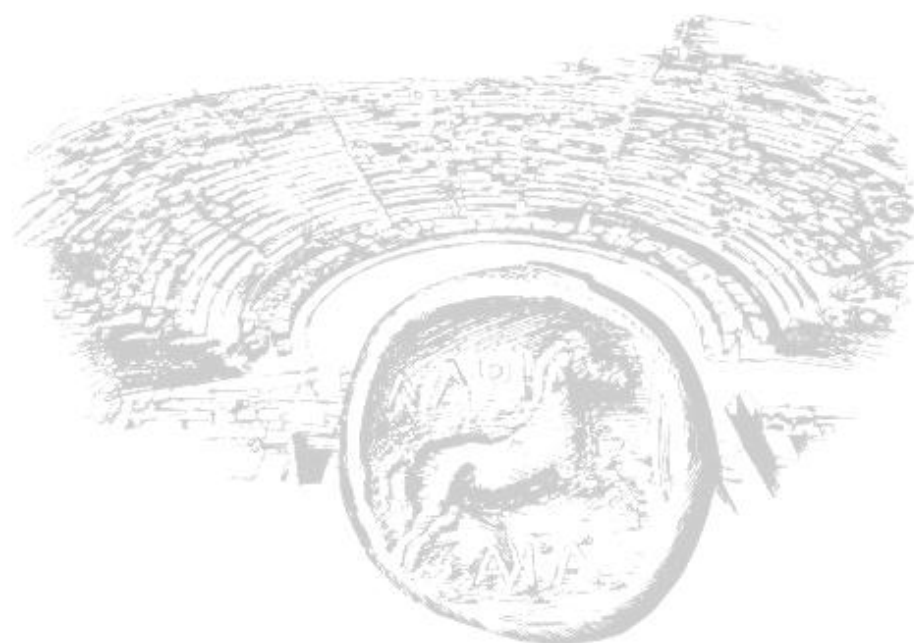

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA


AT 152
AT 153

2.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ

2.1.ΥΔΡΕΥΣΗ

2.2.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

AT 170
AT 171
AT 172
AT 173
AT 174
AT 175
AT 176
AT 177
AT 178
AT 179
AT 180
AT 182
AT 183
AT 184
AT 185
AT 186
AT 189
AT 191
AT 192
AT 194
AT 198
AT 199
AT 200
AT 201
AT 205
AT 206
AT 211
AT 213
AT 215
AT 216

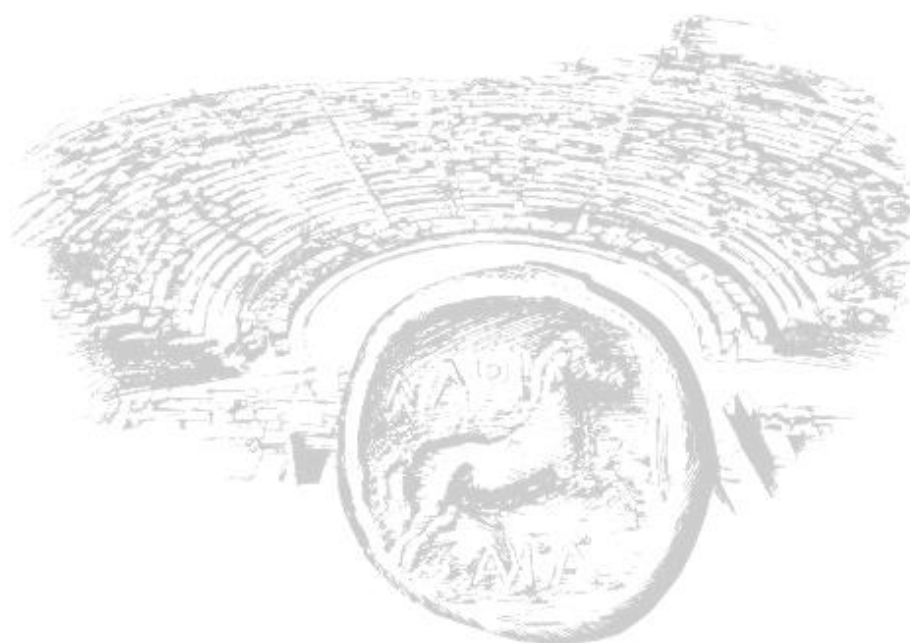

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

2.3.ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

AT 243
AT 244
AT 245
AT 247


AT 248
AT 249
AT 254
AT 271
AT 272
AT 273
AT 274

2.4.ΑΣΘΕΝΗΡΕΥΜΑΤΑ

AT 280
AT 281
AT 282

2.5.ΘΕΡΜΑΝΣΗ

AT 35
AT 34
AT 346
AT 347
AT 348
AT 349
AT 350
AT 351
AT 352
AT 353
AT 354
AT 285
AT 285
AT 286
AT 287
AT 288
AT 290
AT 291
AT 295
AT 296

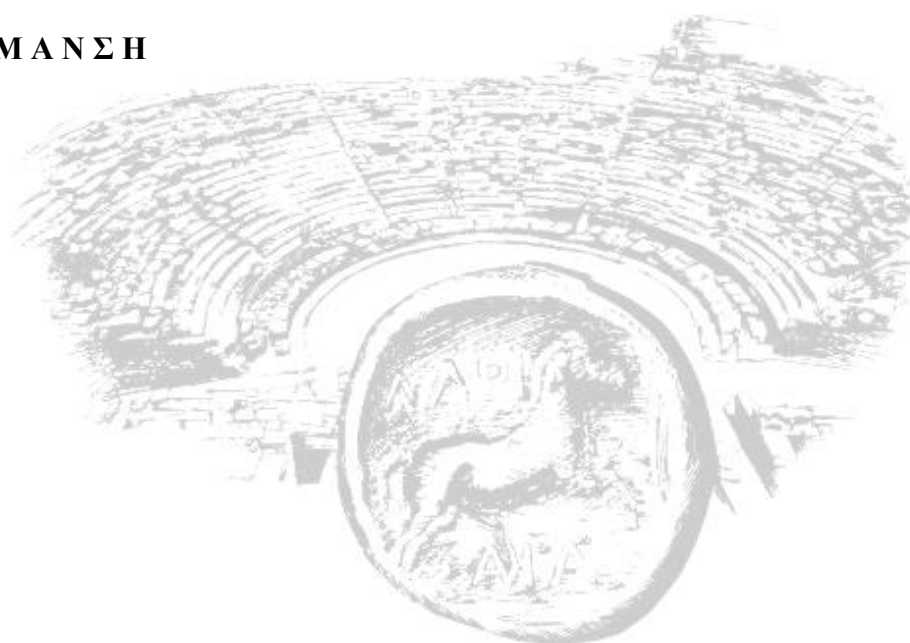

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

2.6.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

2.7.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

AT 330

AT 331

AT 332

AT 333

AT 5

AT 33

AT 334

AT 335

AT 336

AT 337

AT 338

AT 35

AT 34

AT 131

AT 346

AT 347

AT 348

AT 349

AT 350

AT 351

AT 352

AT 353

AT 354

AT 355

AT 356

AT 357

AT 358

AT 359

AT 360

AT 361

AT 338

AT 362

AT 363

AT 364

AT 365

AT 366

AT 367


AT 368

AT 369

AT 370


AT 371

AT 372

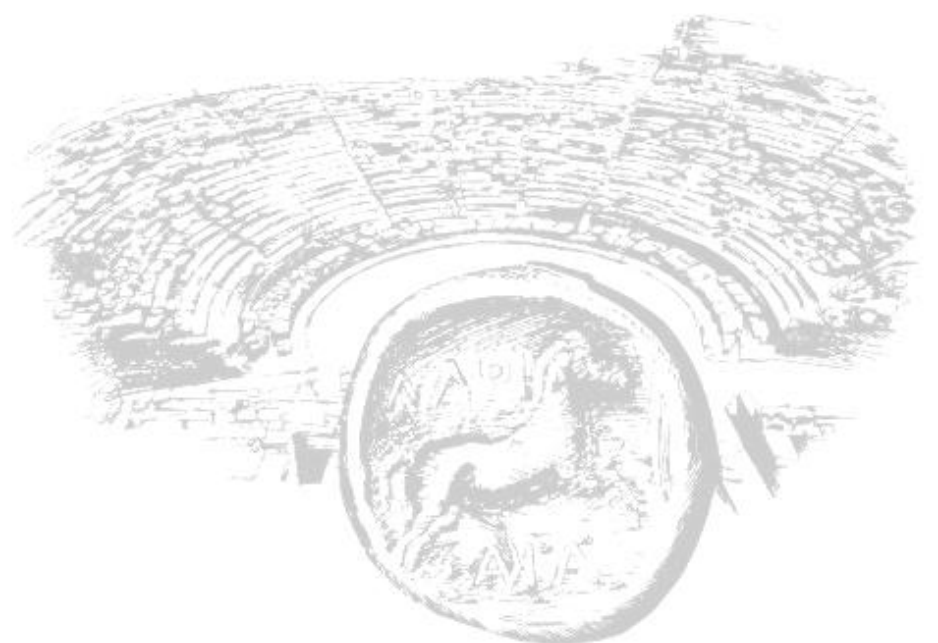

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

AT 373
AT 374
AT 375
AT 376
AT 377
AT 378
AT 379
AT 380
AT 381
AT 382
AT 383
AT 384
AT 385
AT 386
AT 387
AT 388
AT 389
AT 391
AT 393
AT 394
AT 401
AT 410
AT 297
AT 415
AT 416
AT 417
AT 418
AT 156
AT 420
AT 421
AT 422
AT 424
AT 425
AT 430
AT 431
AT 432
AT 456

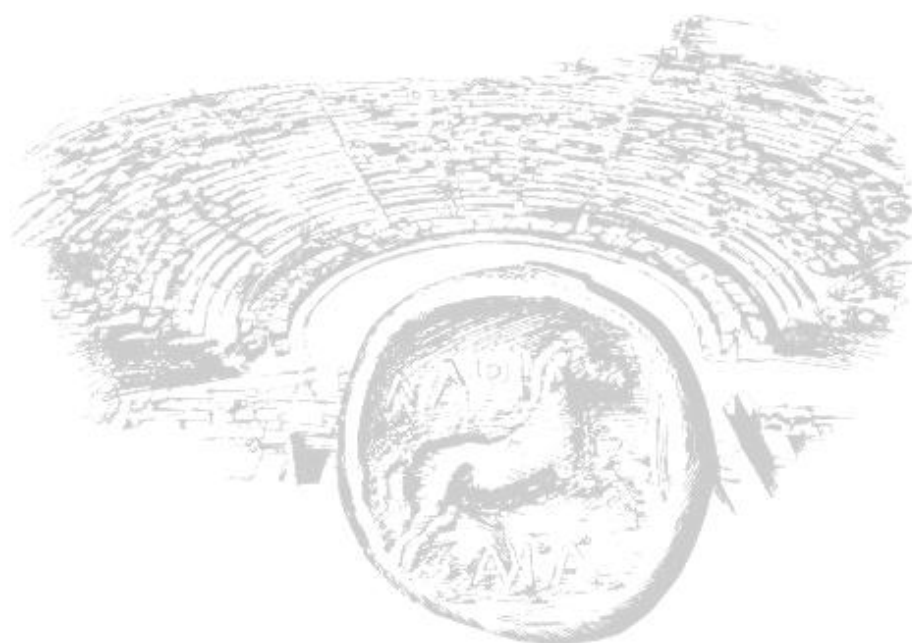

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**

Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**

Εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**

Εγκεκριμένος 3^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**

Εγκεκριμένος 4^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**

Προτεινόμενος 5^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**

Δηλαδή **διαφορά μεταξύ** της συμβατικής δαπάνης κατά: **0,00€**

V. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεστε την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 1.119.647,65 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός ισχύει.

V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 5^{ου} Α.Π.Ε.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 4 ^ο Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 5 ^ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	751.832,11	855.184,14	864.439,79	112.607,79	0,00
Απρόβλεπτα	112.774,82	9.422,79	167,14	0,00	112.607,79
Σύνολο	864.606,93	864.606,93	864.606,93	112.607,79	112.607,79
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 0,00%					
Αναθεώρηση	24.459,00	24.459,00	24.459,00	0,00	0,00
Απολογιστικά	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
Όφελος Εργολαβικό Απολογιστικών (18%) μετά των	1.775,72	1.775,72	1.775,72	0,00	0,00
Συνολικό Ποσό Εργασιών	902.941,65	902.941,65	902.941,65	0,00	0,00
Φ.Π.Α. 24%	216.706,00	216.706,00	216.706,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	1.119.647,65	1.119.647,65	1.119.647,65	0,00	0,00

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του.

ΛΑΡΙΣΑ, 20/10/2025

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

14. Τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο», ο οποίος έχει ως εξής:



ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 1	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο. Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																		
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βαρύτητας (ΝΑΟΙΚ 10.07.01)	1	tkm	3.395	0,35	1.188,25		3.395	0,35	1.188,25		3.395	0,35	1.188,25				
2	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ξονθιάς άμμου ποταμού (ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ23Ν)	2	M3	0,5	16,30	8,15			16,30				16,30	0,00		8,15		
3	Απομάκρυνση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση άμμου (ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ23Ν1)	3	M3	5	7,70	38,50			7,70				7,70	0,00		38,50		
4	Εκκαθαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΝΑΟΙΚ 20.05.01)	4	M3	20	4,50	90,00			4,50				4,50	0,00		90,00		
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εμβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΝΑΟΙΚ 20.10)	5	M3	16	4,50	72,00			4,50				4,50	0,00		72,00		
6	Εξυφαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΝΑΟΙΚ 20.20)	6	M3	2	15,70	31,40			15,70				15,70	0,00		31,40		
7	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΝΑΟΙΚ 20.30)	7	M3	70	0,90	63,00			0,90				0,90	0,00		63,00		
8	Χερμωκτική διάκνιση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΝΑΟΙΚ 20.40)	8	tl0m	356	5,60	1.993,60		800	5,60	4.480,00		800	5,60	4.480,00	2.486,40			
9	Καθαυρέσεις πλυνθωδωμών (ΝΑΟΙΚ 22.04)	9	M3	50	15,70	785,00		50	15,70	785,00		50	15,70	785,00				
10	Καθαυρέση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΝΑΟΙΚ 22.10.01)	10	M3	6	28,00	168,00		6,74	28,00	188,72		6,97	28,00	195,16	27,16			
Σε μεταφορά															2.513,56	6.648,41	303,05	

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 2		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					4.437,90					6.641,97			6.648,41	2.513,56	303,05	
11	Καθόριση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθόρισης (ΝΑΟΙΚ 22.15.01)	11	M3	3	56,00	168,00		3	56,00	168,00		3	56,00	168,00			
12	Καθόριση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσαγωγή για την εξαγωγή αεραίων πλακών (ΝΑΟΙΚ 22.20.01)	12	M2	166	7,90	1.311,40		166	7,90	1.311,40		166	7,90	1.311,40			
13	Καθόριση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσαγωγή για την εξαγωγή αεραίων πλακών (ΝΑΟΙΚ 22.21.01)	13	M2	222	4,50	999,00		300	4,50	1.350,00		299,44	4,50	1.347,48	348,48		
14	Καθόριση επικεραμιώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσαγωγή για την εξαγωγή αεραίων κεράμων (ΝΑΟΙΚ 22.22.01)	14	M2	10	6,70	67,00		10	6,70	67,00			6,70	0,00		67,00	
15	Καθόριση επιχρισμάτων (ΝΑΟΙΚ 22.23)	15	M2	173	5,60	968,80		350	5,60	1.960,00		360,92	5,60	2.021,15	1.052,35		
16	Καθόριση ειδών υγιεινής (ΝΑΟΙΚ 22.30.01N)	16	Τεμ.	49	15,00	735,00		49	15,00	735,00			15,00	0,00		735,00	
17	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για σπές επιφανείας έως 0,05 m2 (ΝΑΟΙΚ 22.30.01)	17	Τεμ.	0,5	5,60	2,80			5,60				5,60	0,00		2,80	
18	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για σπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 (ΝΑΟΙΚ 22.30.02)	18	Τεμ.	0,5	9,00	4,50		150	9,00	1.350,00		150	9,00	1.350,00	1.345,50		
19	Διάνοιξη αυλακού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακού έως 0,10 m (ΝΑΟΙΚ 22.31.01)	19	MM	2	7,75	15,50		300	7,75	2.325,00		300	7,75	2.325,00	2.309,50		
	Σε μεταφορά					8.709,90				15.908,37				15.171,44	7.569,39	1.107,85	

ΕργαLand

Σελίδα 2

ΕργαLand

Σελίδα 3

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						8.709,90			15.908,37			15.171,44			7.569,39	1.107,85	
20	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άσπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m.(ΝΑΟΙΚ 22.40.01)	20	Τεμ.	9	22,50	202,50			22,50		0,00		22,50	0,00		202,50	
21	Αποξήλωση ξύλων ή σιδηρών κουφωμάτων ή κουφωμάτων αλουμινίου (ΝΑΟΙΚ Α122.45Ν)	21	M2	268	16,80	4.502,40		268	16,80	4.502,40		268	16,80	4.502,40			
22	Αποξήλωση ξύλων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΝΑΟΙΚ 22.45)	22	M2	28	16,80	470,40		28	16,80	470,40			16,80	0,00		470,40	
23	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης (ΝΑΟΙΚ 22.52)	23	M2	42	2,60	109,20		42	2,60	109,20			2,60	0,00		109,20	
24	Καθόρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΝΑΟΙΚ 22.53)	24	M2	25	5,60	140,00		25	5,60	140,00			5,60	0,00		140,00	
25	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτιών επιστρώσεων (ΝΑΟΙΚ 22.60)	25	M2	127	2,20	279,40		127	2,20	279,40		127	2,20	279,40			
26	Αποξήλωση μεταλλικών κυκλωμάτων. (ΝΑΟΙΚ 22.65.02Α)	26	M2	4	15,00	60,00		4	15,00	60,00			15,00	0,00		60,00	
27	Αποξήλωση κυκλωμάτων για μεταλλικά κυκλώματα (ΝΑΟΙΚ 22.65.02)	27	Χγρ.	100	0,35	35,00		100	0,35	35,00			0,35	0,00		35,00	
28	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά.(ΝΑΟΙΚ 23.03)	28	M2	0,5	5,60	2,80			5,60				5,60	0,00		2,80	
29	Γαρυμπαδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3.(ΝΑΟΙΚ 31.02.01)	29	M3	14	73,00	1.022,00			73,00				73,00	0,00		1.022,00	
30	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάτρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΝΑΟΙΚ 32.02.05)	30	M3	14	90,00	1.260,00			90,00				90,00	0,00		1.260,00	
Σε μεταφορά						16.783,60			21.504,77				19.953,24		7.569,39	4.409,75	

ΕργαLand

Σελίδα 3

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																		Σελίδα 4	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
Από μεταφορά						16.793,60				21.504,77			19.953,24		7.569,39	4.409,75			
31	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΝΑΟΙΚ 32.05.04)	31	M3	10	106,00	1.060,00		13,23	106,00	1.402,38		13,23	106,00	1.402,38		342,38			
32	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΝΑΟΙΚ 38.02)	32	M2	14	22,50	315,00		14	22,50	315,00		14	22,50	315,00					
33	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΝΑΟΙΚ 38.03)	33	M2	20	15,70	314,00			15,70				15,70	0,00		314,00			
34	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (ΝΑΟΙΚ 38.20.02)	34	Χηρ	475	1,07	508,25		338,33	1,07	362,01		338,33	1,07	362,01		146,24			
35	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C (ΝΑΟΙΚ 38.20.03)	35	Χηρ	275	1,01	277,75		51,2	1,01	51,71		51,2	1,01	51,71		226,04			
36	Οπισπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπισπλινθούς 6x8x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπταικοί τοίχοι) (ΝΑΟΙΚ 46.01.03)	36	M2	10	33,50	335,00		10	33,50	335,00				0,00		335,00			
37	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πτεράσματα αλουμινίου (ΝΑΟΙΚ 50.15.02)	37	M2	17	168,00	2.856,00		17	168,00	2.856,00				0,00		2.856,00			
38	Ξυλεία πακo ή ισοδύναμη για καθιστικά (ΝΑΟΙΚ M52.13)	38	M3	0,06	600,00	36,00			600,00					0,00		36,00			
39	Παγκάκι με πλάτη (ΝΑΟΙΚ Δ52.61.2)	39	Τεμ.	4	280,00	1.120,00			280,00					0,00		1.120,00			
40	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλικά ή/πi κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m (ΝΑΟΙΚ 52.66.01)	40	M2	1	45,00	45,00			45,00					0,00		45,00			
41	Ζευκιά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πρισιτή (ΝΑΟΙΚ 52.76.02)	41	M3	1,2	675,00	810,00			675,00					0,00		810,00			
Σε μεταφορά						24.470,60				26.826,87				22.084,34		7.911,77	10.298,03		

ΕργαLand

Σελίδα 5

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																
Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική		
Από μεταφορά					24.470,60			26.826,87			22.084,34			7.911,77	10.298,03	
42	Τεγνώση στέγης από ξυλεία πριστή.(ΝΑΟΙΚ 52.79.02)	M3	1,2	450,00	540,00			450,00			0,00				540,00	
43	Σανίδωμα στέγης με μιστόβλες πάχους 1,8 cm.(ΝΑΟΙΚ 52.80.02)	M2	1	19,00	19,00			19,00			0,00				19,00	
44	Δάπεδο ραμπποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λυρίδες πλάτους έως 8,0 cm.(ΝΑΟΙΚ 53.01.01)	M2	10	27,50	275,00			27,50			0,00				275,00	
45	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας.(ΝΑΟΙΚ 53.50.02)	MM	148	6,20	917,60		148	6,20	917,60			917,60				
46	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.(ΝΑΟΙΚ 54.46.01)	M2	112	118,00	13.216,00			112	118,00	13.216,00						
47	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσα μπατική, πλάτους έως 23 cm.(ΝΑΟΙΚ 54.46.02)	M2	5	123,00	615,00			5	123,00	615,00			9,22	123,00	1.134,06	519,06
48	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόνιρα - πλακέ.(ΝΑΟΙΚ 54.61)	M2	2	200,00	400,00			4,62	200,00	924,00			6,82	200,00	1.364,00	964,00
49	Θύρες συρόμενες διφυλλες από κόνιρα - πλακέ.(ΝΑΟΙΚ 54.62)	M2	3	195,00	585,00				195,00					195,00	0,00	585,00
50	Θυρόφυλλο, συρόμενα πρεσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm.(ΝΑΟΙΚ 54.66.01)	M2	5	155,00	775,00				155,00					155,00	0,00	775,00
51	Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπισπλανθοδόμες.(ΝΑΟΙΚ 54.86)	MM	5	16,80	84,00		200	16,80	3.360,00			241,7	16,80	4.060,56	3.976,56	
52	Εντοιχισμένες ντουλάπες.(ΝΑΟΙΚ 54.75)	M2	22	112,00	2.464,00		22	112,00	2.464,00			22	112,00	2.464,00		
53	Πλαστική αμμοδόχος.(ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.80.18ΣΧ)	Τεμ.	1	140,00	140,00				140,00				140,00	0,00	140,00	140,00
54	Είδη κιγκαλέριας.(ΝΑΟΙΚ Ν65.33.01)	Τεμ.	0,18	2.800,00	504,00		0,18	2.800,00	504,00				2.800,00	0,00	504,00	504,00
Σε μεταφορά					45.006,20			48.827,47			45.240,56			13.371,39	13.136,03	

Εργασίες

Σελίδα 6

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						45.005,20			48.827,47			45.240,56		13.371,39	13.136,03		
55	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF (ΝΑΟΙΚ 56.07)	55	M2	32	45,00	1.440,00		40	45,00	1.800,00		40	45,00	1.800,00		360,00	
56	Συρίτσια για κουζινογυαλάκια επιφάνειας έως 0,20 m2 (ΝΑΟΙΚ 56.11)	56	Τεμ.	33	33,50	1.105,50		33	33,50	1.105,50		33	33,50	1.105,50			
57	Γωνιόκρανα ξύλινα (ΝΑΟΙΚ 56.19)	57	MM	200	5,63	1.126,00			5,63				5,63	0,00		1.126,00	
58	Πάγκος από άκαυστη φορμάκα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΝΑΟΙΚ 56.21)	58	M2	24	28,00	672,00		30	28,00	840,00		30	28,00	840,00		168,00	
59	Ερμάρια κούζινας επί δαπέδου μη τυποποιημένα (ΝΑΟΙΚ 56.23)	59	M2	25	225,00	5.625,00		40	225,00	9.000,00		40	225,00	9.000,00		3.375,00	
60	Ερμάρια κούζινας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα (ΝΑΟΙΚ 56.24)	60	M2	2	180,00	360,00		2	180,00	360,00		2	180,00	360,00			
61	Κατασκευή υπερθύρων, προβάλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm (ΝΑΟΙΚ 61.01)	61	Χγρ.	300	2,50	750,00			2,50				2,50	0,00		750,00	
62	Κατασκευή υπερθύρων, προβάλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm (ΝΑΟΙΚ 61.03)	62	Χγρ.	100	2,50	250,00			2,50				2,50	0,00		250,00	
63	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή καλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm (ΝΑΟΙΚ 61.05)	63	Χγρ.	1.215	2,70	3.280,50		1.215	2,70	3.280,50		2.129,18	2,70	5.748,78		2.468,29	
64	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ (ΝΑΟΙΚ 61.11)	64	Χγρ.	10	1,70	17,00		10	1,70	17,00			1,70	0,00		17,00	
65	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΝΑΟΙΚ 61.30)	65	Χγρ.	134	3,10	415,40		134	3,10	415,40		134	3,10	415,40			
66	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΝΑΟΙΚ 61.31)	66	Χγρ.	2.698	2,80	7.554,40		2.698	2,80	7.554,40		2.698	2,80	7.554,40			
Σε μεταφορά						67.601,00			73.200,27					72.064,66		15.279,03	

ΕργαLand

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 7	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλατιον Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	
67	Διάφορες κατασκευές από γυαλοσανιμένη λαμαρίνα (ΝΑΟΙΚ Ν61.33.03)	67	Χγρ	60	4,39	263,40				4,39							
68	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ραβδους (ΝΑΟΙΚ 62.21)	68	Χγρ	80	5,00	400,00		80	5,00	400,00				4,39	0,00		263,40
69	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min (ΝΑΟΙΚ 62.60.02)	69	M2	67	280,00	18.760,00		67	280,00	18.760,00				280,00	18.760,00		
70	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.(ΝΑΟΙΚ 62.60.03)	70	M2	23.2	335,00	7.772,00		23.2	335,00	7.772,00				335,00	13.735,00		5.963,00
71	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο σπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min.(ΝΑΟΙΚ 62.60.05)	71	M2	48	335,00	16.080,00		48	335,00	16.080,00				335,00	16.080,00		
72	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, διφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο σπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min (ΝΑΟΙΚ 62.61.05)	72	M2	8	420,00	3.360,00		8	420,00	3.360,00				420,00	3.360,00		
73	Μίμνες σιδηρές καρφωτές (ΝΑΟΙΚ 63.01)	73	Χγρ	200	9,00	1.800,00			9,00				9,00	0,00			1.800,00
74	Σιδηρά κυκλώματα από ραβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ραβδους (ΝΑΟΙΚ 64.01.01)	74	Χγρ	802	4,50	3.609,00		802	4,50	3.609,00				4,50	0,00		3.609,00
75	Κυκλώματα από σιδηροσωλήνες μισρούς, Φ 2" (ΝΑΟΙΚ 64.10.03)	75	Χγρ	0,5	16,80	8,40			16,80					16,80	0,00		8,40
Σε μεταφορά																	
														123.999,66		25.705,68	21.359,83

ΕργαLand

Σελίδα 7

Εργασίες

Σελίδα 8

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					119.653,80					123.181,27			123.999,65		25.705,68	21.359,83
76	Ανοξείδωτος χείρολαθρός Φ50/2 mm.(ΝΑΟΙΚ 64.29)	76	MM	163	20,00	3.260,00			20,00				20,00	0,00			3.260,00
77	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος σπής 10x4 cm.(ΝΑΟΙΚ 64.31)	77	M2	2	4,70	9,40			4,70				4,70	0,00			9,40
78	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "Τ".(ΝΑΟΙΚ 64.41)	78	Χ/ρ.	200	2,70	540,00			2,70				2,70	0,00			540,00
79	Θύρες αλουμινίου πολυφυλλες,πτισσόμενες,ύπτο υ ακορντιόν (ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.11)	79	M2	275	175,00	48.125,00		275	175,00	48.125,00			275	175,00	48.125,00		
80	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο .(ΝΑΟΙΚ 65.05)	80	M2	2	175,00	350,00		4,62	175,00	808,50			4,62	175,00	808,50	458,50	
81	Υαλοθύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαρμένο αλουμίνιο, διφυλλες, με σταθερό φεγγίτη.(ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03)	81	M2	12	145,00	1.740,00		12	145,00	1.740,00			12	145,00	0,00		1.740,00
82	Υαλοθύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, τριφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη.(ΝΑΟΙΚ 65.02.02.05)	82	M2	16	140,00	2.240,00		16	140,00	2.240,00			16	140,00	0,00		2.240,00
83	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες (ΝΑΟΙΚ Α165.05 Ν)	83	M2	12	175,00	2.100,00		12	175,00	2.100,00		26,58	175,00	4.651,50		2.551,50	
84	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, διφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.(ΝΑΟΙΚ 65.17.04)	84	M2	7	190,00	1.330,00		7	190,00	1.330,00			7	190,00	0,00		1.330,00
85	Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα και ανακλινόμενα (ΝΑΟΙΚ Α165.17.07Ν)	85	M2	39	300,00	11.700,00		39	300,00	11.700,00			39	300,00	11.700,00		
Σε μεταφορά						191.048,20				191.224,77				189.284,65		28.715,68	30.479,23

ΕργαLand

Εργαλ.Σελίδα 9

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																		
Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από μεταφορά							191.048,20				191.224,77				189.284,66	28.715,68	30.479,23	
86	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά (ΝΑΟΙΚ Α165.17.08Ν)	86	M2	26	250,00	6.500,00				26	250,00	6.500,00			6.537,50		37,50	
87	Υαλοστάσια, μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά από αλουμίνιο (ΝΑΟΙΚ Α165.20.03Ν)	87	M2	34	100,00	3.400,00				34	100,00	3.400,00			0,00		3.400,00	
88	Κινητές σίτες αερισμού (ΝΑΟΙΚ 65.25)	88	M2	2	45,00	90,00				4.5	45,00	202,50			202,50		112,50	
89	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου (ΝΑΟΙΚ 65.32)	89	M2	5	45,00	225,00				5	45,00	225,00			0,00		225,00	
90	Ευρές αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες (ΝΑΟΙΚ 65.41)	90	Χ/γ.	69	13,50	931,50				69	13,50	931,50			0,00		931,50	
91	Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΝΑΟΙΚ 71.21)	91	M2	594	13,50	8.019,00				594	13,50	8.019,00			8.019,00			
92	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα (ΝΑΟΙΚ 71.22)	92	M2	20	14,00	280,00					14,00				0,00		280,00	
93	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΝΑΟΙΚ 72.16)	93	M2	12	23,50	282,00					23,50				0,00		282,00	
94	Επιστρώσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αλκαλική, πάχους 1,00 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.31.01)	94	M2	8	15,70	125,60					15,70				0,00		125,60	
95	Επιστρώσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.31.02)	95	M2	56	14,60	817,60					14,60				0,00		817,60	
96	Επικάλυψη αρμών διατολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.44.01)	96	MM	6	20,20	121,20					20,20				0,00		121,20	
97	Επικάλυψη αρμών διατολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.44.02)	97	MM	3	15,70	47,10				75,2	15,70	1.180,64			1.924,82	1.877,72		
Σε μεταφορά							211.887,20				211.683,41				205.968,47		30.743,40	36.662,13

ΕργαLand

Εργασίες

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 10		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
Από μεταφορά						211.887,20					211.683,41			205.988,47	30.743,40	36.682,13	
98	Αρμολάμπρα, αρμών εύρους 50 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.47.01)	98	MM	0,1	39,00	3,90		11,25	39,00	438,75		11,25	39,00	438,75		434,85	
99	Επιστρώσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα (ΝΑΟΙΚ 72.70)	99	M2	0,1	67,50	6,75			67,50				67,50	0,00		6,75	
100	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα (ΝΑΟΙΚ ΕΥ7896)	100	M2	16	30,00	480,00			30,00				30,00	0,00		480,00	
101	Επιστρώσεις με πλάκες τοιμένιου, πλευράς 21 - 30 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.16.01)	101	M2	15	16,80	252,00			16,80				16,80	0,00		252,00	
102	Επιστρώσεις με πλάκες τοιμένιου, πλευράς άνω των 30 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.16.02)	102	M2	7	13,50	94,50			13,50				13,50	0,00		94,50	
103	Επενδύσεις τοίχων με πλάκια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, καλλιγιά.(ΝΑΟΙΚ 73.26.03)	103	M2	188	31,00	5.828,00		225,33	31,00	6.985,23		299	31,00	9.269,00	3.441,00		
104	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλάκια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.33.01)	104	M2	40	31,50	1.260,00			31,50				31,50	0,00		1.260,00	
105	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλάκια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.33.02)	105	M2	69	33,50	2.311,50			33,50				33,50	0,00		2.311,50	
106	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλάκια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.33.03)	106	M2	56	36,00	2.016,00		122,98	36,00	4.427,28		149,76	36,00	5.391,36	3.375,36		
107	Περθώρα (σφραγιτιά) από κεραμικά πλάκια.(ΝΑΟΙΚ 73.35)	107	MM	104	4,50	468,00		104	4,50	468,00		127,2	4,50	572,40	104,40		
Σε μεταφορά						224.607,86				224.002,67				221.639,98	36.089,01	41.066,89	

EngelLand

Σελίδα 10

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 11	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Από μεταφορά					224.607,85					224.002,67			221.639,98		38.099,01	41.066,88	
108	Επιστρώσεις δαπέδων και περιβόρια με τσιμεντοκονία ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονία σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.37.01)	108	M2	3	14,60	43,80			150	14,60	2.190,00		150	14,60	2.190,00		2.146,20	
109	Αντιολισθητική αυτοκόλλητη ταινία μαρμάρων βαθμίδων (ΝΑΟΙΚ 73.76.01)	109	MM	75	1,40	105,00			75	1,40	105,00			0,00			105,00	
110	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους 8,0 mm.(ΝΑΟΙΚ Ν173.96.01)	110	M2	15	28,00	420,00				28,00				0,00			420,00	
111	Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο σφαλκός (ΝΑΟΙΚ Α173.97Ν)	111	M2	127	38,00	4.826,00				38,00				0,00			4.826,00	
112	Επίστρωση εξωτερικού χώρου με συνθετικό χλοοτάπητα (ΝΑΟΙΚ Α173.98Ν)	112	M2	187	20,20	3.777,40				20,20				0,00			3.777,40	
113	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων (ΝΑΟΙΚ 73.99)	113	MM	10	4,50	45,00			60,35	4,50	271,58		60,35	4,50	271,58		226,58	
114	Κατώφλια και περζώματα (μπορντιούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 -30 cm.(ΝΑΟΙΚ 75.01.01)	114	M2	7	78,50	549,50			7	78,50	549,50		7	78,50	549,50			
115	Περιβόρια (σβατειδιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm.(ΝΑΟΙΚ 75.11.01)	115	MM	28	9,50	266,00			130	9,50	1.235,00		170,15	9,50	1.616,43		1.350,43	
116	Παδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm.(ΝΑΟΙΚ 75.31.01)	116	M2	9	78,50	706,50			9	78,50	706,50		9	78,50	706,50			
117	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βαθιρών/μετώπων) (ΝΑΟΙΚ 75.41.01)	117	MM	3	39,00	117,00			3	39,00	117,00			0,00			117,00	
	Σε μεταφορά					235.464,05					229.177,25			226.973,99		41.822,22	50.312,28	

ΕργΛοΓα

Σελίδα 12

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική
Από μεταφορά					235.464,05			229.177,25			226.973,98			41.822,22	50.312,28		
118	Μεμβράνες ασφαλείας (ΝΑΟΙΚ Α176.22.01N)	M2	357	20,00	7.140,00			357	20,00	7.140,00			20,00	0,00		7.140,00	
119	Υαλοπινάκες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) (ΝΑΟΙΚ 76.22.02)	M2	58	45,00	2.610,00			70	45,00	3.150,00		98,95	45,00	4.452,75	1.842,75		
120	Υαλοπινάκες πυράντοχοι, κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) (ΝΑΟΙΚ 76.23.03)	M2	40	205,00	8.200,00			40	205,00	8.200,00			205,00	0,00		8.200,00	
121	Διπλοί Θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπινάκες, (ΝΑΟΙΚ Α176.27N)	M2	30	100,00	3.000,00			30	100,00	3.000,00		30	100,00	3.000,00			
122	Διπλοί Θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπινάκες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρίσταλλα 5 mm, κενό 8 mm, κρίσταλλα 5 mm) (ΝΑΟΙΚ 76.27.01)	M2	178	50,00	8.900,00			178	50,00	8.900,00			50,00	0,00		8.900,00	
123	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς (ΝΑΟΙΚ 77.16)	M2	227	2,20	499,40			227,81	2,20	501,18		309,62	2,20	681,16	181,76		
124	Στατισυλάρημα τσιμεντοστρώσεων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών (ΝΑΟΙΚ 77.17.02)	M2	86	2,80	240,80			86	2,80	240,80			2,80	0,00		240,80	
125	Διάστρωση βελούρου επί ετοιμών σπασοχαρτισμένων επιφανειών (ΝΑΟΙΚ 77.18)	M2	112	1,70	190,40			227,81	1,70	387,28		309,62	1,70	526,35	335,95		
126	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, απλή επάλειψη λινέλαιου (ΝΑΟΙΚ Α177.26.01)	M2	270	1,70	459,00				1,70				1,70	0,00		459,00	
127	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινέλαιου (ΝΑΟΙΚ 77.26.02)	M2	336	2,20	739,20			336	2,20	739,20			2,20	0,00		739,20	
Σε μεταφορά															235.634,25	44.182,68	75.991,28

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 13	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	
	Από μεταφορά					267.442,85				261.435,71				235.634,25	44.182,68	75.991,28
128	Λάδιμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, δπλό λάδιμα και στίλβωση (ΝΑΟΙΚ 77.27.02)	128	M2	10	2,25	22,50		10	2,25	22,50			2,25	0,00		22,50
129	Ελαοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ Α177.54)	129	M2	122	6,70	817,40		327,3	6,70	2.192,91		452,61	6,70	3.032,49	2.215,09	
130	Ελαοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.54)	130	M2	172	6,70	1.152,40			6,70				6,70	0,00		1.152,40
131	Ελαοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.55)	131	M2	467	6,70	3.128,90		522,19	6,70	3.498,67		961,71	6,70	6.443,46	3.314,56	
132	Αντισκωρίαση βαφή σιδηρού σπληνίου (ΝΑΟΙΚ 77.55 Ν.1)	132	M2	5	8,89	44,45		5	8,89	44,45			8,89	0,00		44,45
133	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΝΑΟΙΚ 77.80.01)	133	M2	3.200	9,00	28.800,00		3.200	9,00	28.800,00		3.545,55	9,00	31.909,95	3.109,95	
Σε μεταφορά						301.408,50				295.994,24				277.020,15	52.822,28	77.210,63

ΕργΛογ

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 14		
Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					301.408,50					295.994,24			277.020,15		77.210,63	
134	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής	134	M2	288	10,10	2.908,80		288	10,10	2.908,80		288	10,10	2.908,80			
135	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπασαυλάρισμα της γυψοσανίδας (ΝΑΟΙΚ 77.84.02)	135	M2	1.176	12,40	14.582,40		1.176	12,40	14.582,40		1.176	12,40	14.582,40			
136	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πιάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους (ΝΑΟΙΚ 77.99)	136	M2	2,5	0,34	0,85		2,5	0,34	0,85			0,34	0,00		0,85	
137	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΝΑΟΙΚ 78.05.01)	137	M2	794	13,00	10.322,00		794	13,00	10.322,00		794	13,00	10.322,00			
138	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΝΑΟΙΚ 78.05.04)	138	M2	300	15,50	4.650,00		314,57	15,50	4.875,84		325,64	15,50	5.047,42		397,42	
139	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΝΑΟΙΚ 78.05.05)	139	M2	286	16,80	4.804,80		314,74	16,80	5.287,63		632,05	16,80	10.618,44		5.813,64	
140	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm (ΝΑΟΙΚ 78.30.01)	140	M2	20	25,90	518,00		20	25,90	518,00			25,90	0,00		518,00	
141	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες (ΝΑΟΙΚ 78.34)	141	M2	25	22,50	562,50		25	22,50	562,50		25	22,50	562,50			
	Σε μεταφορά					339.757,85				335.052,26				321.061,71		59.033,34	
																77.729,48	

ΕργαLand

Σελίδα 14

Εργολαβία

Σελίδα 15

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					339.757,85					335.052,26			321.061,71		77.729,48	
142	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm.(ΝΑΟΙΚ 79.40)	142	M2	113	13,50	1.525,50			113	13,50	1.525,50			0,00		1.525,50	
143	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm.(ΝΑΟΙΚ 79.55)	143	M2	356	14,00	4.984,00			356	14,00	4.984,00			6.975,78	1.991,78		
144	Αποκατάσταση σπλήης ρηγιμάτωσης τοιχοποιίας (ΑΤΕΚ 1)	144	MM	400	24,57	9.828,00			499	24,57	12.260,43			15.972,96	6.144,96		
145	Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης (ΑΤΕΚ 18)	145	MM	10	66,80	668,00			10	66,80	668,00			0,00		668,00	
146	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερέζ).(ΑΤΗΕ 8061.1)	146	M2	45	39,77	1.789,65			45	39,77	1.789,65			0,00		1.789,65	
147	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανακική																
147	Υδρορρόη από γαλβανισμένη ημικυκλική (ΑΤΗΕ 8062.1)	147	Χγρ.	235	23,56	5.536,60			100	23,56	2.356,00			0,00		5.536,60	
148	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική (ΑΤΗΕ 8062.3)	148	Χγρ.	15	14,34	215,10			15	14,34	215,10			0,00		215,10	
149	Γενική μόνωση επιφανείας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση																
149	Χλοοδάπνη (ΝΑΠΡΣ Γ01)	149	Στρμ.	0,25	105,00	26,25				105,00				0,00		26,25	
150	Προμήθεια φυτικής γης (ΝΑΠΡΣ Δ08)	150	M3	60	6,00	360,00				6,00				0,00		360,00	
151	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου																
151	Χλοοδάπνη (ΝΑΠΡΣ Ε13.2)	151	Στρμ.	0,25	5.500,00	1.375,00				5.500,00				0,00		1.375,00	
152	Πρόχυτα κρόσπεδα από σκυρόδεμα.(ΝΑΟΔΟ Β51)	152	MM	0,5	9,60	4,80				9,60				0,00		4,80	
153	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με ελαστική εποξειδικής ρητίνης (ΝΑΥΔΡ 10.23)	153	MM	20	20,60	412,00				20,60				0,00		412,00	
Σε μεταφορά						366.482,75					358.850,94			344.010,45		89.642,39	

Σελίδα 15

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σε μεταφορά

ΕργαLand

Σελίδα 17

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική			
Από μεταφορά							296.851,03							290.669,26			54.407,76	72.610,33
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΔΙΚΤΥΑ ΗΜ																		
2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ																		
1	Εργάριο συλκτιοδιανομένων υδροδιανομής, εγκατάστασης υδρέυσης ή θέρμανσης, χωνευτό, μεταλλικό (ΑΤΗ Ν18151.Ν1)	154	Τεμ.	1	49,16	49,16		1	49,16	49,16		1	49,16	49,16				
2	Συλλεκτηδιανομής υδροδιανομής μονός, ορειχάλκινος διαμέτρου έως 1 1/4", συστήματος ενδοδαπέδιος διανομής, 5-10 αναχωρήσεων (ΑΤΗ Ν18603.4.2)	155	Τεμ.	1	169,62	169,62		1	169,62	169,62		1	169,62	169,62				
3	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins (ΑΤΗ 8131.2.1)	156	Τεμ.	4	18,14	72,56		86	18,14	1.560,04		130	18,14	2.358,20			2.285,64	
4	Κρουσός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέτα διαμέτρου Φ 1/2 ins (ΑΤΗ 8138.2.2)	157	Τεμ.	2	13,80	27,60		2	13,80	27,60		2	13,80	27,60				
5	Διακείδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο/παιγιδός μηχανισμός), χωνευτή ή ορατή, διαμέτρου Φ 3/4 ins (ΑΤΗ Ν18154.1 ΣΧΕΤ)	158	Τεμ.	1	98,87	98,87		1	98,87	98,87		1	98,87	98,87				
6	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4 mm θερμικά αυτοσυνεπόμενος (ΑΤΗ Ν.8036.6)	159	ΜΜ	22	7,72	169,84		22	7,72	169,84		95,4	7,72	736,49			566,65	
Σε μεταφορά						587,66	296.851,03			2.075,13	290.669,26			3.439,94	278.648,46		2.852,29	

Σελίδα 17

Εργολαβία

Σελίδα 18

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο. Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική
	Από μεταφορά					587,65	296.851,03					2.075,13	290.669,26			3.439,94	278.648,46	2.852,29
7	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 5.4mm θερμικά αδιασυνεχούμενος (ΑΤΗ Ν.8039.7)	160	MM	14	14,59	204,26			282,4	14,59	4.120,22		297,4	14,59	4.339,07		4.134,81	
8	Βαλβίδα διακόπτης (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμολαλήτη, εντοχιζόμενη, με ροζέτα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 20 (ΑΤΗ Ν18131.3.1)	161	Τεμ.	2	23,29	46,58			2	23,29	46,58		2	23,29	46,58			
9	Βαλβίδα διακόπτης (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμολαλήτη, εντοχιζόμενη, με ροζέτα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 25 (ΑΤΗ Ν18131.3.2)	162	Τεμ.	2	26,79	53,58			11	26,79	294,69		11	26,79	294,69		241,11	
10	Αναμικτήρας (μπταταρίο) θερμού-ψυχρού ύδατος, επικαθήμενου τύπου, ορεχάλευνος, επιχρωμιωμένος ισοθετημένος σε νηπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ Ν18141.2.1)	163	Τεμ.	2	61,04	122,08			15	61,04	915,60		31	61,04	1.892,24		1.770,16	
11	Αναμικτήρας (μπταταρίο) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορεχάλευνος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins (ΑΤΗ 8141.3.2)	164	Τεμ.	1	70,31	70,31			1	70,31	70,31		3	70,31	210,93		140,62	
12	Σύνδεσμος εύκαμπτος (σπινράλ) μήκους έως 40 cm, ονομ. διαμέτρου 15 mm (1/2") από ελαστικό σωλήνα, ανοξείδωτο πλέγμα, κοχλιωτής συνδέσεως με ρακόρ (ΑΤΗ Ν18610.1.2)	165	Τεμ.	6	7,40	44,40			75	7,40	555,00		105	7,40	777,00		732,60	
Σε μεταφορά						1.128,86	296.851,03				8.077,53	290.669,26			11.000,45	278.648,46	9.871,59	

Εργασίες

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 19		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλλειπον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						1.128,86	296.851,03			8.077,53	290.669,26			11.000,46	278.648,46	9.871,59	
13	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins.(ΑΤΗΕ 8691.1)	166	MM	10	18,27	182,70		78	18,27	1.425,06		84	18,27	1.534,68		1.351,98	
(2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ) Σύνολο:						1.311,56				9.502,59				12.535,13		11.223,57	
2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																11.223,57	
1	Αποξήλωση-αποκομιδή ειδους υγιεινής ή υδραυλικού υποδοχέα, παντός τύπου.(ΑΤΗΕ Ν8151.Α)	167	Τεμ.	4	32,15	128,60		77	32,15	2.475,55		120	32,15	3.858,00		3.729,40	
2	Αποξήλωση δοχείου πλύσεως λεκάνης WC σιουδητότε τύπου, μετά σπινάλ σύνδεσης, πλήρης.(ΑΤΗΕ Ν8153.2)	168	Τεμ.	1	23,36	23,36		7	23,36	163,52		11	23,36	256,96		233,60	
3	Διάνοξη αλακού σε λιθοδομή ή άσπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αλακού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m(ΝΑΟΙΚ 22.37.02)	169	MM	2	22,50	45,00		25,9	22,50	582,75		95,1	22,50	2.139,75		2.094,75	
4	Εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδαρα γιά την τοποθέτηση σωληνώσεων δικτύων σε έδαφος γαιώδες.(ΑΤΗΕ Ν8302.1 ΣΧΕΤ)	170	M3	3	18,37	55,11		3	18,37	55,11				0,00		55,11	
5	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.(ΝΑΥΔΡ 4.09.02)	171	M2	1	18,50	18,50		1	18,50	18,50				0,00		18,50	
6	Πλέγμα σήμανσης και προστασίας υπογείων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους 300 mm.(ΝΑΟΙΚ ΒΣΧ79.16.01)	172	MM	15	0,60	9,00		15	0,60	9,00				0,00		9,00	
7	Φρεάτιο επισκέψεως δικτυων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσε: 30cm X 30cm(ΑΤΗΕ 8066.1.3)	173	Τεμ.	4	105,05	420,20		4	105,05	420,20				0,00		420,20	
Σε μεταφορά						689,77	296.851,03			3.724,63				6.254,71	278.648,46	6.057,75	502,81

Εργασίες

Σελίδα 20

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από μεταφορά																		
8	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάς: 30cm X 40cm(ΑΤΗΕ 8066.1.4)					699,77	296.851,03					3.724,63	290.669,26			6.254,71	278.648,46	502,81
9	Επίστρωση εσωτερικού φρεσίων με επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσεως (ΝΑΥΔΡ 16.35)	174	Τεμ.	3	121,31	363,93			3	121,31	363,93			121,31	0,00			363,93
10	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεσίων, σχάρες υπονόμων κατά ΕΛΟΤ Εν 124, φέρουσας ικανότητας Β125 (ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ49 ΣΧΕΤ)	175	Χηρ.	5	13,40	67,00			5	13,40	67,00			13,40	0,00			67,00
11	Καλύμματα φρεσίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και κατάλληλης φέρουσας ικανότητας (ανάλογα την θέση τοποθέτησης), μετά του πλαισίου έδρασης (ΝΑΥΔΡ ΝΑ11.01.03.01)	176	Χηρ.	25	2,90	72,50			25	2,90	72,50			2,90	0,00			72,50
12	Εκπομπή και πλήρη επανατοποθέτηση υφιστάμενου πλαισίου εδράσεως μετά καλύμματος ή σχάρας κάλυψης, φρεαίου επίσκεψης (ΝΑΥΔΡ Γ16.07.01Ν)	177	Χηρ.	5	9,30	46,50			5	9,30	46,50			9,30	0,00			46,50
13	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεαίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου (ΝΑΟΔΟ Β85)	178	Τεμ.	2	60,00	120,00			2	60,00	120,00			60,00	0,00			120,00
14	Σιφόνι συλλογής συμβίων διαπέδου, εξώστη ή δώματος, πλαισικά με σχάρα (ΑΤΗΕ 8046.1 ΣΧΕΤ)	179	Τεμ.	2	40,30	80,60			2	40,30	80,60			40,30	0,00			80,60
		180	Τεμ.	1	49,81	49,81			1	49,81	49,81			49,81	0,00			49,81
Σε μεταφορά																6.254,71	278.648,46	1.303,15

ΕργαLand

Σελίδα 20

ΕργΛοΓαδ

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 21	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						1.500,11	296.851,03			4.524,97	290.669,26			6.254,71	278.648,46	1.303,15	
15	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με κόφρα και εσχάρα γραμμωτή ορειχάλκινη χρωμέ (ΑΤΗΕ 8046.1.N)	181	Τεμ.	1	30,54	30,54		22	30,54	671,88		26	30,54	794,04	763,50		
16	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη χρωμέ, σε αντικατάσταση	182	Τεμ.	1	88,21	88,21		1	88,21	88,21			88,21	0,00		88,21	
18	Σχάρα σιφωνίου δαπέδου, διαμέτρου "τριτηλιού" Φ 10 cm, ορειχάλκινη, επichρωμιωμένη (ΑΤΗΕ N8046.1.N1)	183	Τεμ.	1	66,32	66,32		1	66,32	66,32			66,32	0,00		66,32	
19	Κανάλι υδροσυλλογής δαπέδου εγχειρισμένου με σχάρα τυποποιημένο από μεγάλης ανοχής πλαστικό HDPE (NAYΔP NΣ.11.02.03)	184	Τεμ.	3	11,13	33,39		3	11,13	33,39			11,13	0,00		33,39	
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 40 mm(ΑΤΗΕ N.8042.1.2)	185	MM	1	34,00	34,00		1	34,00	34,00			34,00	0,00		34,00	
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 50 mm(ΑΤΗΕ N.8042.1.3)	186	MM	5	12,47	62,35		5	12,47	62,35			12,47	0,00		62,35	
22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 63 mm (ΑΤΗΕ N8042.1.3)	187	MM	2	12,69	25,38		245,4	12,69	3.114,13		318,4	12,69	4.040,50	4.015,12		
		188	MM	1	12,93	12,93		1	12,93	12,93		1	12,93	12,93			
Σε μεταφορά						1.853,23	296.851,03			8.608,18	290.669,26			11.102,18	278.648,46	10.836,37	
																1.587,42	

ΕργαLand

Σελίδα 21

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική
						1.853,23	296.851,03			8.608,18	290.669,26			11.102,18	278.648,46
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 75 mm.(ΑΤΗ Ν8042.1.4)	189	MM	2	13,51	27,02			2	13,51	27,02			0,00	
24	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ100 mm.(ΑΤΗ Ν8042.1.5)	190	MM	3	14,40	43,20		25,5	14,40	367,20		35,5	14,40	511,20	468,00
25	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ. (ΑΤΗ Ν8063)	191	MM	2	10,51	21,02		2	10,51	21,02			10,51	0,00	21,02
26	Πύμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 75 mm.(ΑΤΗ Ν.8054.6)	192	Τεμ.	1	1,90	1,90		1	1,90	1,90			1,90	0,00	1,90
27	Πύμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 100 mm.(ΑΤΗ Ν.8054.8)	193	Τεμ.	5	2,17	10,85		5	2,17	10,85		8	2,17	17,36	6,51
28	Πύμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 125 mm.(ΑΤΗ Ν.8054.9)	194	Τεμ.	2	2,50	5,00		2	2,50	5,00			2,50	0,00	5,00
29	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.(ΑΤΗ 8151.2)	195	Τεμ.	1	192,13	192,13		1	192,13	192,13		1	192,13	192,13	
30	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm, χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.(ΑΤΗ Ν8181.2 ΣΧΕΤ)	196	Τεμ.	1	105,42	105,42		9	105,42	948,78		9	105,42	948,78	843,36
31	Κόβημα λεκανής πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού (ΑΤΗ 8179.2)	197	Τεμ.	2	22,97	45,94		10	22,97	229,70		10	22,97	229,70	183,76
Σε μεταφορά						2.306,71	296.851,03			10.411,78	290.669,26			13.001,36	278.648,46
															1.642,36

ΕργαLand

Σελίδα 22

ΕργΛογ

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 23
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλατιον Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					2.305,71	296.851,03			10.411,78	290.669,26			13.001,36	278.648,46	12.338,00	1.642,36
32	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) πλαστικό, επιποχίο, πλήρες (ΑΤΗ ΝΙ8153.1)	198	Τεμ.	1	62,01	62,01		1	62,01	62,01			62,01	0,00			62,01
33	Επισκευή πλωτήρα υδατοαποθήκης (φλοτέρ), δοχείου πλύσεως λεκάνης (ΑΤΗ ΝΙ8103.10)	199	Τεμ.	1	9,80	9,80		1	9,80	9,80			9,80	0,00			9,80
34	Αντικατάσταση πλωτήρα υδατοαποθήκης (φλοτέρ) δοχείου πλύσεως λεκάνης (ΑΤΗ ΝΙ8103.12)	200	Τεμ.	1	21,13	21,13		1	21,13	21,13			21,13	0,00			21,13
35	Αντικατάσταση μηχανισμού δοχείου πλύσεως λεκάνης (ΑΤΗ ΝΙ8103.13)	201	Τεμ.	1	32,46	32,46		1	32,46	32,46			32,46	0,00			32,46
36	Νιπτήρας νηπίων επιποχος ή ένθετος σε πάγκο, πλήρης, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκένωσης και 10 ορειχάλκινα επιχρωμιωμένο σιφώνι σχήματος "U" (ΑΤΗ 8160.1.ΣΧΕΤ)	202	Τεμ.	1	129,12	129,12		15	129,12	1.936,80			129,12	3.744,48		3.615,36	
37	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, επαγγελματικού τύπου, δύο σκαφών 40 x 40 x 30 περίπου cm, πλάτους περίπου 60 cm (ΑΤΗ Ν 8165.2.3)	203	Τεμ.	1	334,56	334,56		12	334,56	4.014,72			334,56	4.349,28		4.014,72	
38	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο, μίας σκάσης (ΑΤΗ ΝΙ8166.1)	204	Τεμ.	1	19,76	19,76		15	19,76	296,40			19,76	355,68		335,92	
39	Σιφώνι νεροχύτου με λιποσυλλέκτη από πολυαιθυλένιο ή ABS, δύο σκαφών (ΑΤΗ ΝΙ8166.2)	205	Τεμ.	1	42,67	42,67		1	42,67	42,67			42,67	0,00			42,67
	Σε μεταφορά					2.957,22	296.851,03			16.827,77	290.669,26			21.450,79	278.648,46	20.304,00	1.810,43

ΕργαLand

Σελίδα 23

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 24		
Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Αποϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
	Από μεταφορά					2.957,22	296.851,03			16.827,77	290.669,26			21.450,78	278.648,46	20.304,00	1.810,43
40	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπίζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm.(ΑΤΗ 8168.2)																
41	Αγγιστρο (γάντζος) ανορίτσεως, ορεχάλκινο, επιχρωμιωμένο, επίτοιχο, δπλό.(ΑΤΗ Ν18175.2)	206	Τεμ	1	21,21	21,21			1	21,21	21,21			21,21	0,00		21,21
42	Χαριθθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι (ΑΤΗ Ν18178.1.2N)	207	Τεμ	2	13,96	27,92			19	13,96	265,24			19	13,96	265,24	237,32
43	Δοχείο απορριμμάτων V.C. από ανοξείδωτο ατσάλι(ΑΤΗ Ν18176.22.1)	208	Τεμ	1	14,06	14,06			5	14,06	70,30			5	14,06	70,30	56,24
209			Τεμ	1	28,17	28,17			7	28,17	197,19			7	28,17	197,19	169,02
44	Επίδαπτεδίο πηγάδι, ανοξείδωτο(ΑΤΗ Ν18176.23.1)	210	Τεμ	1	30,17	30,17			7	30,17	211,19			7	30,17	211,19	181,02
45	Αποξήλωση και πλήρη επαναστοθέτηση υποδοχέα ειδών υγιεινής, οισυδρήτοτε τύπου(ΑΤΗ Ν19392.2.4.3)	211	Τεμ	1	55,07	55,07			1	55,07	55,07				55,07	0,00	55,07
46	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης διαμέτρου από Φ32 έως Φ 100, από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή έδαφος(ΑΤΗ Ν18043.2.2)	212	ΜΜ	5	5,79	28,95			171,4	5,79	992,41			171,4	5,79	992,41	963,46
47	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης διαμέτρου από Φ110έως Φ200, από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή έδαφος(ΑΤΗ Ν18043.2.3)	213	ΜΜ	1	8,04	8,04			1	8,04	8,04				8,04	0,00	8,04
48	Συνδεση αποχέτευσης σε υφιστάμενη κατακόρυφη στήλη, με χρήση ειδικών τειμαχίων.(ΝΑΥΔΡ ΝΑ.16.18.01)	214	Τεμ	1	124,00	124,00			15	124,00	1.860,00			30	124,00	3.720,00	3.596,00
	Σε μεταφορά					3.294,81	296.851,03			20.508,42	290.669,26			26.907,12	278.648,46	25.507,06	1.894,75

ΕργαLand

Σελίδα 24

Εργολάβος

Σελίδα 25

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά																	
49	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης Dn 100-200 mm, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος. (ΝΑΥΔΡ Γ16.40.01.N)	215	MM	1	4,70	4,70		1	4,70	4,70			4,70	0,00			4,70
50	Σύνδεση αγωγού αποχέτευσης διαμέτρου έως και Φ160 mm και σε βάθος ως και 1,50 m με υφιστάμενο σε λειτουργία φρεάτιο (ΝΑΥΔΡ Α116.01.2N)	216	Τεμ.	1	75,00	75,00		1	75,00	75,00			75,00	0,00			75,00
51	Σετ ειδών υγιεινής W.C. ΑμΕΑ (ατόμων με ειδικές ανάγκες) και λοιπού εξοπλισμού, πλήρες [ΑΤΗΕ Ν18307.2.1]	NT1	Τεμ.					2	1.811,39	3.622,78			6	1.811,39	10.868,34		10.868,34
52	Αναμικτήρας (μπταριό) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος /λουτήρα ή λεκάνης καταιονητήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονητήρα [ΑΤΗΕ 8141.4.3]	NT2	Τεμ.					10	120,04	1.200,40			13	120,04	1.560,52		1.560,52
53	Αναμικτήρας (μπταριό) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins, με αποσπώμενο "χώνευο" ντους [ΑΤΗΕ Ν18141.3.2]	NT3	Τεμ.					8	191,37	1.530,96			8	191,37	1.530,96		1.530,96
54	Λεκάνη καταιονητήρα με βαλβίδα Χαλύβδινη ερμητική διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm [ΑΤΗΕ 8162.1.1]	NT4	Τεμ.					8	140,61	1.124,88			10	140,61	1.406,10		1.406,10
(2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) Σύνολο:						3.374,51				28.067,14				42.273,04		40.872,98	1.974,45
2.3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ																38.898,53	
1	Φωτιστικό σώμα κώδωνα ύδατος, επίτοιχο ή οροφής, με λαμπτήρα φθορισμού ή led (ΑΤΗΕ Ν18983.6.2)	217	Τεμ.	3	51,98	155,94		3	51,98	155,94			3	51,98	155,94		
Σε μεταφορά						155,94	296.851,03			155,94	290.669,26			155,94	278.648,46		

Εργολαβή

Σελίδα 26

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον	Επί ελάττων
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					155,94	296.851,03					155,94	290.669,26			155,94	278.648,46
2	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4Χ18W με οθόνη από πετασίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, σώμα από ασφάλνη λαμαρίνα με ενισχυμένη βάση βαμμένη με λευκό χρώμα φούρνου, στεγασμένων χώρων, με ηλεκτρονικά πηνία, προστασίας IP20, με λαμπτήρες φθορισμού Χρωματικ	218	Τεμ.	1	86,77	86,77		1	86,77	86,77				1	86,77	86,77	
3	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ8W με οθόνη από πετασίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, σώμα από ασφάλνη λαμαρίνα με ενισχυμένη βάση βαμμένη με λευκό χρώμα φούρνου, στεγασμένων χώρων, με ηλεκτρονικά πηνία, προστασίας IP20, με λαμπτήρες φθορισμού Χρωματικ	219	Τεμ.	1	74,09	74,09		1	74,09	74,09				1	74,09	74,09	
4	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ8W με οθόνη από πετασίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, σώμα από ασφάλνη λαμαρίνα με ενισχυμένη βάση βαμμένη με λευκό χρώμα φούρνου, στεγασμένων χώρων, με ηλεκτρονικά πηνία, προστασίας IP20, με λαμπτήρες φθορισμού Χρωματικ	220	Τεμ.	1	80,51	80,51		12	80,51	966,12				27	80,51	2.173,77	2.093,26
	Σε μεταφορά					387,31	296.851,03			1.282,92	290.669,26				2.490,57	278.648,46	2.093,26

ΕργαLand

Σελίδα 26

Εργολαβία

Σελίδα 27

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
Από μεταφορά						397,31	296.851,03			1.282,92	290.669,26			2.490,57	278.648,46	2.093,26	
5	Φωτιστικό σώμα οροφής, τύπου πλαφονιέρας, με ανοξείδωτο σώμα και κάλυμμα από γυαλί, με λαμπτήρα PL 18W/230 V, ενδεικτ. διαστάσεων Φ 28x8 cm.(ΑΤΗ ΝΙ8982.1.6)	221	Τεμ.	2	52,20	104,40		20	52,20	1.044,00		22	52,20	1.148,40		1.044,00	
6	Φωτιστικό σώμα επίτοιχο ή οροφής τύπου "χελώνας" με ενσωματωμένα led ισχύος 12 έως 18 W, στεγανό IP54 (ΑΤΗ ΝΙ8982.6.1B)	222	Τεμ.	12	40,00	480,00		12	40,00	480,00		12	40,00	480,00			
7	Φωτιστικό σώμα, προβολέας, ασύμμετρης δέσμης με φωτεινές πηγές διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 50 W(ΑΤΗ ΝΙ9375.2)	223	Τεμ.	1	109,63	109,63		1	109,63	109,63		1	109,63	109,63			
8	Φωτιστικό σώμα, προβολέας, με φωτεινές πηγές διόδων φωτοεκπομπής (led) ισχύος 70 W(ΑΤΗ ΝΙ9375.2Α)	224	Τεμ.	1	129,76	129,76		1	129,76	129,76		1	129,76	129,76			
9	Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού ισχύος από 18W έως και 58W χρωματικής απόδοσης 3000-4000K (ή και φωτισωλάντας με λενιστανία ισδυνάμους ισχύος).(ΑΤΗ ΝΙ9455)	225	Τεμ.	18	5,89	106,02		18	5,89	106,02		18	5,89	106,02			
10	Καθαρισμός φωτιστικού σώματος φθορισμού 20W, 40W, ή 65W οροφής (ΑΤΗ 9410)	226	Τεμ.	1	18,36	18,36		1	18,36	18,36		1	18,36	18,36			
11	Συλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm.(ΑΤΗ 8732.1.3)	227	ΜΜ	85	3,98	338,30		85	3,98	338,30		85	3,98	338,30			
12	Συλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινρά 16mm.(ΑΤΗ 8732.2.3)	228	ΜΜ	12	3,96	47,52		12	3,96	47,52		12	3,96	47,52			
Σε μεταφορά						1.731,30	296.851,03			3.556,51	290.669,26			4.868,56		3.137,26	

Σελίδα 27

Εργασίες

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 28		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά						1.731,30	296.851,03			3.556,51	290.669,26			4.868,56	278.648,46	3.137,26	
13	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, τύπου CONDuR, διαμέτρου 16 mm.(ATHE N18732.1.3)	229	MM	35	4,24	148,40		35	4,24	148,40		35	4,24	148,40			
14	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, τύπου CONDuR, διαμέτρου 20 mm.(ATHE N18732.1.4)	230	MM	15	4,58	68,70		670,3	4,58	3.069,97		670,3	4,58	3.069,97		3.001,27	
15	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, τύπου CONDuR, διαμέτρου 25 mm.(ATHE N18732.1.5)	231	MM	10	5,26	52,60		10	5,26	52,60		10	5,26	52,60			
16	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC τύπου univolt Φ32 (ATHE N18733.1)	232	MM	25	10,74	268,50		131	10,74	1.406,94		131	10,74	1.406,94		1.138,44	
17	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1/2 ins.(ATHE 9316.1)	233	MM	1	6,70	6,70		1	6,70	6,70		1	6,70	6,70			
18	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins.(ATHE 9316.2)	234	MM	1	12,22	12,22		1	12,22	12,22		1	12,22	12,22			
19	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 ins.(ATHE 9316.3)	235	MM	1	14,74	14,74		1	14,74	14,74		1	14,74	14,74			
20	Αποξήλωση πλαστικού καναλιού διανομής ηλεκτρικών καλωδίων οποιασδήποτε διάστασης.(ATHE N18741.ΣΧΕΤ)	236	MM	35	1,65	57,75		35	1,65	57,75		35	1,65	57,75			
Σε μεταφορά						2.360,91	296.851,03			8.325,83	290.669,26			9.637,88	278.648,46	7.276,97	

ΕργΛαύδ

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 29	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						2.360,91	296.851,03			8.325,83	290.669,26			9.637,88	278.648,46	7.276,97	
21	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικροαλκίων, διαστάσεων 15x15 mm.(ATHE N18741.1.N1)	237	MM	25	4,83	120,75		25	4,83	120,75		25	4,83	120,75			
22	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικροαλκίων, διαστάσεων 25x25 mm.(ATHE N18741.1.N2)	238	MM	15	7,62	114,30		132	7,62	1.005,84		182	7,62	1.386,84		1.272,54	
23	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικροαλκίων, διαστάσεων 40x40 mm.(ATHE N18741.1.N3)	239	MM	5	9,07	45,35		99,5	9,07	902,47		99,5	9,07	902,47		857,12	
24	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικροαλκίων, διαστάσεων 60x40 mm.(ATHE N18741.1.N4)	240	MM	5	11,62	58,10		5	11,62	58,10		19	11,62	220,78		162,68	
25	Πλαστικό κανάλι διανομής 105x50 mm, ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, επίτοιχο, τύπου LEGRAND DLP (ATHE N18776.1.8N)	241	MM	45	18,81	846,45		45	18,81	846,45		45	18,81	846,45			
26	Εξόρμητα καναλιού ηλεκτρικών γραμμών, τύπου LEGRAND DLP (ATHE N18732.3.4N)	242	Τεμ.	25	13,88	347,00		25	13,88	347,00		25	13,88	347,00			
Σε μεταφορά						3.892,86	296.851,03			11.606,44	290.669,26			13.462,17	278.648,46	9.569,31	

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 30
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον
	Από μεταφορά					3.892,86	296.851,03			11.606,44	290.669,26			13.462,17	278.648,46	9.569,31	
27	Σχάρα καλωδίων 100x60 mm γολθοναμένη, διάτρητη (ΑΤΗ Ν.8741.2.1)	243	Τεμ	10	16,67	166,70			10	16,67	166,70		16,67	0,00			166,70
28	Εσχάρα καλωδίων, για χρήση σε εσωτερικούς ξηρούς χώρους, βαρέως τύπου, από προγαλβανισμένη λαμαρίνα κατά EN 10147:2000, με/χωρίς κοπτάκι, διαστάσεων 150x60 mm.(ΑΤΗ Ν.8741.3)	244	ΜΜ	5	26,14	130,70			5	26,14	130,70		26,14	0,00			130,70
29	Σχάρα καλωδίων 200x60 mm γολθοναμένη, διάτρητη (ΑΤΗ Ν.8741.2.2)	245	Τεμ	5	24,25	121,25			5	24,25	121,25		24,25	0,00			121,25
30	Αποξήλωση - εκπομπή ηλεκτρικών αγωγών ή καλωδίων οποιασδήποτε διατομής, υπογείων, ορατών ή εντοιχισμένων.(ΑΤΗ Ν.9419.1)	246	ΜΜ	25	1,83	45,75		848,5	1,83	1.552,76		848,5	1,83	1.552,76		1.507,01	
31	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2(ΑΤΗ 8751.1.2)	247	ΜΜ	270	1,28	345,60		270	1,28	345,60			1,28	0,00			345,60
32	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2 (ΑΤΗ 8751.1.3)	248	ΜΜ	180	1,38	248,40		180	1,38	248,40			1,38	0,00			248,40
33	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2(ΑΤΗ 8766.2.1)	249	ΜΜ	65	4,12	267,80		65	4,12	267,80			4,12	0,00			267,80
34	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2(ΑΤΗ 8766.3.1)	250	ΜΜ	20	5,07	101,40		680,2	5,07	3.448,61		868,7	5,07	4.404,31		4.302,91	
35	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2.(ΑΤΗ 9336.1.2)	251	ΜΜ	25	6,44	161,00		421,7	6,44	2.715,75		626,7	6,44	4.035,95		3.874,95	
36	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενιπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2 (ΑΤΗ 8766.5.4)	252	ΜΜ	15	11,20	168,00		80,1	11,20	897,12		169,1	11,20	1.893,92		1.725,92	
	Σε μεταφορά					5.649,46	296.851,03			21.501,13	290.669,26			25.349,11	278.648,46	20.980,10	1.280,45

ΕργαLand

Σελίδα 31

Εργολαβία

Σελίδα 32

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί ελάτιον Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						7.183,29	296.851,03			23.693,48	290.669,26			29.182,88	278.648,46	23.285,50	1.285,90
45	Κύριο διακλαδώσεις καλωδίων, πλαστικό στεγανό IP55, εξωτερικής τοποθέτησης, διαστάσεων 82x82x43 mm.(ΑΤΗ Ν18375.1.2)	261	Τεμ.	1	5,05	5,05		1	5,05	5,05		1	5,05	5,05			
46	Κύριο διακλαδώσεις ενδοδαπέδιας ή επιτοίχιας διανομής, εξωτερικού χώρου, ενδεικτ. διαστάσεων 245x190x90 mm, στεγανό, βαθμού προστασίας IP65.(ΑΤΗ Ν18742.4)	262	Τεμ.	1	27,18	27,18		1	27,18	27,18		1	27,18	27,18			
47	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ισχύος 40 W.(ΑΤΗ Ν19402.2)	263	Τεμ.	1	10,96	10,96		1	10,96	10,96		1	10,96	10,96			
48	Εκκμητής (στάμερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου μετά και της βάσεως εκκμητή.(ΑΤΗ Ν19404.ΣΧΕΤ)	264	Τεμ.	1	2,90	2,90		1	2,90	2,90		1	2,90	2,90			
49	Αξονικός (ελικοειδής) ανεμιστήρας εξερισμού χώρου υγιεινής (W.C., λουτρό).(ΑΤΗ Ν18559.1Α)	265	Τεμ.	2	61,20	122,40		2	61,20	122,40		2	61,20	122,40			
50	Θερμοσφώνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 l ισχύος 2000 W.(ΑΤΗ 8256.2.1)	266	Τεμ.	1	153,23	153,23		1	153,23	153,23		3	153,23	459,69		306,46	
51	Θερμοσφώνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W.(ΑΤΗ 8256.5.1)	267	Τεμ.	1	194,17	194,17		5	194,17	970,85		6	194,17	1.165,02		970,85	
52	Θερμοσφώνας διπλής ενέργειας 80 λίτρων/4 KW, πλήρως διασυνδεδεμένος (ΑΤΗ Ν18256.6.1)	268	Τεμ.	1	240,26	240,26		1	240,26	240,26		1	240,26	240,26			
Σε μεταφορά						7.939,44	296.851,03			25.226,31	290.669,26			31.216,36	278.648,46	24.562,81	1.285,90

ΕργαLand

Σελίδα 32

Εργολαβία

Σελίδα 33

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
Από μεταφορά						7.939,44	296.851,03			25.226,31	290.669,26			31.216,35	278.648,46	1.285,90	
53	Ηλεκτρός θερμωσίματος "διπλής ενέργειας" χωρητικότητας ζεστού νερού χρήσης 160 lt, πλήρης (ΑΤΗΕ Ν18256.8.4)	269	Τεμ.	1	1.563,55	1.563,55		1	1.563,55	1.563,55		1	1.563,55	1.563,55			
54	Επίπεδος ηλεκτρός συλλέκτης, με επλεκτική απορροφητική επιφάνεια, υψηλής απόδοσης (ΑΤΗΕ Ν18258.1)	270	Μ2	1	262,18	262,18		1	262,18	262,18		1	262,18	262,18			
55	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολυκλωκός Διατομής 50mm2 (ΑΤΗΕ Ν19340.5)	271	ΜΜ	5	9,24	46,20		5	9,24	46,20			9,24	0,00		46,20	
56	Αγωγός κυκλικής διατομής χαλυβδίνος γυμνός μονόκλωκός γυμνός Διαμέτρου Φ 8mm (διατομής περίπου 50mm2) (ΑΤΗΕ Ν19340.5Α)	272	ΜΜ	10	6,63	66,30		10	6,63	66,30			6,63	0,00		66,30	
57	Αγωγός γυμνός αλουμινίου μονόκλωκός γυμνός Διαμέτρου Φ 8mm (διατομής περίπου 50mm2) (ΑΤΗΕ Ν19340.5Β)	273	ΜΜ	10	10,50	105,00		10	10,50	105,00			10,50	0,00		105,00	
58	Στήριγματα ή συνδέσμοι αγωγών γειώσεως δικτύου αντικεραυνικής προστασίας, διαμέτρου αγωγών Φ8-Φ 10*1,1 (ΑΤΗΕ Ν18838.1.1.1)	274	Τεμ.	25	8,00	200,00		25	8,00	200,00			8,00	0,00		200,00	
59	Διακόπτης χονετός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός [ΑΤΗΕ 8801.1.1.]	NT5	Τεμ.					13	4,06	52,78		18	4,06	73,08		73,08	
60	Διακόπτης χονετός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ [ΑΤΗΕ 8801.1.4]	NT6	Τεμ.					6	5,84	35,04		7	5,84	40,88		40,88	
61	Ρευματοδότης χονετός SCHUKO εντάσεως 16 Α [ΑΤΗΕ 8826.3.2]	NT7	Τεμ.					10	9,04	90,40		21	9,04	189,84		189,84	
Σε μεταφορά						10.182,67	296.851,03			27.647,76	290.669,26			33.345,88	278.648,46	1.703,40	

Σελίδα 33

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 34

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μέριση	Ολική	Ποσότητες σε ΕΥΡΩ	Μέριση	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μέριση	Ολική	Επί πλάνο	Επί έκδοτων Από Προϋπολογισμό		
Από μεταφορά						10.182,67	296.851,03			27.647,76	290.669,26			33.345,88	278.648,46	24.866,61	1.703,40	
62	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχος τοποθέτησης, έως εἴς (6) αναχωρήσεων, πλήρης με τα ὄργανά του [ATHE Nl8840.1.1A]	NT8	Τεμ					6	376,21	2.257,26			8	376,21	3.009,68		3.009,68	
63	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχος τοποθέτησης, ἐπὶ (7) ἔως δώδεκα(12) αναχωρήσεων, πλήρης με τα ὄργανά του [ATHE Nl8840.1.1B]	NT9	Τεμ					1	548,96	548,96			1	548,96	548,96		548,96	
64	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχος τοποθέτησης, δεκατριῶν (13) ἔως εἴκοσι (20) αναχωρήσεων, πλήρης με τα ὄργανά του [ATHE Nl8840.2.1A]	NT10	Τεμ					1	720,21	720,21			1	720,21	720,21		720,21	
65	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχος τοποθέτησης, εἰκοσιένα (21) ἔως εἰκοσιπέντε (25) αναχωρήσεων, πλήρης με τα ὄργανά του [ATHE Nl8840.2.1B]	NT11	Τεμ					1	777,17	777,17			1	777,17	777,17		777,17	
(2.3. ΙΣΧΥΡΑ ΠΕΥΝΑ ΤΑ) Σύνολο:						10.182,67				31.951,36				38.401,90		25.922,63	1.703,40	
2.4. ΑΣΘΕΝΗ ΠΕΥΝΑ ΤΑ																28.219,23		
1	Ηλεκτρικά καυδύνη εξώθυρος (ATHE N.8797.12.A)	275	Τεμ		1	95,21	95,21											
2	Προμήθεια και εγκατάσταση θυρομεγαφώνου αμφίπλευρης ομιλίας με ηλεκτρική κλειδαριά (ATHE Nl8992.1.7)	276	Τεμ		1	345,00	345,00											
3	*Λόδιο ψηφιακού δικτύου UTP Cat 6, 4 ζευγών (ATHE Nl8796.1.3)	277	MM		50	2,45	122,50											
4	Διπάδος τηλεφωνικών ρευματοδόξης RJ -45, UTP/Cat6 (ATHE Nl9500.2)	278	Τεμ		2	16,95	33,90											
Σε μεταφορά							596,61	296.851,03				596,61	290.669,26			901,64	278.648,46	305,03

ΕργΛοΓαδ

Σελίδα 35

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από μεταφορά																		
5	Πρίζα RJ45 - Cat. 6 πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, ενδ. τύπου Legrand Mosaic ή ισοδύναμου (ΑΤΗ Ν8743.3.3Α)	278	Τεμ.	8	12,02	96,16		8	12,02	96,16								
6	Ομοεξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών, 75 Ω, υψηλής ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης (κλάσης A++ τουλάχιστον) (ΑΤΗ Ν 8796.1.2)	280	ΜΜ	20	3,31	66,20		20	3,31	66,20				0,00		66,20		
7	Κράσια TV, μπάνιας UHF μετά ιστού στήριξης (ΑΤΗ Ν9730.1Α)	281	Τεμ.	1	150,00	150,00		1	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00		
8	Εν'υψής σήματος κεράσις TV, με καταμετρητή, πλήρης (ΑΤΗ Ν9730.4)	282	Τεμ.	1	75,00	75,00		1	75,00	75,00			75,00	0,00		75,00		
						983,97				983,97				997,80		305,03	291,20	
																		13,83
2.5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ																		
1	Αποξήλωση υφιστάμενης δεξμενής πειρελάου (ΝΑΟΙΚ Α12.56 ΣΧΕΤ.2)	283	Τεμ.	1	550,00	550,00		1	550,00	550,00				1.650,00		1.100,00		
2	Εκκένωση ύδατος, επαναπλήρωση, εξερισμός δικτύου θέρμανσης, δοκιμές λειτουργίας (ΑΤΗ Ν8693.5.1)	284	Τεμ.	1	80,00	80,00		5	80,00	400,00						480,00		
3	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων διαμέτρου από 1/2" έως 1 1/4", από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή εδάφος (ΑΤΗ Ν8040.1)	285	ΜΜ	30	3,21	96,30		94	3,21	301,74				0,00		96,30		
4	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων διαμέτρου από 1 1/2" έως 2", από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή εδάφος (ΑΤΗ Ν8040.2)	286	ΜΜ	15	5,14	77,10		20	5,14	102,80				0,00		77,10		
						803,40	296.851,03			1.354,54	290.669,26			2.210,00		1.580,00	173,40	
						Σε μεταφορά												

ΕργαLand

Σελίδα 35

ErgoLand

Σελίδα 36

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλλειπον Απο Προϋπολογισμό		
Από μεταφορά						803,40	296.851,03					1.354,54	290.669,26			2.210,00	278.648,46	1.580,00	173,40
5	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων διαμέτρου από 3" έως 4", από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή εδάφους (ΑΤΗ Ν18040.3)	287	MM	5	6,43	32,15				5	6,43	32,15				6,43	0,00		32,15
6	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ 8034.1)	288	MM	15	13,61	204,15			15	13,61	204,15					13,61	0,00		204,15
7	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins.(ΑΤΗ 8034.2)	289	MM	10	15,96	159,60			10	15,96	159,60					15,96	0,00		159,60
8	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins.(ΑΤΗ 8034.3)	290	MM	5	19,63	98,15			5	19,63	98,15					19,63	0,00		98,15
9	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins.(ΑΤΗ 8034.4)	291	MM	5	22,63	113,15			5	22,63	113,15					22,63	0,00		113,15
10	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins.(ΑΤΗ 8034.5)	292	MM	4	25,71	102,84			4	25,71	102,84			4	25,71	102,84			
11	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins.(ΑΤΗ 8034.6)	293	MM	2	30,33	60,66			2	30,33	60,66			2	30,33	60,66			
12	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθYLENIO (PE) Φ 18x2 mm, σε σπρώξιμο θέρμανσης - ύδρευσης (ΑΤΗ Ν18151.1.1Α)	294	MM	20	4,69	93,80			93	4,69	436,17			134,8	4,69	632,21		538,41	
13	Ευκαμπτός χάλκασωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm, πάχους τοιχώματος 1 mm, επενδεδυμένος (ΑΤΗ Ν18041.5.1 ΣΧΕ Τ)	295	MM	1	10,95	10,95			1	10,95	10,95					10,95	0,00		10,95
14	Χάλκασωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm.(ΑΤΗ 8041.5.1)	296	MM	10	7,08	70,80			10	7,08	70,80					7,08	0,00		70,80
Σε μεταφορά						1.749,65	296.851,03					2.643,16	290.669,26			3.005,71	278.648,46	2.118,41	862,35

5ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας														Σελίδα 37													
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ											
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαπον Απο Προϋπολογισμό										
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική												
Από μεταφορά																1.749,65	296.851,03			2.643,16	290.669,26			3.005,71	278.648,46	2.118,41	862,35
15	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm (ΑΤΗΕ 8041.6.1)	297	ΜΜ	15	8,68	130,20		15	8,68	130,20			8,68	0,00						130,20							
16	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm (ΑΤΗΕ 8041.7.1)	298	ΜΜ	5	11,53	57,65		5	11,53	57,65			11,53	0,00						57,65							
17	Κατασκευή σημείου λήψης νερού (μιαστός), διατομής Φ 1/2", σε υψιστάμενο συλλέκτη, διανομέα ή χαλυβδόσωληνα (ΑΤΗΕ Ν8602.15)	299	Τεμ.	1	20,47	20,47		47	20,47	962,09		64	20,47	1.310,08				1.289,61									
18	Ζεύγος ορθογώνιων συλλεκτοδιανομέων διαμέτρου έως 1 1/4", 5-10 αναχωρήσεων, συστήματος ενδοδαπέδιας διανομής δικτύου θέρμανσης, μετά και του ερμαρίου υδρόληψιας (ΑΤΗΕ Ν8603.4.2Α)	300	Τεμ.	1	367,23	367,23		1	367,23	367,23		1	367,23	367,23													
19	Αποξήλωση θερμαντικού σώματος χαλύβδινου, εγχώριου ή τύπου panel, οισυδρήτοτε τύπου και μεγέθους (ΑΤΗΕ Ν9418.1)	301	Τεμ.	5	18,36	91,80		13	18,36	238,68		18	18,36	330,48				238,68									
20	Αποξήλωση και μετεγκατάσταση θερμαντικού σώματος χαλύβδινου, εγχώριου, οισυδρήτοτε τύπου και μεγέθους (H/M 26.N)	302	Τεμ.	5	74,18	370,90		13	74,18	964,34		18	74,18	1.335,24				964,34									
21	Θερμαντικά σώματα τύπου Panel, με πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442-2, χαλύβδινα, βαμμένα με πολυεστερική βαφή (ΑΤΗΕ Ν8432.7.N1)	303	kcal/h	10.000	0,11	1.100,00		28.883	0,11	3.177,13		34.927	0,11	3.841,97				2.741,97									
22	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος, ορθογώνια, χρωμέ, ευθεία ή γωνιακή, διαμέτρου 1/2 ins (ΑΤΗΕ Ν8445.1)	304	Τεμ.	8	12,13	97,04		32	12,13	388,16		40	12,13	485,20				388,16									
Σε μεταφορά							3.984,94	296.851,03			8.928,64	290.669,26			10.675,91	278.648,46	7.741,17	1.050,20									



Εργασίες

Σελίδα 38

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
Από μεταφορά						3.984,94	296.851,03			8.928,64	290.669,26			10.675,91	278.648,46	7.741,17	1.050,20
23	Αντικατάσταση ρυθμιστικής βαλβίδας θερμαντικού σώματος, ορειχάλκινης, χρωμέ, ευθείας ή γωνιακής, διαμέτρου 1/2 ins.(ATHE N18445.2)	305	Τεμ.	10	26,52	265,20		14	26,52	371,28		14	26,52	371,28		106,08	
24	Αυτόνομη διόδη θερμστατική βαλβίδα ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού, κοχλιωτής συνδέσεως ονομαστικής διαμέτρου 1/2" (ATHE N18264)	306	Τεμ.	1	24,83	24,83		1	24,83	24,83		1	24,83	24,83			
25	Αυτόνομη διόδη θερμστατική βαλβίδα ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού, κοχλιωτής συνδέσεως ονομαστικής διαμέτρου 1/2", σε αντικατάσταση υφιστάμενης βαλβίδας οιοδήποτε τύπου.(ATHE N18264.N1)	307	Τεμ.	1	34,01	34,01		1	34,01	34,01		1	34,01	34,01			
26	Βαλβίδα εξερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επνικελωμένη διαμ. 1/4 ins.(ATHE N18447)	308	Τεμ.	20	3,21	64,20		20	3,21	64,20		20	3,21	64,20			
27	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξερισμό σκληνώσεων νερού, διαμέτρου σπτερώματος 3/8 ins για πίεση λειτουργίας έως 5 atm(ATHE 8505.1.2)	309	Τεμ.	4	35,44	141,76		4	35,44	141,76		4	35,44	141,76			
28	Μίνι διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in.(ATHE N.8104.1.1)	310	Τεμ.	10	11,17	111,70		17	11,17	189,89		20	11,17	223,40		111,70	
29	Γόνατο Z" για προσαρμογή κέντρων σύνδεσης θερμαντικών σωμάτων, διαμέτρου 1/2 ins.(ATHE N18445.2.1)	311	Τεμ.	2	19,89	39,78		2	19,89	39,78		2	19,89	39,78			
Σε μεταφορά						4.666,42	296.851,03			9.794,39	290.669,26			11.575,17	278.648,46	7.968,95	1.050,20

ΕργαLand

Σελίδα 38

Εργολαβία

Σελίδα 39

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
Από μεταφορά						4.666,42	296.851,03			9.794,39	290.669,26			11.575,17	278.648,46	7.968,95	1.050,20	
30	Προμήθεια και τοποθέτηση στηρίγματος δαπέδου, κοινού χαλύβδινου θερμαντικού σώματος, χρωμέ, πλήρες (ΝΑΦΡΑ ΑΙ4 16 ΣΧΕΤ)	312	Τεμ.	2	15,95	31,90		2	15,95	31,90		2	15,95	31,90			7.968,95	1.050,20
(2.5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Σύνολο:						4.698,32				9.825,29				11.607,07			6.908,75	
2.6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ																		
1	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας σε οποιαδήποτε θέση (ΑΤΗΕ ΝΙ8557.1.1)	313	Τεμ.	1	180,00	180,00		2	180,00	360,00		2	180,00	360,00		180,00		
2	Αποξήλωση υφιστάμενης ανίλως θερμότητας ή κλιματιστικής μονάδας διασπόμενου τύπου, οιασδήποτε θερμαντικής/ψυκτικής																	
3	ικανότητας (ΑΤΗΕ ΝΙ8557.1.1Α) Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διασπόμενου τύπου (split system), ψυκτικής ισχύος από 8.000 Btu/h έως 19.000 Btu/h (ΑΤΗΕ ΝΙ8557.1.2)	314	Τεμ.	1	80,00	80,00		1	80,00	80,00		1	80,00	80,00				
4	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διασπόμενου τύπου (split system) ή πολυδιασπόμενου τύπου (VRV ή VRF), ψυκτικής ισχύος από 19.001 Btu/h έως 32.000 Btu/h (ΑΤΗΕ ΝΙ8557.1.3)	315	Τεμ.	8	35,70	285,60		8	35,70	285,60		8	35,70	285,60				

ΕργαLand

Σελίδα 39

ΕργΛand

Σελίδα 40

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ				
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Από μεταφορά					729,20	296.851,03					909,20	290.669,26			909,20	278.648,46	180,00
5	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διαρρέονου τύπου (split system) ή πολυδιαρρέονου τύπου (VRV ή VRF) ή τύπου "ντουλάπας", ψυκτικής ισχύος από 32.001 Btu/h έως 64.000 Btu/h (ΑΤΗΕ Ν8557.1.3Α)	317	Τεμ.	1	56,10	56,10		1	56,10	56,10		1	56,10	56,10				
6	Αντικατάσταση φθαρμένου ανεμιστήρα εξωτερικής ή και εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας (ΑΤΗΕ Ν8557.1.5)	318	Τεμ.	1	68,21	68,21		1	68,21	68,21		1	68,21	68,21				
7	Πλήρωση ψυκτικού υγρού κυκλώματος σωληνώσεων-συμπιεστού μονάδας κλιματισμού, άνευ εργασίας συντήρησης (ΑΤΗΕ Ν8557.1.6)	319	Χγρ.	17	38,84	660,28		17	38,84	660,28		17	38,84	660,28				
8	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαρρέονου τύπου (split), απόδοσης σε ψύξη 9.000 Kcal/h. (ΑΤΗΕ Ν8551.2Α)	320	Τεμ.	1	958,29	958,29		1	958,29	958,29		1	958,29	958,29				
9	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαρρέονου τύπου (split), απόδοσης σε ψύξη 12.000 Kcal/h. (ΑΤΗΕ Ν8551.3)	321	Τεμ.	1	1.093,97	1.093,97		1	1.093,97	1.093,97		1	1.093,97	1.093,97				
10	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαρρέονου τύπου (split), απόδοσης σε ψύξη 22.000 Btu/h (ΑΤΗΕ Ν8551.5.22Α)	322	Τεμ.	1	2.214,54	2.214,54		1	2.214,54	2.214,54		3	2.214,54	6.643,62			4.429,08	
11	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 1/4" (εξωτερ. διαμέτρου 6,35 mm - πάχους τοιχώματος 0,80 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης (ΑΤΗΕ Ν8041.1.1Α)	323	MM	30	4,77	143,10		30	4,77	143,10		30	4,77	143,10				
Σε μεταφορά						5.923,68	296.851,03			6.103,69	290.669,26			10.532,77	278.648,46			4.609,08

EngelLand

Σελίδα 40

Εργασίες

Σελίδα 41

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	
12	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 5/8" (εξωτερ. διαμέτρου 7.94 mm - πάχους τοιχώματος 0.80 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8041.2.1Α)	324	MM	32	5,72	183.04		32	5,72	183.04		32	5,72	183.04			
13	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 3/8" (εξωτερ. διαμέτρου 9.52 mm - πάχους τοιχώματος 0.80 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8041.3.1Α)	325	MM	36	7,35	264.60		36	7,35	264.60		36	7,35	264.60			
14	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 1/2" (εξωτερ. διαμέτρου 12.70 mm - πάχους τοιχώματος 0.80 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8041.4.1Α)	326	MM	38	7,71	292.98		38	7,71	292.98		38	7,71	292.98			
15	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 5/8" (εξωτερ. διαμέτρου 15.87 mm - πάχους τοιχώματος 1.00 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8041.5.1Α)	327	MM	45	10,12	455.40		45	10,12	455.40		45	10,12	455.40			
16	Έλεγχος και ρυθμίσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίου με δίκτυο αεραγωγίων (ΑΤΗ ΝΙ9557.1.14)	328	Τεμ.	1	550.00	550.00		1	550.00	550.00		1	550.00	550.00			
						7.669.71				7.849.71				12.278.79		4.609.08	4.609.08
2.7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ																	
1	Διάνοξη στήης με "καροτέρα" και διαμόρφωση της στήης με αποκατάσταση της διατομής (ΝΑΟΙΚ ΝΑ.22.30.01)	329	Τεμ.	4	150.00	600.00		40	150.00	6.000.00		43	150.00	6.450.00		5.850.00	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλισκόπτη (ΝΑΟΔΟ Δ01)	330	MM	1	1.00	1.00			1.00				1.00	0.00		1.00	
						601.00				6.000.00				6.450.00		5.850.00	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00
																	1.00

ΕργαLand

Σελίδα 41

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

[illegible]

ErgoLand

Σελίδα 43

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί ελάτιον Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					6.577,30	296.851,03					6.380,50	290.669,26			5.850,00	5.977,30
12	Στεγανοποιητικές επαλειφές και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κόνιαμα υγρανόμενης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγιμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλλη	338	M2	80	20,60	1.648,00		80	20,60	1.648,00				20,60	0,00	1.648,00	
13	Χαλύβδινοι σπλήστοι σκυροδέματος, Δαμικά πλέγματα B500C.(ΝΑΟΙΚ 38.20.03)	35	Χ/γρ.	1.500	1,01	1.515,00			1,01					1,01	0,00	1.515,00	
14	Χαλύβδινοι σπλήστοι σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.(ΝΑΟΙΚ 38.20.02)	34	Χ/γρ.	1	1,07	1,07			1,07					1,07	0,00	1,07	1,07
15	Αντισκριακές βαφές, εφαρμογή αντισκριακού ελασχωρώματος μινίου (100%)(ΝΑΟΙΚ 77.20.01)	339	M2	20	2,20	44,00		20	2,20	44,00				2,20	44,00		
16	Ελασχωματισμοί κανοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.55)	131	M2	20	6,70	134,00			6,70					6,70	0,00	134,00	
17	Δίδυμο υδροστάσιο σύνδεσης πυροσβεστικού οχήματος (δίκρουνο) διαμέτρου κορμού DN100 και στόμια σύνδεσης 2x65 mm πλήρες, με ταχυσυνδέσμους Storz, τάτες αλουμινίου και βαλβίδα ανεπιστροφής (ΑΤΗ Ν18206.20.1)	340	Τεμ.	3	329,12	987,36		3	329,12	987,36				6	329,12	1.974,72	987,36
18	Ταχυσυνδέσμοι πυροσβεστικού κρουνού, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in (ΝΑΠΡΣ Η04.14.4)	341	Τεμ.	2	8,00	16,00		6	8,00	48,00				6	8,00	48,00	32,00
	Σε μεταφορά					10.922,73	296.851,03			9.107,86	290.669,26				8.516,72	278.648,46	6.869,36
																	9.275,37

Σελίδα 43

Εργολαβία

Σελίδα 44

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική
	Από μεταφορά					10.922,73	296.851,03					9.107,86	290.669,26			8.516,72	278.648,46	6.869,36	9.275,37
19	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορεχάκινη με γλινίδα (κλαπέ) ή ελατήριο και δίσκο συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 4 ins.(ΑΤΗ Ν18125.1.9)	342	Τεμ.	3	183,65	550,95			3	183,65	550,95	6	183,65	1.101,90		550,95			
20	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) βιδωτός, πλήρως ορεχάκινης, διαμέτρου 1 1/2 ins, με ανοξιδώδη έδρα.(ΑΤΗ Ν18103.4)	343	Τεμ.	10	175,78	1.757,80			10	175,78	1.757,80	15	175,78	2.636,70		878,90			
21	Φλοτεροδιακόπτης υδαταποθήκης ορεχάκινης, διαμέτρου 2" (ΑΤΗ Ν18103.5Α)	344	Τεμ.	1	166,64	166,64			3	166,64	499,92	6	166,64	999,84		833,20			
22	Μανόμετρο γλυκερίνης, με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm.(ΑΤΗ Ν18641)	345	Τεμ.	6	34,11	204,66			6	34,11	204,66	7	34,11	238,77		34,11			
23	Εξοπλισμός υδάτινης δεξαμενής πυρόσβεσης από σκυρόδεμα.(ΑΤΗ Ν18456.5)	346	Τεμ.	1	856,52	856,52			1	856,52	856,52		856,52	0,00		856,52			
24	Κατασκευή σε υφιστάμενο δάπεδο σκυροδέματος, φρεσίου συγκέντρωσης απόβερων ή στραγγισμάτων δαπέδου, εσωτ. διαστάσεων 60x60 cm και βάθους έως 70 cm, με τοιχώματα - πυθμένα από σκυρόδεμα πάχους 10 cm, με σχάρα ή κάλυμμα.(ΑΤΗ Ν19307.4Α)	347	Τεμ.	3	320,26	960,78			3	320,26	960,78	1	320,26	320,26		640,52			
25	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα απόβερων/στραγγισμάτων, ονομαστικής παροχής 5 έως 6 m3/h.(ΑΤΗ Ν18217.4.ΣΧΕΤ)	348	Τεμ.	3	363,49	1.090,47			3	363,49	1.090,47	1	363,49	363,49		726,98			
Σε μεταφορά						16.510,55	296.851,03				15.028,96	290.669,26			14.177,68	278.648,46	9.166,52	11.499,39	

ΕργαLand

Εργολαβή

Σελίδα 45

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						16.510,55	296.851,03			15.028,96	290.669,26			14.177,68	278.648,46	11.499,39	
26	Διαμόρφωση σύνδεσης αγωγού νερού από πολυαιθυλένιο (PE) για σύνδεση με υφιστάμενο (ή μη) μεταλλικό σωλήνα με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου, για διάμετρο αγωγού PE Φ 6375 (NAYΔΡ ΝΑ.16.19.02)	349	Τεμ	1	180,00	180,00			1	180,00	180,00			0,00		180,00	
27	Διαμόρφωση σύνδεσης αγωγού νερού από πολυαιθυλένιο (PE) για σύνδεση με υφιστάμενο (ή μη) μεταλλικό σωλήνα με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου, για διάμετρο αγωγού PE Φ 90110 (NAYΔΡ ΝΑ.16.19.03)	350	Τεμ	1	285,00	285,00			1	285,00	285,00			0,00		285,00	
28	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 351	351	MM	1	3,80	3,80			1	3,80	3,80			0,00		3,80	
29	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 352	352	MM	1	4,50	4,50			1	4,50	4,50			0,00		4,50	
Σε μεταφορά						16.983,85	296.851,03			15.502,26	290.669,26			14.177,68	278.648,46	11.972,69	

Σελίδα 46

Εργασίες

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 47				
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ		
	Από μεταφορά					18.833,85	296.851,03					17.352,26	290.669,26			14.177,68	278.648,46	9.166,52	13.822,69
35	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 4 ζωνών (ΑΤΗΕ Ν8840.4.2)	358	Τεμ.	1	283,42	283,42			1	283,42	283,42			283,42	0,00				283,42
36	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 6 ζωνών (ΑΤΗΕ Ν8840.4.3)	359	Τεμ.	1	335,92	335,92			1	335,92	335,92			335,92	0,00				335,92
37	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 8 ζωνών (ΑΤΗΕ Ν8840.4.4)	360	Τεμ.	1	550,86	550,86			1	550,86	550,86			550,86	0,00				550,86
38	Μπαταρία μολύβδου Pb κλειστού τύπου (sealed lead acid/maintenance free), επαναφορτιζόμενη, ονομ. τάσης 12 V και χωρητικότητας έως 7-9 Ah (H/M 2ΣΧΕΤ.1)	361	Τεμ.	1	36,00	36,00			1	36,00	36,00			36,00	0,00				36,00
39	Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση σε νέα θέση στοιχείων συστημάτων πυρανίχνευσης - αναγγελίας συναγερμού (ΑΤΗΕ Ν89412 ΣΧΕΤ.Ν 1)	362	Τεμ.	1	12,84	12,84			1	12,84	12,84			12,84	0,00				12,84
40	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού μετά της βάσεως εγκατάστασης (ΑΤΗΕ Ν8894.32.2)	363	Τεμ.	1	63,14	63,14			1	63,14	63,14			63,14	0,00				63,14
41	Ανιχνευτής θερμодιαφορικός μετά της βάσεως εγκατάστασης (H/M 62.1)	364	Τεμ.	1	60,00	60,00			1	60,00	60,00			60,00	0,00				60,00
42	Ανιχνευτής ορατού καπνού και θερμικού ορίου συμβατικός, μετά της βάσεως εγκατάστασης (ΑΤΗΕ Ν8894.32.4)	365	Τεμ.	109	40,00	4.360,00			109	40,00	4.360,00			40,00	0,00				4.360,00
Σε μεταφορά						24.536,03	296.851,03				23.054,44	290.669,26			14.177,68	278.648,46	9.166,52	19.524,87	

Σελίδα 47

Σελίδα 48

Σελίδα 48

ΕργαLand

Σελίδα 49

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ					
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						32.063,10	296.851,03			30.581,51	290.669,26			14.177,68	278.648,46	9.166,52	27.061,94		
51		Φωροστερίνα συναγερμού (οπτική & ηχητική ένδειξη) αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, διευθυνοδοτούμενη (ΝΑΗ/Μ Ν65 80.18.2)	374	Τεμ.	1	78,75	78,75			1	78,75	78,75		78,75	0,00		78,75		
52		Φωροστερίνα συναγερμού (οπτική & ηχητική ένδειξη) αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, διευθυνοδοτούμενη στεγανή (ΝΑΗ/Μ Ν65 80.18.2Α)	375	Τεμ.	1	88,09	88,09			1	88,09	88,09		88,09	0,00		88,09		
53		Αττομοναγής βραχυκυκλώματος (ΑΤΗ Ν8209.1.1)	376	Τεμ.	1	47,76	47,76			1	47,76	47,76		47,76	0,00		47,76		
54		Αυτόματος τηλεφωνητής, συνεργαζόμενος με συστήματα πυρανίχνευσης - συναγερμού (ΑΤΗ Ν8993.1Α)	377	Τεμ.	6	70,00	420,00			6	70,00	420,00		70,00	0,00		420,00		
55		Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εξωτερικού χώρου με LEDs, πλήρες, με εικονοσύμβολα (ΑΤΗ Ν8971.1.1 ΣΧΕ Τ)	378	Τεμ.	205	31,41	6.439,05			205	31,41	6.439,05		31,41	0,00		6.439,05		
56		Φωτιστικό ασφαλείας σηματοδότης οδούσεων διαφυγής διπλής όψης, συνεχούς λειτουργίας, αυτοελεγχόμενο, αυτόνομο, με συσσωρευτή Ni-Cd αυτονομίας λειτουργίας 90 min.(ΑΤΗ Ν8972.5.1Α)	379	Τεμ.	1	87,00	87,00			1	87,00	87,00		87,00	0,00		87,00		
57		Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος με προβολείς αλογάνου ή Led(ΑΤΗ Ν9396.1)	380	Τεμ.	1	107,30	107,30			1	107,30	107,30		107,30	0,00		107,30		
Σε μεταφορά							39.331,05	296.851,03				37.849,46	290.669,26			14.177,68	278.648,46	9.166,52	34.319,89

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 50			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	Απο μεταφορά					39.331,05	296.851,03					37.849,46	290.669,26			14.177,68	278.648,46	9.166,52	34.319,89
58	Υποδομή εγκατάστασης σημείου ανάγνωσης, πρόκλησης συναγερμού ή αναγγελίας πυρκαγιάς με καλώδιο του προβλεπόμενου είδους και τύπου, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8766 2.1Ν)	381	Τεμ.	1	75,00	75,00				1	75,00	75,00				75,00	0,00		75,00
59	Καλώδια πυράντοχο, ελεύθερο καπνού και αλογόνων, αντίστασης σε φωτιά 120 λεπτά, χάλκινων αγωγών διατομής 2x1,0 mm2 (ΑΤΗ ΝΙ8759 1.1 Α)	382	ΜΜ	243	5,75	1.397,25			243	5,75	1.397,25					5,75	0,00		1.397,25
60	Καλώδια πυράντοχο, ελεύθερο καπνού και αλογόνων, αντίστασης σε φωτιά 120 λεπτά, χάλκινων αγωγών διατομής 2x2x1,0 mm2 (ΑΤΗ ΝΙ8759 3.1)	383	ΜΜ	76	8,35	634,60			76	8,35	634,60					8,35	0,00		634,60
61	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg (ΑΤΗ 8201.1.2)	384	Τεμ.	87	37,79	3.287,73			87	37,79	3.287,73					37,79	188,95		3.088,78
62	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg (ΑΤΗ 8201.1.3)	385	Τεμ.	1	58,87	58,87			1	58,87	58,87					58,87	0,00		58,87
63	Αυτοδιεγερμένος πυροσβεστήρας οραφής, ξηρής σκόνης, ονομαστικής γόμωσης 12 Kgr, κατασβεστικής ικανότητας 43Α -183Β-С (ΑΤΗ ΝΙ8201.1.3)	386	Τεμ.	9	86,98	782,82			9	86,98	782,82					86,98	0,00		782,82
64	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg (ΑΤΗ ΝΙ8202.2 ΣΧΕΤ)	387	Τεμ.	32	69,69	2.230,08			32	69,69	2.230,08					69,69	348,45		1.881,63
65	Ανανέωση πυροσβεστήρα κόνεως, σιουδητότε τύπου (ΑΤΗ ΝΙ8201.1 ΣΧΕΤ)	388	Χγρ.	1	3,30	3,30			1	3,30	3,30					3,30	0,00		3,30
Σε μεταφορά						47.800,70	296.851,03			46.319,11	290.669,26					14.715,08	278.648,46	9.166,52	42.262,14

Σελίδα 50

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 51		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από μεταφορά								47.800,70	296.851,03			46.319,11	290.669,26	14.715,08	278.648,46	9.166,52	42.252,14	
66	Πυροσβεστικό εργάριο με κοινό ελαστικό σωλήνα νερού Φ 19 mm/20 m, με αυλίσκο(ΑΤΗ ΝΙ8204.1.N2)																	
67	Μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.(ΑΤΗ ΝΙ8204.1.B)	389	Τεμ.	30	63,67	1.910,10			30	63,67	1.910,10		6	63,67	382,02		1.528,08	
68	Κιβώτιο Πυροσβεστικού Στάθμου Εργαλείων (όπου εργαλείων) δύο χώρων, για τοποθέτηση μεγάλων εργαλείων και αναπνευστικής συσκευής διαφυγής δύο χώρων, θέσης στρίφιξης εργαλείων (ΑΤΗ ΝΙ8204.1.A)	390	Τεμ.	6	173,52	1.041,12			6	173,52	1.041,12		6	173,52	1.041,12			
69	Κεφαλή κατασνομής Sprinkler ορειχάλκινη, με ειδική αμπαύλα, για την ανάχωση -αυτοματη κατάσβεση πυρκαϊάς σε υγρά συστήματα, πλήρης, συμβατικού τύπου, ονομαστικού μεγέθους DN 15 mm (1/2 ins).(ΑΤΗ ΝΙ8139.1.2.ΣΧ1)	391	Τεμ.	6	159,18	955,08			6	159,18	955,08			159,18	0,00		955,08	
70	Εργάριο με εφεδρικές κεφαλές κατασνομής Sprinkler, 12 θέσεων και εργαλείο αντικατάστασής των.(ΑΤΗ ΝΙ8209.14.5A)	392	Τεμ.	291	17,61	5.124,51			291	17,61	5.124,51		306	17,61	5.388,66		264,15	
71	Κιτ ευκαμπτής σύνδεσης sprinkler χωρίς πλέγμα, πλήρες, με εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα μήκους 35 έως 100 cm από ανοξείδωτο χάλυβα, ονομ. διαμέτρου 1", κοχλιωτής συνδέσεως, και εξαρτήματα στρίφιξης για εγκατάσταση σε ψευδοροφή.(ΑΤΗ ΝΙ8610.1.2A)	393	Τεμ.	6	194,17	1.165,02			6	194,17	1.165,02		6	194,17	1.165,02			
			Τεμ.	1	85,35	85,35			1	85,35	85,35			85,35	0,00		85,35	
Σε μεταφορά						58.081,98	296.851,03				56.600,29	290.669,26			22.691,90	278.648,46	9.430,67	44.820,65

ΕργαLand

Σελίδα 51

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 52
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						58.081,88	296.851,03			56.600,29	290.669,26			22.691,90	278.648,46	9.430,67	44.820,65
72	Διάτση δοκιμής αυτόματου συστήματος καταιονισμού, πλήρης , με μανόμετρο και όργανα διακοπής (ΑΤΗ Ν18211.3.3)	395	Τεμ.	3	140,00	420,00		3	140,00	420,00		5	140,00	700,00		280,00	
73	Φίλτρο νερού κοχλιωτό από ορείχαλκο, "πλάγιο", διαμέτρου DN 32 (ΑΤΗ Ν18608.1.5 ΣΧΕ Τ)	396	Τεμ.	1	32,52	32,52		2	32,52	65,04		2	32,52	65,04		32,52	
74	Φίλτρο νερού κοχλιωτό από ορείχαλκο, "πλάγιο", διαμέτρου DN 40 (ΑΤΗ Ν18608.1.6 ΣΧΕ Τ)	397	Τεμ.	1	39,82	39,82		1	39,82	39,82		1	39,82	39,82			
75	Φίλτρο νερού κοχλιωτό από ορείχαλκο, "πλάγιο", διαμέτρου DN 50 (ΑΤΗ Ν18608.1.7 ΣΧΕ Τ)	398	Τεμ.	1	66,44	66,44		1	66,44	66,44		1	66,44	66,44			
76	Φίλτρο τύπου Υ (strainer), φλαντζωτό, από χυτοσίδηρο και γαλβανισμένο διάτρητο έλασμα Ονομ. πίεσεως 16 atm Διαμέτρου 80 έως 100 mm (ΑΤΗ Ν19177.3.1)	399	Τεμ.	3	135,00	405,00		4	135,00	540,00		6	135,00	810,00		405,00	
77	Αντικαταστάσιμος σύνδεσμος για πυροσβεστικό συγκρότημα, PN 16, ονομ. διαμέτρου 100 mm με φυσούνα από συνθετικό λάστιχο EPDM, ενισχυμένο με πλέγμα νάυλον και με χαλύβδινες φλάντζες σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 16 atm (ΑΤΗ Ν18610.2.11)	400	Τεμ.	3	185,00	555,00		3	185,00	555,00		6	185,00	1.110,00		555,00	
78	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins (ΑΤΗ 8036.1)	401	ΜΜ	1	14,59	14,59		1	14,59	14,59			14,59	0,00			14,59
79	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins (ΑΤΗ 8036.2)	402	ΜΜ	1	17,52	17,52		94,1	17,52	1.648,63		94,1	17,52	1.648,63		1.631,11	
Σε μεταφορά						59.632,77	296.851,03			59.949,81	290.669,26			27.131,83	278.648,46	12.334,30	44.835,24

ΕργαLand

Εργα.Λογ.

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 53
Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						59.632,77	296.851,03			59.949,81	290.669,26			27.131,83	278.648,46	12.334,30	44.835,24
80	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins.(ATHE 8036.3)	403	MM	544	21,26	11.565,44											
81	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins.(ATHE 8036.4)	404	MM	201	25,04	5.033,04											
82	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins.(ATHE 8036.5)	405	MM	240	28,44	6.825,60											
83	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins.(ATHE 8036.6)	406	MM	40	33,58	1.343,20											
84	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins.(ATHE 8036.7)	407	MM	50	40,90	2.045,00											
85	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins.(ATHE 8036.8)	408	MM	19	55,27	1.050,13											
86	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins.(ATHE 8036.9)	409	MM	65	73,88	4.802,20											
87	Χαλύβδινος σωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm.(ATHE 8038.14)	410	MM	1	58,32	58,32											58,32
88	Χαλύβδινος Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm.(ATHE 8041.6.1)	297	MM	168	8,68	1.458,24											1.458,24
89	Σύνδεσμος σταθερός για σύνδεση σωκακιών σωλήνων δικτύου πυρόσβεσης, πλήρης, διαμέτρου Φ 2 1/2 ins, ενδ. τύπου VICTAULIC.(ATHE N18037.7)	411	Τεμ.	10	22,05	220,50											
Σε μεταφορά						94.034,44	296.851,03			101.172,47	290.669,26			80.053,63	278.648,46	32.370,99	46.351,80

ΕργαLand

Σελίδα 53

Εργασίες

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 54		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						94.034,44	296.851,03			101.172,47	290.669,26			80.053,63	278.648,46	32.370,99	46.351,80
90	Συνδεσμός σταθερός για σύνδεση σωκακιών σωλήνων δικτύου πυρόσβεσης, πλήρης, διαμέτρου Φ 3 ins, ενδ. τύπου VICTAULIC (ATHE N18037 8)	412	Τεμ.	10	26,48	264,80			10	26,48	264,80	26	26,48	688,48			
91	Συνδεσμός σταθερός για σύνδεση σωκακιών σωλήνων δικτύου πυρόσβεσης, πλήρης, διαμέτρου Φ 4 ins, ενδ. τύπου VICTAULIC (ATHE N18037 9)	413	Τεμ.	10	31,35	313,50			94	31,35	2.946,90	125	31,35	3.918,75			3.605,25
92	Διαμόρφωση με μηχανουργική επεξεργασία κατώληρης περιφερειακής αλκώωσης σε χαλυβδόσωληνες, για σύνδεσή τους μέσω ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων ενδεκτικού τύπου Victaulic (NAYΔP NA11.05.03)	414	Τεμ.	10	30,00	300,00			251	30,00	7.530,00	397	30,00	11.910,00			11.610,00
93	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1" (ΝΑΟΙΚ 77.67.01)	415	ΜΜ	714	1,35	963,90			714	1,35	963,90		1,35	0,00			963,90
94	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" (ΝΑΟΙΚ 77.67.02)	416	ΜΜ	481	2,25	1.082,25			481	2,25	1.082,25		2,25	0,00			1.082,25
95	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3" (ΝΑΟΙΚ 77.67.03)	417	ΜΜ	69	3,40	234,60			69	3,40	234,60	20	3,40	68,00			166,60
96	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου άνω των 3" έως 4" (ΝΑΟΙΚ Α177.67.04Ν)	418	ΜΜ	66	4,50	297,00			66	4,50	297,00		4,50	0,00			297,00
97	Βαλβίδα διακοπής (διακοπτής) ορεγιάκινη επιχρωμιωμένη Γυναική διαμέτρου Φ 1/2 ins (ΑΤΗ 8131.2.1)	156	Τεμ.	30	18,14	544,20			30	18,14	544,20		18,14	0,00			544,20
Σε μεταφορά						98.034,69	296.851,03			115.036,12	290.669,26			96.638,96	278.648,46	48.009,92	49.405,75

Εργολαβία

Σελίδα 55

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						98.034,59	296.851,03			115.036,12	290.669,26			96.638,86	278.648,46	49.405,75	
98	Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποιούμενος με την ροή υγρών (Flow Switch) με σπείρωμα 1", με χρονοκαθυστέρηση, πλήρης για σωλήνες από 1 έως 8 inches.(ATHE N18208.14.7)	419	Τεμ.	3	143,30	429,90			4	143,30	573,20		8	143,30	1.146,40	716,50	
99	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιατός ονομ. διαμέτρου 1 ins.(ATHE 8637.3)	420	Τεμ.	1	173,58	173,58			1	173,58	173,58			0,00		173,58	
100	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιατός ονομ. διαμέτρου 1 1/4 ins.(ATHE 8637.4)	421	Τεμ.	1	232,15	232,15			1	232,15	232,15			0,00		232,15	
101	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιατός ονομ. διαμέτρου 1 1/2 ins.(ATHE 8637.5)	422	Τεμ.	1	376,71	376,71			1	376,71	376,71			0,00		376,71	
102	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιατός ονομ. διαμέτρου 2 ins.(ATHE 8637.6)	423	Τεμ.	1	429,70	429,70			1	429,70	429,70		2	429,70	859,40	429,70	
103	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in.(ATHE N.8104.1)	424	Τεμ.	1	13,57	13,57			1	13,57	13,57			0,00		13,57	
104	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 3/4 in.(ATHE N.8104.2)	425	Τεμ.	1	14,58	14,58			1	14,58	14,58			0,00		14,58	
105	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 in.(ATHE N.8104.3)	426	Τεμ.	12	24,25	291,00			12	24,25	291,00		12	24,25	291,00		
106	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 1/4 in.(ATHE N.8104.4)	427	Τεμ.	15	31,35	470,25			15	31,35	470,25		15	31,35	470,25		
107	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 1/2 in.(ATHE N.8104.5)	428	Τεμ.	15	38,45	576,75			15	38,45	576,75		19	38,45	730,55	153,80	
108	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 2 1/2 in.(ATHE N.8104.8)	429	Τεμ.	15	90,51	1.357,65			15	90,51	1.357,65		39	90,51	3.529,89	2.172,24	
Σε μεταφορά						102.400,53	296.851,03			119.545,26	290.669,26			103.666,35	278.648,46	50.216,34	

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 56		
Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ				
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ			
Από μεταφορά																	51.482,16	50.216,34	
109	Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας (σούστα) σε κλειστή θέση, βαρέος τύπου (ΑΤΗ ΝΙ94/23)																		
110	Πινακίδα ενδείξεων από λευκό πλαστικό με χρωματιστά γράμματα, για τη σήμανση χώρων ή μηχανημάτων και εξοπλισμάτων (ΑΤΗ ΝΙ8699.11.1)	430	Τεμ.	1	135,84	135,84		1	135,84	135,84				135,84	0,00	135,84			
111	Πινακίδες σήμανσης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (ΑΤΗ ΝΙ9288.01)															386,55			
112	Μόνιμο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης (κατάσβεσης) πυρκαγιάς, ολικής κατάλυσης με αερόλυμα (aerosol), μίας (1) "γεννήτριας", ποσότητας κατασβεστικού υλικού 3.0003.500 gr, πλήρες (ΑΤΗ ΝΙ8205.3.1Β)	433	Τεμ.	3	6.268,34	18.805,02		3	6.268,34	18.805,02				3	6.268,34	18.805,02			
113	Μόνιμο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης (κατάσβεσης) πυρκαγιάς, ολικής κατάλυσης με αερόλυμα (aerosol), δύο (2) "γεννητριών", ποσότητας κατασβεστικού υλικού καθεμίας 3.0003.500 gr, πλήρες (ΑΤΗ ΝΙ8205.3.1Γ)	434	Τεμ.	5	9.980,05	49.900,25		5	9.980,05	49.900,25				5	9.980,05	49.900,25			
114	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ ΝΙ8797.10.Ν1)	435	Τεμ.	1	5.520,00	5.520,00		1	5.520,00	5.520,00				1	5.520,00	5.520,00			
Σε μεταφορά																	178.751,12	278.648,46	53.002,71
																	51.482,16		

ΕργαLand

Σελίδα 56

Σελίδα 57

Σελίδα 57

Σελίδα 58

Σελίδα 59

Α/Α	Ενδείξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μέριση	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μέριση	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μέριση	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον Απιο Προϋπολογισμό	Επί έκλειον Απιο Προϋπολογισμό	
	Από μεταφορά					236.872,67	296.851,03				254.017,40	290.669,26			235.352,12	278.648,46	51.482,18	53.002,71
125	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 25ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗΕ ΝΙ8797.10.Ν12)	446	Τεμ.	1	22.500,00	22.500,00		1	22.500,00				1	22.500,00	22.500,00			
126	Αυτόματο πισετικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πτερελαοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12845, πλήρες (ΑΤΗΕ ΝΙ8223.3.17)	447	Τεμ.	1	22.600,00	22.600,00		1	22.600,00				1	22.600,00	22.600,00			
127	Αυτόματο πισετικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 4ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πτερελαοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12845, πλήρες (ΑΤΗΕ ΝΙ8223.3.18)	448	Τεμ.	1	25.400,00	25.400,00		1	25.400,00				1	25.400,00	25.400,00			
128	Αυτόματο πισετικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πτερελαοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12845, πλήρες (ΑΤΗΕ ΝΙ8223.3.19)	449	Τεμ.	1	18.100,00	18.100,00		1	18.100,00				1	18.100,00	18.100,00			
Σε μεταφορά						325.472,67	296.851,03				342.617,40	290.669,26			323.952,12	278.648,46	51.482,18	53.002,71

Εργολαβή

5ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας																	Σελίδα 60		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλατιον Απο Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	Από μεταφορά					325.472,67	296.861,03					342.617,40	290.669,26			323.952,12	278.648,46	51.482,16	53.002,71
129	Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 14ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, πλήρες (ΑΤΗ Ν8223 3.20)	450	Τεμ.	1	6.500,00	6.500,00			1	6.500,00	6.500,00		1	6.500,00	6.500,00				
130	Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 22ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, πλήρες (ΑΤΗ Ν8223 3.21)	451	Τεμ.	1	7.100,00	7.100,00			1	7.100,00	7.100,00		1	7.100,00	7.100,00				
131	Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 25ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, πλήρες (ΑΤΗ Ν8223 3.22)	452	Τεμ.	1	7.800,00	7.800,00			1	7.800,00	7.800,00		1	7.800,00	7.800,00				
132	Δεξήμενη νερού πυρόσβεσης, διαστάσεων 1,25x2,50x1,25 m, από λαμαρίνα μαύρη θερμής έλασης, πάχους ελάσματος 3 mm.(ΑΤΗ ΝΗ/ΛΜ 29 ΣΧΕ Τ1)	453	Τεμ.	9	2.120,60	19.085,40			9	2.120,60	19.085,40		9	2.120,60	19.085,40				
133	Δεξήμενη νερού πυρόσβεσης, διαστάσεων 2,00x2,50x2,00 m, από λαμαρίνα μαύρη θερμής έλασης, πάχους ελάσματος 3 mm.(ΑΤΗ ΝΗ/ΛΜ 29 ΣΧΕ Τ2)	454	Τεμ.	2	3.861,65	7.723,30			2	3.861,65	7.723,30		2	3.861,65	7.723,30				
Σε μεταφορά						373.681,37	296.861,03				390.826,10	290.669,26			372.160,82	278.648,46	51.482,16	53.002,71	

ΕργαLand

ΕργαLand

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 61	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί λοιπών Απο Προϋπολογισμό	
	Από μεταφορά					373 681,37	296 851,03					390 826,10	290 669,26	372 160,82	278 648,46	51 482,16	53 002,71	
134	Δεξμενή νερού πυράβεσης, διαστάσεων 2,50x3,00x2,00 m, από λαμαρίνα μούρη θερμής έλασης, πάχους ελάσματος 4 mm.(ΑΤΗΕ ΝΗ/ΑΜ 29 ΣΧΕ Τ3)	455	Τεμ.	2	6.419,79	12 839,58		6	6.419,79	38 518,74						25 679,16		
135	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντιστοίχια προετοιμασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία.(ΝΑΥΔΡ 11.05.02)	456	Χ/μ	120	2,10	252,00		120	2,10	252,00				2,10	0,00		252,00	
136	Δεξμενή νερού, από λαμαρίνα μούρη [ΑΤΗΕ 8456.4]	NT12	Χ/μ					1.766	6,55	11.567,30		3.785,8	6,55	24.796,99		24.796,99		
	(2.7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Σύνολο:					386 772,95				441 164,14				435 476,55		101 968,31	53 254,71	
	Αφαρ έκπτωση		18 %			414 993,99				529 345,20				553 570,28		196 850,55	58 273,96	
						-74 698,86				-95 282,14				-99 642,65		-35 433,10	-10 489,31	
						340 294,93				434 063,06				453 927,63		161 417,45	47 784,65	
	12- ΥΔΡΑΓΛΙΚΑ - ΔΙΚΤΥΑ ΗΜΗ Σύνολο:					340 294,93	340 294,93			434 063,06	434 063,06			453 927,63	453 927,63	161 417,45	47 784,65	
	Σύνολο Εργασιών						637 145,86			724 732,32				732 576,09		95 430,23		
	Ενιαίο όφελος		18 %				637 145,86			724 732,32				732 576,09		215 825,21	120 394,98	
							114 686,25			130 451,82				131 863,70		38 848,54	21 671,10	
							751 832,11			855 184,14				864 439,79		254 673,75	142 066,08	
	Ενιαία απρόβλεπτα						751 832,11			855 184,14				864 439,79		254 673,75	142 066,08	
							112 774,82			9 422,79				167,14		112 607,68		
							864 606,93			864 606,93				864 606,93		254 673,76		
	Συμβατική μεταβολή													0,00				
	Καμία μεταβολή																	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						864 606,93				864 606,93					254 673,76	254 673,76	
																-0,00		
	Σε μεταφορά						864 606,93				864 606,93				864 606,93			

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 62			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 4ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 5ου ΑΠΕ			Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
Από μεταφορά																		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																		
1	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						12.100,00				12.100,00			12.100,00				
	Μερικό Σύνολο						12.100,00				12.100,00			12.100,00				
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών			18 %			2.178,00				2.178,00			2.178,00				
							14.278,00				14.278,00			14.278,00				
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕ&ΟΕ						14.278,00				14.278,00			14.278,00				
				18,47 %			-402,28				-402,28			-402,28				
							13.875,72				13.875,72			13.875,72				
	[ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ] Σύνολο:						13.875,72				13.875,72			13.875,72		0,00		
							13.875,72				13.875,72			13.875,72				
	Δαπάνη ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ						878.482,65				878.482,65			878.482,65		254.673,76		
							24.459,00				24.459,00			24.459,00				
							902.941,65				902.941,65			902.941,65				
	Ενσώβος Φ.Π.Α.						902.941,65				902.941,65			902.941,65		254.673,76		
				24 %			216.706,00				216.706,00			216.706,00		61.121,70		
							1.119.647,65				1.119.647,65			1.119.647,65		315.795,46		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						1.119.647,65				1.119.647,65			1.119.647,65		315.795,46		
							1.119.647,65				1.119.647,65			1.119.647,65		-0,00		
	Συνολικά ποσά έργου						1.119.647,65				1.119.647,65			1.119.647,65		315.795,46		
															0,00		-0,01	
Τελική μεταβολή >																		
Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ : ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ και ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(1.119.647,65)																		
ErgoLand																		
ΛΑΡΙΣΑ.../10/25				ΛΑΡΙΣΑ.../10/25				ΛΑΡΙΣΑ.../10/25				ΛΑΡΙΣΑ.../10/25						
ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΟΣ				ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ				Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΣΥΝΤ.				Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤ.ΔΤΥ						
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ								ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ										
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΟΣ				ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ				ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				ΠΑΤΕΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ						
				ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ				ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ				ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ				ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ		
												Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΗΜ						
												ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ						

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 4ου ΑΠΕ	ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Α 5ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	751.832,11	855.184,14	864.439,79	112.607,68
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άλλες Δαπάνες)	112.774,82 0,00	9.422,79	167,14	-112.607,68
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	864.606,93	864.606,93	864.606,93	0,00
Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή : 864.606,93-864.606,93 / 864.606,93=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	24.459,00	24.459,00	24.459,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	902.941,65	902.941,65	902.941,65	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	216.706,00	216.706,00	216.706,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.119.647,65	1.119.647,65	1.119.647,65	0,00

Ε
ρ
γ
ο
λ
ο
γ
ο
γ
ρ
α
φ
ι
κ
ή

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

