



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του Δημοτικού Έργου «Συντήρηση Πεζοδρόμων».

Στη Λάρισα, σήμερα 26^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 87696/20-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Καλτσάς Νικόλαος, 13) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κυριτσάκης Ν. Βάιος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαμπαλής Δημήτριος, 21) Μπαράς Νικόλαος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζανακούλης Κων/νος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 38) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γελαλή Πολυξένη, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καφφές Θεόδωρος, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Πράπας Κωνσταντίνος, 9) Σουλούκου Ασπασία και 10) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Βαγενά Αγγελική, Τζανακούλης Κων/νος, Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, Μαμάκος Αθανάσιος, Μπαράς Νικόλαος, Τσακίρης Μιχαήλ, Παπαδημητρίου Βασίλειος και Κυριτσάκας Βάιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του Δημοτικού Έργου «Συντήρηση Πεζοδρόμων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/08
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Ν. 4278/14
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Τη με αριθ. 156/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πεζοδρόμων».
6. Τη με αριθ. 117/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΩΦ2ΔΩΛΞ-Γ3Τ).
7. Τη με αριθμ. 157/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση πεζοδρόμων».
8. Τη με αριθμ. 294/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση πεζοδρόμων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 86832/18-11-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	200.000,00 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	176.000,00 €
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7333.46008
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ

10. Την Εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ" συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών . Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων δαπανών του έργου. Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών που ζητείται να εγκριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 176.000,00 € (143.089,44 + 32.910,57 με ΦΠΑ) και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Λάρισα 17/11/2015

Ο Επιβλέπων
Κων/νος Νέμας

Η Προϊσταμένη Τμ. Συντήρησης Έργων
Ειρήνη Σταθακοπούλου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελία Γιοβρή

11. Την Αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

Το έργο δημοπρατήθηκε με αρχικό προϋπολογισμό 200.000,00 € (162.601,63 € + ΦΠΑ 23% 37.398,37 €) και με την υπ'αριθμ. 294/25-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε στον Ηλιάδη Ευάγγελο του Πέτρου με συμβατικό ποσό 176.000,00 € (143.089,43 €+ΦΠΑ 32.910,57 €), ήτοι έκπτωση 12,00 % επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/09/2015.

Γενικά στοιχεία του έργου:

1.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	200.000,00€
2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:	176.000,00 €
3. ΕΚΠΤΩΣΗ:	12,00%
4.ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
5.ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	11/09/2015
6.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣ:	11/12/2015

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση, λειτουργικότητα και αρτιότητα του έργου και οι οποίες προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις σε προχωρημένο πλέον στάδιο του έργου.

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες της μελέτης αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά:
Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	8
2	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου	15
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30μ3 για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	31

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 176.000,00€ και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε , δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	104.732,10	114.067,14	9.335,04
ΓΕ & ΟΕ	18.851,78 €	20.532,09 €	1.680,31
ΣΥΝΟΛΟ	123.583,88	134.599,23	11.015,35
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	18.537,58	7.522,23	11.015,35
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	142.121,46	142.121,46	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	967,97	967,97	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	143.089,43	143.089,43	0,00
ΦΠΑ 23%	32.910,57	32.910,57	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	176.000,00	176.000,00	0,00

ΛΑΡΙΣΑ 17/11/2015

Ο Επιβλέπων
ΝΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

12. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του Δημοτικού Έργου «Συντήρηση Πεζοδρόμων», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΗΛΙΑΔΗΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον.Μετρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ.ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ(1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑ-ΤΗΡΗΣΕΙΣ
				ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΕΣ				
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	Επί πλέον	Επί έλατον	
	Αρχική σύμβαση													
	Εργασίες προϋπολογισμού													
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ													
1.	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	μ2	1	2.000,00	11,20		22.400,00	2.000,00	11,20		22.400,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 2236
2.	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	μ3	2	30,00	31,30		939,00	30,00	31,30		939,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 2226
3.	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	μ2	3	240,00	11,20		2.688,00	240,00	11,20		2.688,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 2237
4.	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	μ3	5	5,00	23,55		117,75	5,00	23,55		117,75	0,00	0,00	ΟΙΚ 2122
5.	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους(Π.Τ.Π.Ο-150)	μ3	6	20,00	19,30		386,00	20,00	19,30		386,00	0,00	0,00	ΟΔΟΝ 3121Β

6.	Βάση πάχους 0,10μ(Π.Τ.Π. Ο-150)	μ2	7	200,00	4,50		900,00	200,00	4,50		900,00	0,00	0,00	ΟΔΟΝ 3211B
7.	Προμήθεια,μεταφορά επι τόπου,διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	μ3	8	30,00	84,00		2.520,00	90,00	84,00		7.560,00	5.040,00	0,00	ΟΙΚ 3214
8.	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	9	1.400,00	1,01		1.414,00	1.400,00	1,01		1.414,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 3873
9.	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινι οπλισμοί κατηγορίας B500C	kg	10	1.100,00	1,07		1.177,00	1.100,00	1,07		1.177,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 3873
10.	Ξυλότυποι χυτών μικοκατασκευών	μ2	11	45,00	22,50		1.012,50	45,00	22,50		1.012,50	0,00	0,00	ΟΙΚ 3811
11.	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	μ2	12	60,00	20,25		1.215,00	60,00	20,25		1.215,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 3841
12.	Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	μμ	13	130,00	2,80		364,00	130,00	2,80		364,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 3816
13.	Αποκατάσταση σωλήνων υδροσυλλογής οικοδομών	μμ	14	20,00	10,00		200,00	20,00	10,00		200,00	0,00	0,00	ΥΔΡ-6620.3
14.	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου	μ2	15	160,00	19,00		3.040,00	400,00	19,00		7.600,00	4.560,00	0,00	ΟΙΚ 7316
15.	Ταινίες(φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο,σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,πάχους 3cm	μμ	16	120,00	14,60		1.752,00	120,00	14,60		1.752,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 7494
16.	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου , σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού , πάχους 3cm ,σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανα τετραγωνικό μέτρο	μ2	17	140,00	103,00		4.120,00	40,00	103,00		4.120,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 7462
17.	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου προελεύσεως Κοζάνης ή ισοδυνάμου	μ2	18	140,00	110,00		15.400,00	140,00	110,00		15.400,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 7461
18.	Επανατοποθέτηση κυβολίθων	μ2	19	650,00	20,00		13.000,00	650,00	20,00		13.000,00	0,00	0,00	ΠΡΕΝ 1360

19.	Επιστρώσεις διαπέδων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα	μ2	34	1.300,00	30,00		39.000,00	1.300,00	30,00		39.000,00	0,00	0,00	OIK 7317
20.	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ,ονομαστικής πίεσης 6 at ονομαστικής διαμέτρου D110mm	μμ	21	50,00	4,90		245,00	50,00	4,90		245,00	0,00	0,00	ΥΔΡ 6620.1
21.	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα με τη βάση τους	μ	22	60,00	9,00		540,00	60,00	9,00		540,00	0,00	0,00	ΟΔΟΝ 2921
22.	Επίστρωση με εμφανείς συμπαγείς πλίνθους	μ2	23	30,00	50,00		1.500,00	30,00	50,00		1.500,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 4622.1
23.	Ξυλεία ίροκο ή ισοδύναμη για καθιστικά	μ2	24	0,50	600,00		300,00	0,50	600,00		300,00	0,00	0,00	OIK 5213
24.	Παγκάκι ξύλινο	μ	25	8,00	120,00		960,00	8,00	120,00		960,00	0,00	0,00	OIK 5214
25.	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	μ	26	30,00	9,60		288,00	30,00	9,60		288,00	0,00	0,00	ΟΔΟΝ 2921
26.	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	μ2	27	80,00	3,90		312,00	80,00	3,90		312,00	0,00	0,00	OIK 7725
27.	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	μ3	28	30,00	7,80		234,00	30,00	7,80		234,00	0,00	0,00	OIK 2124
28.	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω συσχεριών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα	μ3	29	10,00	2,70		27,00	10,00	2,70		27,00	0,00	0,00	ΥΔΡ 6087
29.	Πλήρωση νησίδων με φυτική γή	μ3	30	55,00	2,30		126,50	55,00	2,30		126,50	0,00	0,00	ΟΔΟΝ 1620
30.	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30μ3 για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	μ3	31	25,00	16,80		420,00	85,00	16,80		1.428,00	1.008,00	0,00	OIK 3223A.5
31.	Ταινίες(φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο,σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,πάχους 2cm	μμ	32	40,00	12,40		496,00	40,00	12,40		496,00	0,00	0,00	OIK 7492
32.	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	kg	33	150,00	5,60		840,00	150,00	5,60		840,00	0,00	0,00	OIK 7903

33.	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοίλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160mm	kg	35	400,00	2,70		1.080,00	400,00	2,70		1.080,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 6104
	Άθροισμα						119.013,75				129.621,75	10.608,00	0,00	
	Αφαιρείται έκπτωση				12,00%		14.281,65		12,00%		15.554,61	1.272,96	0,00	
	Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						104.732,10				114.067,14	9.335,04	0,00	
	Προστίθεται ΓΕ& ΟΕ				18,00%		18.851,78		18,00%		20.532,09	1.680,31	0,00	
	Σύνολο:Εργασίες Προϋπολογισμού						123.583,88				134.599,23	11.015,35	0,00	
	Αρχική σύμβαση						123.583,88				134.599,23	11.015,35	0,00	
	Απρόβλεπτη δαπάνη						18.537,58				7.522,23			
	Αναθεώρηση						967,97				967,97			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						143.089,43				143.089,43			

Σύνολα Υπερβάσεων			
Περιγραφή	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενη δαπάνη 1ος ΑΠΕ	Διαφορές : (Προτεινόμενη δαπάνη 1ος ΑΠΕ)-(Εγκεκριμένη δαπάνη)
Σύνολο	123.583,88	134.599,23	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά = 11.015,35
Απρόβλεπτη δαπάνη	18.537,58	7.522,23	
Άθροισμα	142.121,46	142.121,46	χωρίς μεταβολή
Αναθεώρηση	967,97	967,97	
Άθροισμα	143.089,43	143.089,43	
ΦΠΑ	32.910,57	32.910,57	
Γενικό Σύνολο	176.000,00	176.000,00	χωρίς μεταβολή
ΛΑΡΙΣΑ 17/11/2015 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 17/11/2015 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΝΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 17/11/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 17/11/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ			

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Δημοτικού Έργου «Συντήρηση Πεζοδρόμων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

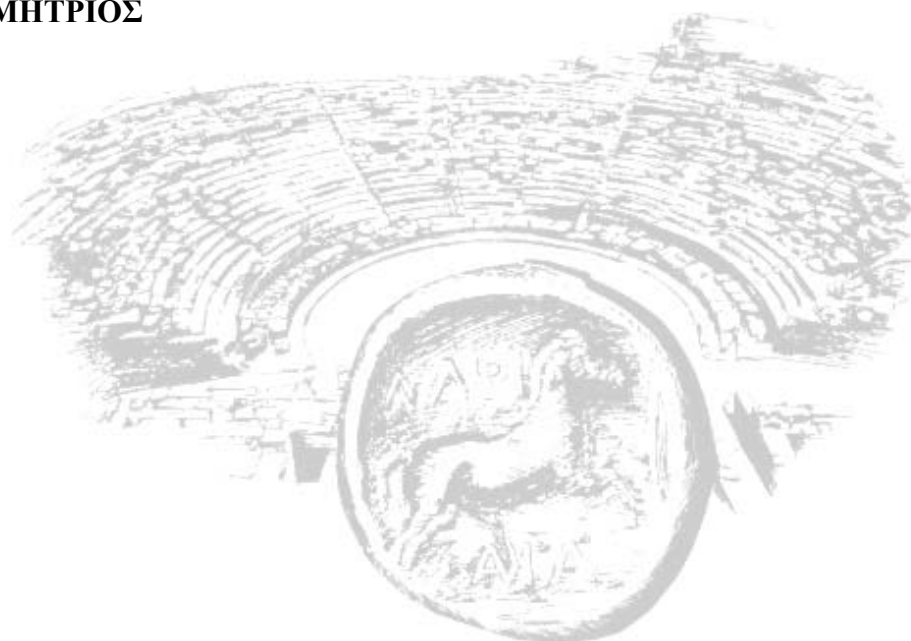

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA
