



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή δικτύων στις εργατικές κατοικίες Νεάπολης».

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14873/22-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Γεωργιάκης Δημήτριος .

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Ανακατασκευή δικτύων στις εργατικές κατοικίες Νεάπολης**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1484/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 2229/84
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Την ΑΔΣ 75/10 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
8. Την ΑΔΕ 73/10 με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού του έργου.
9. Την ΑΔΕ 189/10 με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου.
10. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται :

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**». επί έλαττον δαπάνης **ευρώ 0,26 (0,21+ Φ.Π.Α. 23% 0,05)** σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 230 m σε 285 m.εκσκαφή χάνδακα
2. Αύξηση από 450 m² σε 520 m² αποκατάσταση πεζοδρομείων
3. Αύξηση από 46 τεμ. σε 48 τεμ. εκσκαφή βάσης ιστού
4. Αύξηση από 46 τεμ. σε 48 τεμ. βάση σιδηροιστού.
5. Αύξηση από 100μ. Σε 105 μ πλαστικός σωλήνας τύπου νεροσώλ
6. Αύξηση από 950μ. Σε 1150 μ σιδηροσωλήνα
7. Αύξηση από 12 τεμ. σε 16 τεμ. σιδηροιστός τηλεσκοπικός 8μ.
8. Αύξηση από 900 μ. σε 1420 μ. καλωδίου 5X2,5 τ.χ
9. Αύξηση από 1200 μ. σε 11265 μ. αγωγού γείωσης 16 τ.χ..
10. Αύξηση από 12τεμ σε 21 τεμ φ.σώματα Νατρίου 150 w
11. Αύξηση από 18τεμ σε 21 τεμ ευθ.μεταλλικός βραχίονας
12. Αύξηση από 1τεμ σε 2 τεμ ηλεκτρ.διανομής
13. Αύξηση από 600 μ σε 998μ αποξήλωση καλωδίων
14. Αύξηση από 45τεμ σε 54 τεμ αποξήλωση ιστού με φ.σώματα


Β'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 25 μ. σε 5 μ. διάστρωση με πλίνθους
- 2.Μείωση από 6 τεμ σε 5 τεμ σιδηροιστό τηλ. 6.5μ.
- 3.Μείωση από 350 μ. σε 308 μ. καλωδίου 5X1,5 τ.χ
4. Μείωση από 15 τεμ. Σε 6 τεμ ηλ. γείωσης

5. Μείωση από 20 τεμ. Σε 1 τεμ ανύψωση φρεατίων

6. Μείωση από 20 τεμ. Σε 0 τεμ χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίων

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , ο οποίος κλείνει επί ελατον κατά 0,26 ευρώ. με ΦΠΑ. 23%

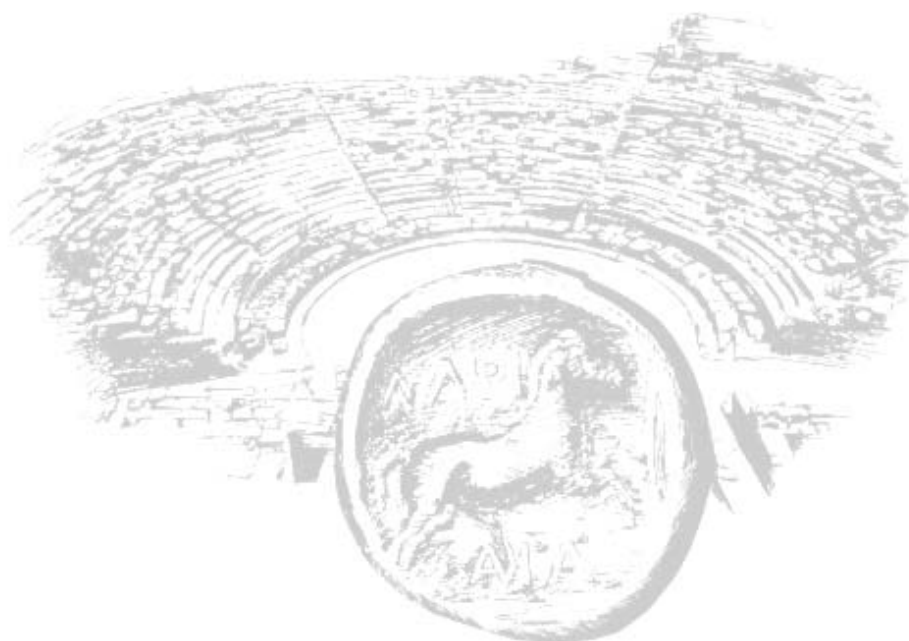

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 52 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	141.834,29	26.948,52 ΜΕ Φ.Π.Α 19%	168.782,81
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	60.988,74	12.807,64 ΜΕ Φ.Π.Α 21%	73.796,38
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	60.998,53	14.027,36 ΜΕ Φ.Π.Α 23%	75.015,89
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	0,21	0,05	0,26
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0, 0%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	60.998,53	14.027,36 ΜΕ Φ.Π.Α 23%	75.015,89

- A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 60.988,74 ΕΥΡΩ Χωρίς το Φ.Π.Α
 Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0ΕΥΡΩ
 Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση -> ΕΥΡΩ 75.015,89 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτρης

Η/Μ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Ασημίνα

11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή δικτύων στις εργατικές κατοικίες Νεάπολης» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7325.4409.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Ανάδοχος : ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 6-10, 41222 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410627177, FAX 241062717

Τος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Σελίδα 2

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μον. Μέτρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΛΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΚΡΕΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΠΡΟΤΕΚΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΩΝ ΓΙΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (Τελ.)			ΔΙΑΒΟΡΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Έντα	ΣΥΜΒΑΣΗ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Έντα	ΣΥΜΒΑΣΗ	Επι πλέον	Επι Ελατ	
				Μηνια	Οκτω	Ποσότητα	Μηνια	Οκτω				
Αρχική σύμβαση												
Εργασίες προπολογισμού												
1	Εγκατάσταση γάντζου για την αποθήκευση καλωδίων	m ²	1	230	18,00	4.140,00	285	18,00	5.130,00	990,00		H/M 10
2	Διάστρωση με βελτιωμένη πλινθόμασπα διαστάσεων 10x10x6 cm	m	2	25	5,00	125,00		5,00			125,00	H/M 10
3	Αποκατάσταση τσιζερτζιού, δρόμου, πρασίτου	m ²	3	450	30,00	13.500,00	520	30,00	15.600,00	2.100,00		H/M 10
4	Εγκατάσταση για την κατασκευή βόσκων, θεμελιώσεων (υδροκλιμακίου ή υδροκλιμακίου) σε έδαφος	m ³	4	46	50,00	2.300,00	46	50,00	2.300,00		100,00	H/M 10
5	Φράγμα αποστράγγισης από ακαθάρματα πάχους 10 cm με λαβρίνα 8 γλ. κάλυμμα	m ²	5	75	30,00	2.250,00	75	30,00	2.250,00			H/M 10
6	Βάση υδροκλιμακίου δάπεδο	m ²	6	46	106,28	4.888,88	46	106,28	5.101,44		212,56	H/M 101
7	Πλαστικός σωλήνας ελαστικού τύπου κεραιού	m	7	100	4,12	412,00	100	4,12	432,00		20,00	H/M 5
8	Συδροκλιμακίου γαλβανισμένος για την δέλευση καλωδίων κλίση δεξιότροπο 2 1/2 m	m	8	950	18,00	17.100,00	1.150	18,00	20.700,00	3.600,00		H/M 5
9	Συδροκλιμακίου ηλεκτροκατακόμης μήκους 8 M	m	9	12	350,00	4.200,00	10	350,00	5.600,00		1.400,00	H/M 101
10	Συδροκλιμακίου ηλεκτροκατακόμης μήκους 8,5 M	m	10	6	369,14	2.208,84	5	369,14	1.845,70		368,14	H/M 101
11	Συδροκλιμακίου κωνικού 3,5 μ. γαλβανισμένος	m	11	28	262,80	7.358,40	28	262,80	7.358,40			H/M 101
12	Καλώδιο NYU 5 X 4mm	m	12	1.100	3,80	4.180,00	1.100	3,80	4.180,00			H/M 102
13	Καλώδιο NYU 5 X 2,5mm	m	13	900	3,50	3.150,00	1.420	3,50	4.970,00		1.820,00	H/M 102
14	Καλώδιο NYM 3 X 1,5mm ²	m	14	350	2,10	735,00	308	2,10	646,80		88,20	H/M 48
15	Αιχμής γυαλός χάλκινος περικόκινος διατομής 16mm ²	m	15	1.200	4,10	4.920,00	1.200	4,10	5.180,50		260,50	H/M 45
16	Γέφυρα από γυάλινο ηλεκτρόδιο Φ22 mm, μήκους 1,5 μ.	m	16	15	18,00	270,00	6	18,00	108,00		162,00	H/M 5
17	Ρυθμιτικό όργανο ροής, ήπιου φάσου, για λυχνίες σημείων μετάνω G 12 35W για από μεριά οφθαλμού	m	17	28	334,07	9.353,96	28	334,07	9.353,96			H/M 103
18	Ρυθμιτικό όργανο ροής για λυχνίες σημείων κεντρίου ισχύος 150 W	m	18	12	314,07	3.768,84	21	314,07	6.595,47		2.826,63	H/M 103
19	Ευκίνητο μετρητικό βραχίονας μονής αρχής με προσαρμογές 1,00m	m	19	18	50,00	900,00	21	50,00	1.050,00		150,00	H/M 101
20	Ηλεκτρική δέσμη	m	20	1	190,00	190,00	2	190,00	380,00		190,00	H/M 53
21	Συδροκλιμακίου αραχίδας πάχους 8 mm	m	21	30	15,00	450,00	1	15,00	15,00		285,00	H/M 1
22	Ηλεκτρική αποδέσμευση καλωδίων	m	22	600	1,00	600,00	998	1,00	998,00		398,00	H/M 110
23	Αποδέσμευση ισομετρισμού	m	23	45	160,13	7.205,85	64	160,13	8.647,02		1.441,17	H/M 101
24	Ανάγνωση ή καταγραφή (προσαρμογή) φρεσιών	m	24	20	15,00	300,00		15,00			300,00	H/M 1
Σύνολο						94.316,77			106.463,80	106.463,80	15.476,46	1.328,34
Αφροίμα						94.316,77			106.463,80	106.463,80	15.476,46	1.328,34
Προσπίεση ΓΕ & ΟΕ						28,00 %			28,00 %		4.233,13	371,94
Σύνολο: Εργασίες προπολογισμού						120.725,47			138.833,78	138.833,78	19.808,59	1.700,28
Σύνολο Αρχική σύμβαση						120.725,47			138.833,78	138.833,78	19.808,59	1.700,28
Αφροίμα						138.834,26			138.833,78	138.833,78	19.808,59	19.808,10
Γράβειοι ανακατασκευής						3.000,00			3.000,00			
Αφροίμα						141.834,26			141.833,78	141.833,78	19.808,59	19.808,10
Αραχίδας εκπαύση						80.845,55			80.845,25	80.845,25	11.290,90	11.291,18
Αφροίμα						60.888,74			60.888,53	60.888,53	8.517,89	8.517,92
Προσπίεση σ/Α						23,00 %			23,00 %		1.909,12	1.909,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						14.027,41			14.027,36	14.027,36	10.476,76	10.477,04
						75.016,15			75.015,89	75.015,89	10.476,76	10.477,04


Σύνολο υπερβάσεων (Προτεινόμενη Δαπάνη) - [Αρχική Σύμβαση]	Αρχική Σύμβαση	Προτεινόμενες ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	120.725,47	138.833,78	Υπερβάση της εγκατεργμένης δαπάνης κατά 18.108,31 ή ποσοστό 15,00%
Αποβάλλεται δαπάνη	18.108,82		
Αφαιρούμε	138.834,29	138.833,78	Μείωση της εγκατεργμένης δαπάνης κατά -0,5 ή ποσοστό 0,00%
Υπέρβαση συνολικά εργασιών	3.000,00	3.000,00	
Αφαιρούμε	141.834,29	141.833,78	Μείωση της εγκατεργμένης δαπάνης κατά -0,5 ή ποσοστό 0,00%
Γενικό Εκπαιρωτό 57%	-80.845,55	-80.845,25	
Αφαιρούμε	90.988,74	90.986,83	Μείωση της εγκατεργμένης δαπάνης κατά -21 ή ποσοστό 0,00%
ΑΦΑ 23%	14.027,41	14.027,36	
Γενικό σύνολο	78.016,15	78.016,89	Μείωση της εγκατεργμένης δαπάνης κατά -26 ή ποσοστό 0,00% [Διαφορά Ευνοϊκή υπέρ του Δήμου]

1 / 2010
 Ο ανάδοχος

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Α.Ε. Ε.Ε.
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. Α
 ΜΠΟΥΡΚΙΔΑΚΑ 8-10 - ΑΡΧΑΙΑ
 ΠΛΟΥΣΙΑΣ 51771 - ΠΑΚ. 0410-37378
 Α.Σ.Μ. ΟΥΔΑΚΩΤΗ - Α. ΣΟΥ ΑΛΛΙΔΑΣ
 Κ.Μ.Α.Ε. : 49126/31/8/01/729

1 / 2010
 Ο επικεφαλής

 ΝΙΚΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΤΙΚΟΣ

1 / 2010
 Ο προϊστάμενος Π.Μ.

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΔΕΦΡΗΘΗΚΕ
 1 / 2010
 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

 ΑΣΤΗΜΑ ΑΔΑΜΑΚΙΟΥ

