



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή ράμπας στο Αμαξοστάσιο».

Στη Λάρισα, σήμερα 28^η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28859/24-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζανακούλης Κων/νος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κρίκης Πέτρος, 6) Μαβίδης Δημήτριος, 7) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Τζανακούλης Κων/νος, Τερζούδης Χρήστος και Διαμάντος Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή ράμπας στο Αμαξοστάσιο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθ. 456/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου «Κατασκευή ράμπας στο αμαξοστάσιο».
3. Τη με αριθ. 416/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθ. 474/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης για το έργο «Κατασκευή ράμπας στο Αμαξοστάσιο».
5. Τη με αριθ. 543/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ράμπας στο αμαξοστάσιο» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 659/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ράμπας στο αμαξοστάσιο» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 27152/08-08-2018 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Α. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ»

δαπάνης 11.279,00 €

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 6 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	9.095,97 €	2.183,03 € 24%	11.279,00 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ^{ος} ΑΠΕ)	9.095,97 €	2.183,03 € 24%	11.279,00 €

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7311.41003 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Πηγή χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

8. Την από 08-08-2018 Αιτιολογική Έκθεση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή ράμπας στο Αμαξοστάσιο», η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες εργασιών προέκυψαν από επιμετρήσεις του έργου και αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

1.1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός ορίου γενικών εκσκαφών (Α.Τ.1)
2. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για τη δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (Α.Τ.2)
3. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (Α.Τ.3)
4. Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου Ο155, μετά της μεταφοράς (Α.Τ.14)
5. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόφτη (Α.Τ.15)

1.2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας Β500C (Α.Τ.4)
2. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα C10/12 (Α.Τ.6)
3. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25 (Α.Τ.7)
4. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (Α.Τ.8)
5. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (Α.Τ.9)
6. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (Α.Τ.10)
7. Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων (Α.Τ.11)

B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλλατον ποσότητες εργασιών προέκυψαν από επιμετρήσεις του έργου και αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

1.1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (Α.Τ.13)

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

- Ευλότυποι συνήθων χυτών μικροκατασκευών (Α.Τ.4)

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στα 11.279,00€ ήτοι 9.095,97€ για εργασίες και 2.183,03€ για ΦΠΑ. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	9.676,56	2.322,37	11.998,93
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	9.095,97	2.183,03	11.279,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	9.095,97	2.183,03	11.279,00

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν.2940/01, Π.Δ. 286/94 και δεν τροποποιεί το «βασικό σχέδιο» του έργου. Εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 11.279,00€ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΙΑΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ» προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του.

Λάρισα,/...../2018


Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΣΟΦΙΑ ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ
Πολ.Μηχανικός

Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΡΑΣ
Πολ.Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

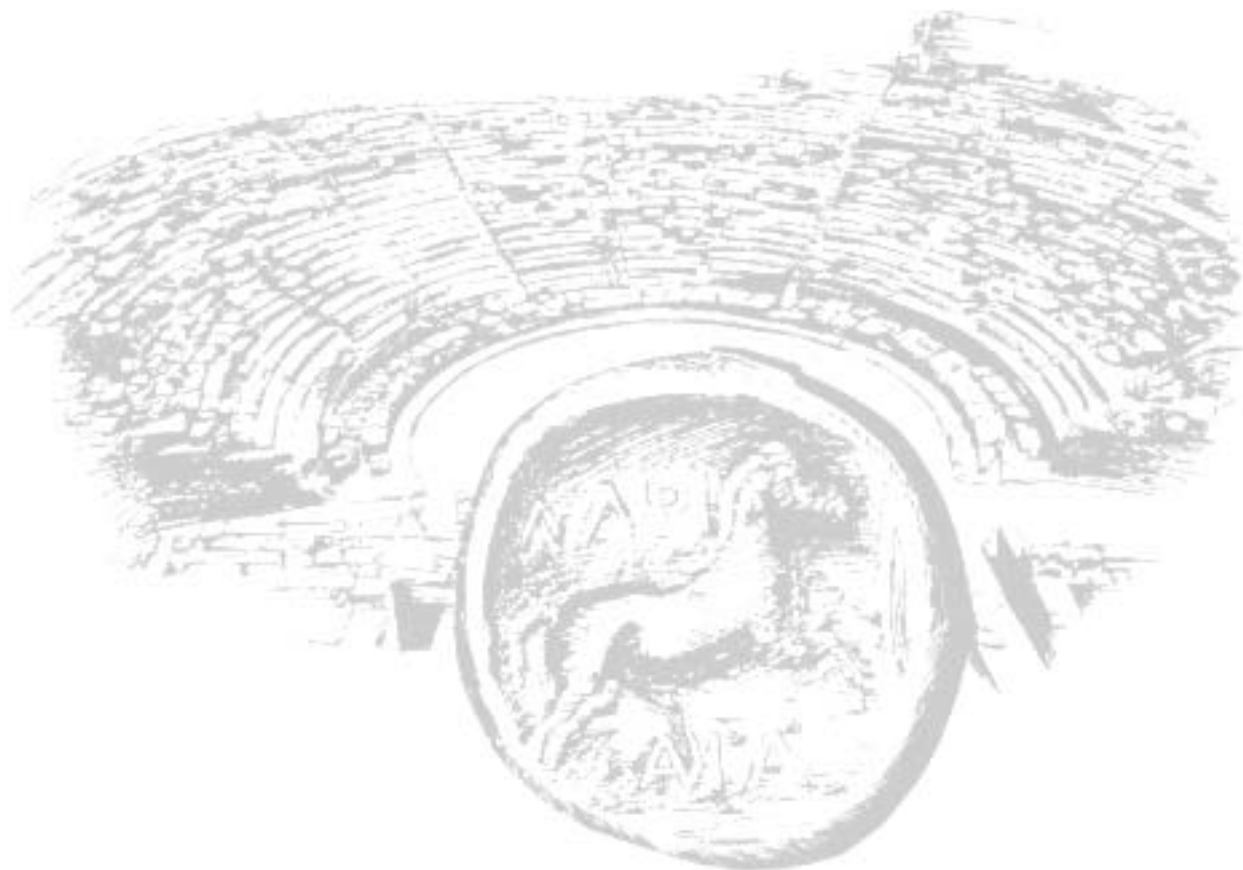

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ράμπας στο Αμαξοστάσιο», ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΩΝΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δ.ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ
ΟΣ Ο.Ε.1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧ.-ΠΡΟΤ.	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1.1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ														
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπής και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός ορίου γενικών εκσκαφών	ΟΔΟΝ 1123.Α	m ³	1,60	1,00	1,60			2,26	3,62		2,02		
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για τη δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ 2112	m ³	3,85	15,00	57,75			31,60	121,66		63,91		
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ασκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 2171	m ³	0,90	15,00	13,50			31,60	28,44		14,94		
13	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162	m ³	4,50	8,00	36,00				0,00				36,00
14	Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου Ο155, μετά της μεταφοράς	ΟΙΚ 2162	m ³	19,00	5,70	108,30			17,62	334,78		226,48		
15	Τομή οδοστρώματος με αφαιροκόφτη	ΟΙΚ 2269Α	m	1,00	23,00	23,00			31,87	31,87		8,87		
					ΣΥΝΟΛΟ	240,15		ΣΥΝΟΛΟ	520,37			316,22		36,00
					ΑΦΑΙΡ(6%) :	225,74		ΑΦΑΙΡ(6%) :	489,15			297,25		33,84
1.2: ΣΚΥΡΟΔΕ-														

MATA												
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	OIK 3816	m2	15,70	150,00	2.355,00		89,81	1.410,02			944,98
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	OIK 3873	kg	1,07	1.900,00	2.033,00		2.372,30	2.538,36		505,36	
6	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	OIK 3712	m3	78,00	4,50	351,00		4,51	351,78		0,78	
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 3215	m3	95,00	15,00	1.425,00		23,84	2.264,80		839,80	
8	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	OIK 3223A.3	m3	16,80	4,50	75,60		4,51	75,77		0,17	
9	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 3223A.6	m3	22,50	15,00	337,50		23,84	536,40		198,90	
10	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	OIK 3873	m2	2,20	28,00	61,60		87,99	193,58		131,98	
11	Πρόσθετη τιμή	OIK 3841	m2	5,60	45,00	252,00		55,25	309,40		57,40	

επεξεργασίας σανιδώματος ξύλοτύπων												
						6.890,70			7.680,11		1.734,39	944,98
			ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ (6%) :			6.477,26			7.219,30		1.630,33	888,28
						6.703,00	6.703,00		7.708,45	7.708,45	1.927,57	922,12
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ :				6.703,00		7.708,45		1.927,57	922,12
			ΓΕ & ΕΟ 18% :				1.206,54		1.387,52		346,96	165,98
			ΣΥΝΟΛΟ :				7.909,54		9.095,97		2.274,54	1.088,10
			ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :				1.186,43		0,00			1.186,43
			ΣΥΝΟΛΟ :				9.095,97		9.095,97		2.274,54	2.274,54
			ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ :				0,00		0,00		0,00	
			ΣΥΝΟΛΟ :				9.095,97		9.095,97		2.274,54	2.274,54
			ΦΠΑ 24%				2.183,03			2.183,03		
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :				11.279,00		11.279,00		2.274,54	2.274,54

ΛΑΡΙΣΣΑ-.....-
2018
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δ. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

Λάρισα/...../2018
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΣΟΦΙΑ
ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ
ΠΟΛ.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ράμπας στο Αμαξοστάσιο», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA
