



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».

Στη Λάρισα, σήμερα 23η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12098/19-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ

Συμμετείχαν δε από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καραλαριώτου Ειρήνη, 22) Καφφές Θεόδωρος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λώλος Αχιλλέας, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μαμάκος Αθανάσιος, 28) Μόρας Ευάγγελος, 29) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 30) Νασιώκας Παναγιώτης, 31) Νταής Παναγιώτης, 32) Ξηρομερίτης Μάριος, 33) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 34) Παναγιώτου Ιωάννης, 35) Παπαδούλης Γεώργιος, 36) Παπαπαρίσης Απόστολος, 37) Παπαποστόλου Δημήτριος, 38) Πράπας Αντώνιος, 39) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 40) Σάπκας Παναγιώτης, 41) Σούλτης Γεώργιος, 42) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 43) Τάχος Δημήτριος, 44) Τερζούδης Χρήστος, 45) Τζατζάκης Φώτιος και 46) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 2) Παπαδημητρίου Βασίλειος και 3) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 46, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μόρας Ευάγγελος, Λώλος Αχιλλέας και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 884/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
3. Τη με αριθμ. 698/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 728/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου: "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας".
5. Τη με αριθμ. 30/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
6. Τη με αριθμ. 94/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 142/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 261/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
1. Τη με αριθμ. 297/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
2. Τη με αριθμ. 501/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
3. Τη με αριθμ. 681/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
4. Τη με αριθμ. 79/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 196/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 5^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
9. Τη με αριθμ. 261/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 6^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. 742/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
11. Τη με αριθμ. 123/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 8ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 11056/12-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα για έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Δαπάνης 1.787.042,43 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 67.073,31 € σε σχέση με τον

Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου και 0,00 € σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ και της Συμπληρωματικής σύμβασης που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 261/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Υπάρχει μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες και όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από μείωση άλλων και από τα απρόβλεπτα με τον 2ο Α.Π.Ε.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους,

Με Κ.Α. 30.7323.42102

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

13. Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.999.928,18 ευρώ

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	(ΜΕ ΦΠΑ)	: 3.999.928,18 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ		: 884/2017 ΑΔΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ		: 22-8-2018
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.		: 57%
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	(ΜΕ ΦΠΑ)	: 1.719.969,12 €
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		: 27-08-2018
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		: 250 ΗΜΕΡΕΣ
1 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 04-08-2019 (297/2019 ΑΔΣ)
2 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 31-12-2019 (501/2019 ΑΔΣ)
3Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 33-03-2020 (681/2019 ΑΔΣ)
4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 31-08-2020 (79/2020 ΑΔΣ)
5Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 30-10-2020 (196/2020 ΑΔΣ)
6Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 31-12-2020 (261/2020 ΑΔΣ)
7Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 31-03-2021 (742/2020 Α.Ο.Ε.)
8Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ		: 30-06-2021 (123/2021 Α.Ο.Ε.)
ΕΓΚΡΙΣΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ & 1 ^{ης} ΣΣ		: 04-04-2019 (261/2019 Α.Δ.Σ.)

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από μείωση άλλων και των απρόβλεπτων με τον 2ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέση έκπτωση δημοπρασίας 57%	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	3.225.748,53	774.179,65	3.999.928,18
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.387.071,87	332.897,25	1.719.969,12
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2° Α.Π.	1.441.163,25	345.879,18	1.787.042,43
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΟΣΟ	54.091,38	12.981,93	67.073,31

Α. Εγκριθείσα δαπάνη με τη σύμβαση 1.719.969,12 ευρώ
Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη με τον παρόντα 2ο ΑΠ 1.787.042,43 ευρώ
Παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου.

ΛΑΡΙΣΑ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

14. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.999.928,18 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ Α.Τ.Ε.

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Α/Α	ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητα	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΦΙΡΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΑΡΕ		ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε (2ος)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ		
					Τιμή μονάδος	Δαπάνες	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνες	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ													
1	Διέλευση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 4 cm	m2	1.02	200.000,00	1,15	230.000,00		258.750,00	179.630,00	1,15	206.574,50		52.175,50
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	1.05	200.000,00	0,45	90.000,00		112.500,00	200.000,00	0,45	90.000,00		22.500,00
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβαλλήτου πάχους εκμετρούμενες κατά βάρος	ton	1.07	4.262,00	79,38	338.317,56		428.652,00	9.000,00	79,38	714.420,00		285.768,00
4	Ασφαλτική στρώση καλοφορίας, συμπεκνυμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	1.06	160.000,00	7,95	1.272.000,00		1.431.000,00	180.000,00	7,95	1.431.000,00		
5	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις καλοφορίας, συμπεκνυμένου πάχους 0,04m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	m2	A14	40.000,00	11,17	446.800,00		502.650,00	26.113,41	11,17	291.686,79		210.963,21
Αθροισμα κατηγορίας και ομάδας εργασιών						2.377.117,56	2.377.117,56	2.733.552,00			2.733.681,29	2.733.681,29	360.443,50
Αφαιρείται έκπτωση 57%						1.354.957,01		1.558.124,64				1.558.198,34	205.452,80
Αξία εργασιών						1.022.160,55		1.175.427,36				1.175.482,95	154.990,71
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						1.022.160,55		1.175.427,36				1.175.482,95	154.990,71
ΠΡΟΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18%						18%	183.988,90	211.576,92				211.586,93	
ΣΥΝΟΛΟ							1.206.149,45	1.387.004,28				1.387.069,88	154.990,71
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							180.922,42	67,59				1,99	180.920,43
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ							0,00	0,00				0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							1.387.071,87	1.387.071,87				1.387.071,87	154.990,71
ΠΡΟΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%						24%	332.897,25	332.897,25				332.897,25	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							1.719.969,12	1.719.969,12				1.719.969,12	154.990,71
													271.634,61

ΛΑΡΙΣΑ - 03 -2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΛΑΡΙΣΑ - 03 -2021
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΡΙΣΑ - 03 -2021
Ο ΑΝΑΡΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συμπληρωματική Σύμβαση

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μέτρησης	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΦΙΡΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε (Loc)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνες			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ													
1	Κόστος υποδομής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και καταβυθίσεις (ΔΕΚΚ) δυνάμει της υπ' αριθμ. 11 Εγκύκλιου/19-6-2017 Α.Π. ΝΣΥ/οικ44038/ΦΝ466 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	ton	NT1	0,00	3,09	0,00	0,00	30.000,00	3,09	92.700,00	0,00	0,00	0,00
	Αθροισμα κατηγορίας και ομάδας εργασιών					0,00	0,00			92.700,00	92.700,00	0,00	0,00
	Αφαιρείται έκπτωση 57%						0,00			52.839,00	52.839,00	0,00	0,00
	Άξια εργασιών						0,00			39.861,00	39.861,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			18%			0,00					39.861,00	0,00
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18%						0,00					7.174,98	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ						0,00					47.035,98	0,00
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						0,00					7.055,40	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ						0,00					0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						0,00					54.091,38	0,00
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%			24%			0,00					12.981,93	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ						0,00					67.073,31	0,00

ΛΑΡΓΕΑ - 03 - 2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΛΑΡΓΕΑ - 03 - 2021
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΗ
ΛΑΡΓΕΑ - 03 - 2021

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

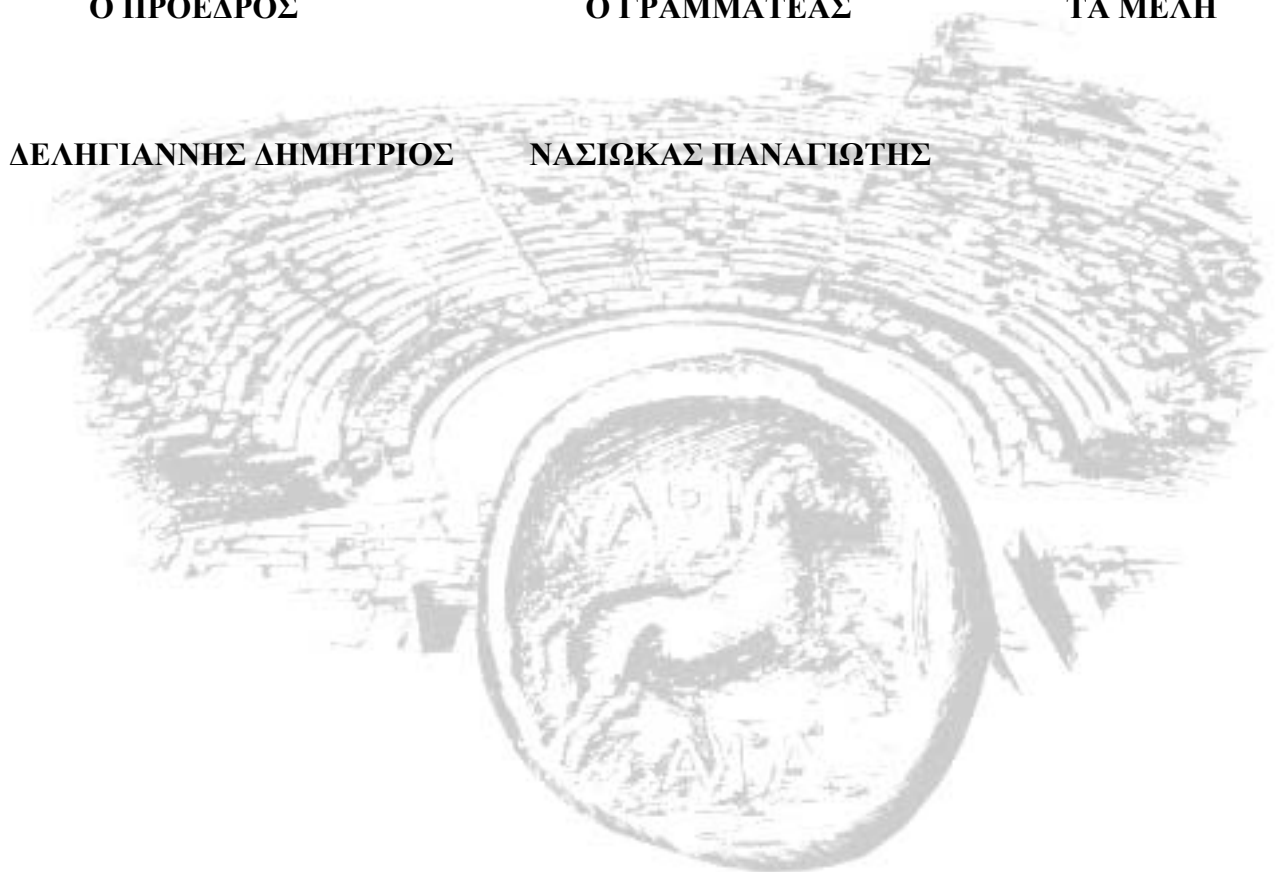

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A
